



Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa
Distretto di SASSARI



PROGRAMMA DI INTERVENTO DI COSTRUZIONE ALLOGGI E.R.P.
Delibera G.R. n.71/32 del 16/12/2008

PROGETTO

COSTRUZIONE DI N.20 ALLOGGI A TEMPIO loc. Poi e Mantelli

Tav. n°

G

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Data: Marzo 2011

Il Progettista
(Ing. Gianpaolo Sanna)

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuliano Pazzola)

Il Direttore Generale
(Ing. Sebastiano Bitti)

Comune di TEMPIO
Provincia di SS

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Per la prevenzione e protezione dai rischi
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91 e Allegato XVI)

OGGETTO: COSTRUZIONE DI N. 20 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI TEMPIO IN LOC. POI - MANTELLI
COMMITTENTE: A.R.E.A. Azienda regionale Edilizia Abitativa - Distretto di Sassari
CANTIERE: VIA PERTINI, TEMPIO (SS)

TEMPIO, lì MARZO 2011

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Geometra Pazzola Giuliano)

IL COMMITTENTE

(PRESIDENTE _____)

Geometra Pazzola Giuliano
via A. Cervi 12 07100 Sassari (SS) 079 221200 -
giulio.pazzola@area.sardegna.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

CAPITOLO I

Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Descrizione dell'intervento

L'intervento in progetto propone la realizzazione di venti alloggi di ERP in due edifici a tre piani, ciascuno con dieci alloggi, due dei quali, posti a piano terra, avranno una superficie di 95 mq mentre nei piani 1. e 2. si prevedono 4 alloggi per piano, ognuno con una superficie di 57mq.

I due fabbricati, su due lotti distinti, sono caratterizzati da una completa autonomia degli accessi e totale indipendenza della gestione degli spazi scoperti.

L'accesso al singolo edificio avverrà direttamente dal percorso pedonale che si apre sulla Via esistente.

Gli ingressi ai due fabbricati avverranno oltre che attraverso una breve scala esterna necessaria per il superamento del dislivello presente, tramite una rampa con pendenza massima dell'8%. All'interno dei vani scala è presente, nel caso del lotto 42 (EDIFICIO A piano interrato più tre livelli), un vano ascensore dotato di macchinario elevatore, mentre, nel caso del lotto 52 (piano terra più due livelli) un vano chiuso in muratura in cui si prevede, in futuro, l'installazione dell'ascensore che oggi, per motivi economici, non è previsto. Al piano terra è inoltre presente, in entrambi gli edifici, un ambiente ad uso condominiale, con accesso diretto dall'atrio di ingresso.

Le auto, con ingresso diretto dalla Via esistente, avranno a disposizione due spazi per parcheggio, il primo, nel lotto 52, della capacità di 10 posti scoperti, in prossimità degli alloggi. Il secondo, nel lotto 42, è previsto nel piano seminterrato che per effetto del dislivello presente si verrà a creare; anche qui troveranno ricovero 10 autovetture.

Gli spazi scoperti residui saranno destinati a verde privato o pubblico, come chiaramente indicato negli elaborati grafici di progetto.

Lo sviluppo sia planimetrico che prospettico degli edifici è caratterizzato da un'evidente regolarità, dovuto alla forma e alle dimensioni del lotto. Le terrazze presenti, più profonde in corrispondenza della zona giorno, agevoleranno l'utilizzo degli spazi all'aperto durante la stagione climaticamente più favorevole.

Sulle coperture a falde inclinate si prevede l'installazione, per ciascun edificio, di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 13 kWp per la produzione di energia elettrica di cui potranno beneficiare gli inquilini che occuperanno gli alloggi (queste opere non sono inserite nel piano economico ma potranno essere realizzate con specifico finanziamento o con accesso al "conto energia").

Con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non solo si ridurranno le spese energetiche per le utenze elettriche presenti, ma si contribuirà attivamente all'attuazione del programma energetico nazionale nella riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e nella promozione delle fonti energetiche rinnovabili, oltre a ridurre le emissioni inquinanti (la riduzione prevista di CO₂ è di circa 13,8 ton/anno) e svolgere una funzione educativa indirizzata al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Il rispetto dei parametri urbanistici-edilizi indicati è deducibile dalla lettura della seguente tabella:

| | | | |
|----------------------------------|---------------|----------|-------------------------|
| - superficie complessiva lotto | $S_{lotto} =$ | 3.889,00 | mq |
| - superficie coperta in progetto | $S_{cpr} =$ | 589,94 | mq |
| - rapporto di copertura progetto | $R_r =$ | 0,15 | mq/mq |
| - volume in progetto | $V_{pr} =$ | 5.264,08 | mc |
| - Indice fondiario | $i_{ff} =$ | 1,35 | mc/mq |
| - Altezza massima in progetto | $H =$ | 8,60 | m (inferiore a 9,50 m). |

Abbattimento barriere architettoniche

L'abbattimento delle barriere architettoniche è garantito dalla presenza delle rampe di raccordo con pendenza non superiore all'8%, in corrispondenza degli accessi all'edificio. Per far fronte ad eventuali utenti portatori di handicap si è riservata, in ciascun alloggio, una quota di tre alloggi, uno

dei quali con superficie di mq 95 e due con superficie di mq 57; tali unità sono dotate di accessi adeguati e bagno speciale, nel rispetto di quanto imposto dalla normativa.

Consistenza dell'intervento

Le superfici complessive degli alloggi sono le seguenti:

| | |
|--|-----------------------------|
| - Superficie utile | $S_U = 1.285,72 \text{ mq}$ |
| - Superficie non residenziale S_{NR} | $= 536,64 \text{ mq}$ |
| - Superficie parcheggi S_P | $= 197,20 \text{ mq}$ |
| - Superficie complessiva S_C | $= 1726,02 \text{ mq}$ |

| S alloggio (mq) | tipologia | n. alloggi |
|-----------------|------------------------------|------------|
| 95 | multipiano 3 camere da letto | 4 |
| 57 | multipiano 2 camere da letto | 16 |
| | Totale alloggi | 20 |

Tecnologie e materiali proposti.

Saranno di tipo tradizionale, ed in particolare:

strutture di fondazione in c.a.;

murature perimetrali portanti in blocchi di legno-cemento coibentati e eventuali pilastri in c.a. nella zona centrale dell'edificio;

solai misti a blocchi di laterizio;

copertura a tetto su struttura in laterizio;

tramezzature in laterizio forato;

intonaco civile a base di malta bastarda e tinteggiature con idropittura nei colori tradizionali già presenti negli edifici limitrofi;

infissi in legno e ringhiere/inferriate metalliche;

pavimentazioni e rivestimenti in cotto/ceramica;

impianto elettrico sottotraccia;

impianto idrico sottotraccia in polietilene e rame sanitario derivato dalla condotta comunale esistente;

impianto fognario in polietilene/pvc allacciato al collettore fognario esistente.

Tutti gli impianti saranno adeguati ai regolamenti e alle normative vigenti in materia.

Durata effettiva dei lavori

| | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|
| Inizio lavori | 01/09/2011 | Fine lavori | 21/02/2013 |
|---------------|------------|-------------|------------|

Indirizzo del cantiere

| | | | | | |
|-----------|-------------|-------|--------|-----------|----|
| Indirizzo | VIA PERTINI | | | | |
| CAP | | Città | TEMPIO | Provincia | SS |

Soggetti interessati

| | | | |
|--|-----------------|--|------------|
| Committente | | A.R.E.A. Azienda regionale Edilizia Abitativa - Distretto di Sassari | |
| Indirizzo: | via A. Cervi 12 | Tel. | 079221200 |
| Progettista | | SANNA GIANPAOLO | |
| Indirizzo: | via A. Cervi | Tel. | 079221200 |
| Direttore dei Lavori | | | |
| Indirizzo: | via A. Cervi | Tel. | 079221211 |
| Responsabile dei Lavori | | SEBASTIANO MONTI | |
| Indirizzo: | via A. Cervi 12 | Tel. | 079 221200 |
| Coordinatore Sicurezza in fase di | | Giuliano Pazzola | |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|------------|
| progettazione | | | |
| Indirizzo: | via A. Cervi 12 | Tel. | 079 221200 |
| Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione | | | |
| Indirizzo: | via Cervi 12 | Tel. | |
| Impresa Edile | | Impresa Edile | |
| Legale rappresentante | | | |
| Indirizzo: | | Tel. | |
| Impresa Impiantistica | | | |
| Legale rappresentante | | | |
| Indirizzo: | | Tel. | |
| Impresa Movimenti e scavo | | Impresa Movimenti Terra e scavi | |
| Legale rappresentante | | | |
| Indirizzo: | | Tel. | |



CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.

01 Fabbricato

02 EDILIZIA: STRUTTURE

Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di sostenere i carichi del sistema edilizio stesso e di collegare inoltre staticamente tutte le sue parti.

02.01 Strutture in sottosuolo

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.

02.01.01 Strutture di fondazione

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di trasmettere al terreno il peso della struttura e delle altre forze esterne.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 02.01.01.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. [quando occorre] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|--|---|
| Accessi ai luoghi di lavoro | | Ponteggi; Trabattelli; Scale. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | | Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità. |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tavole Allegate | progetto architettonico |
|-----------------|-------------------------|

02.02 Strutture in elevazione

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno.

02.02.01 Strutture orizzontali o inclinate

Le strutture orizzontali o inclinate sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere orizzontalmente i carichi agenti, trasmettendoli ad altre parti strutturali ad esse collegate. Le strutture di elevazione orizzontali o inclinate a loro volta possono essere suddivise in: a) strutture per impalcati piani; b) strutture per coperture inclinate.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 02.02.01.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|---|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Scale. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità. |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tavole Allegate | progetto architettonico |
|------------------------|-------------------------|

02.02.02 Strutture verticali

Le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture di elevazione verticali a loro volta possono essere suddivise in: a) strutture a telaio; b) strutture ad arco; c) strutture a pareti portanti.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 02.02.02.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, |

| | |
|---|---|
| del difetto accertato. [quando occorre] | abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi. |
|---|---|

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|---|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Scale. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità. |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | progetto architettonico calcoli statici e relative tavole |
|------------------------|--|

02.03 Pareti di sostegno

Si tratta di insiemi di elementi tecnici aventi la funzione di sostenere i carichi derivanti dal terreno e/o eventuali movimenti franosi. Tali strutture vengono generalmente classificate in base al materiale con il quale vengono realizzate, al principio statico di funzionamento o alla loro geometria.

02.03.01 Muri a sbalzo

Si tratta di opere di contenimento con o senza contrafforti caratterizzate da elementi strutturali con comportamento analogo a mensole incastrate a nodo dal quale emergono le due solette di fondazione e quella di elevazione. Essi consentono la realizzazione di opere notevoli con dimensioni contenute. Possono essere realizzati in: a) cls armato; b) cls debolmente armato e/o a "semigravità"; c) in acciaio; d) elementi prefabbricati in c.a.; e) con blocchi cassero in c.a.

Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 02.03.01.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|---------------|--|---|
|---------------|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| Accessi ai luoghi di lavoro | | Ponteggi; Trabattelli; Scale. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | | Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità. |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | progetto architettonico calcoli statici e relative tavole |
|------------------------|--|

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 02.03.01.02 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Ripristino drenaggi: Rimozione di eventuali depositi (terreni, fogliame, ecc.) e materiali estranei lungo le zone di drenaggio. Ripristino dei sistemi di drenaggio situati posteriormente alle strutture di sostegno mediante l'integrazione di pietre di medie dimensioni addossate al paramento interno. [con cadenza ogni anno] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento, sprofondamento. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|--|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | | Ponteggi; Trabattelli; Scale. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | | Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità. |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tavole Allegate | progetto architettonico |
|------------------------|-------------------------|

03 EDILIZIA: CHIUSURE

Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di separare e di configurare gli spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio rispetto all'esterno.

03.01 Pareti esterne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all'esterno.

03.01.01 Murature in c.a. facciavista

Una muratura realizzata attraverso un getto di calcestruzzo in un cassero recuperabile nel quale, se la parete è portante, viene inserita l'armatura.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.01.01.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|---|
| Pulizia e ripristino dei giunti: Ripristino dei giunti strutturali e tra pannelli di facciata mediante rimozione e rifacimento parziale o totale delle sigillature. [con cadenza ogni 5 anni] | Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|--|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | | Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | Recinzioni di cantiere. |

| Tavole Allegate | progetto architettonico calcoli statici e relative tavole |
|-----------------|--|
|-----------------|--|

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.01.01.02 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Pulizia superfici: Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua sotto pressione. [quando occorre] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--------------------------------|--|---|
| Accessi ai luoghi di lavoro | | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | | Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. |

| | | |
|--|--|---|
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | Recinzioni di cantiere. |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | progetto architettonico calcoli statici e relative tavole |
|------------------------|--|

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.01.01.03 |
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|---|
| Rimozione delle zone in fase di sfaldamento: Riprese delle zone sfaldate con trattamento dei ferri e successivo ripristino del copriferro con malte a base di resine. [con cadenza ogni 40 anni] | Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|--|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | | Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | Recinzioni di cantiere. |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | progetto architettonico calcoli statici e relative tavole |
|------------------------|--|

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.01.01.04 |
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|---|
| Trattamento di consolidamento: Trattamento di consolidamento profondo e superficiale degli elementi mediante applicazione a spruzzo o a pennello di consolidante organico o inorganico che non vada ad | Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni. |

| | |
|---|--|
| alterare le caratteristiche cromatiche. [con cadenza ogni 5 anni] | |
|---|--|

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|--|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | | Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | Recinzioni di cantiere. |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | progetto architettonico calcoli statici e relative tavole |
|------------------------|--|

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.01.01.05 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|---|
| Trattamento protettivo: Ripristino dello strato protettivo mediante l'impiego di prodotti chimici che non vadano ad alterare le caratteristiche cromatiche degli elementi. [con cadenza ogni 5 anni] | Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|--|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | | Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | Recinzioni di cantiere. |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | progetto architettonico calcoli statici e relative tavole |
|------------------------|--|

03.01.02 Murature intonacate

Una muratura composta in elementi vari e rivestita mediante intonaco a base cementizia.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.01.02.01 |
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|---|
| Ripristino intonaco: Rimozione delle parti ammalorate e conseguente ripresa dell'intonaco. [con cadenza ogni 10 anni] | Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|--|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | | Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | Recinzioni di cantiere. |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | progetto architettonico calcoli statici e relative tavole |
|------------------------|--|

03.02 Coperture inclinate

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: a) elemento di collegamento; b) elemento di supporto; c) elemento di tenuta; d) elemento portante; e) elemento isolante; f) strato di barriera al vapore; g) strato di ripartizione dei carichi; h) strato di protezione; i) strato di tenuta all'aria; l) strato di ventilazione.

03.02.01 Canali di gronda e pluviali

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.01.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Rinnovo del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, mediante inserimento di strati a secco o mediante colla. Rifacimento completo del manto mediante rimozione del vecchio manto se gravemente danneggiato. [con cadenza ogni 6 mesi] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| Tavole Allegate |
|-----------------|
| |

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.01.02 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|---------------|---|---|
|---------------|---|---|

| | dell'opera | |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° ; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | |
|------------------------|--|

03.02.02 Comignoli e terminali

Si tratta di elementi integrati nella copertura con la funzione di semplificare lo scambio di aeriformi con l'atmosfera in relazione agli impianti per fluidi del sistema edilizio di cui fanno parte. Di essi fanno parte: a) i camini (la parte della canna fumaria che emerge dalla copertura con la funzione di fuoriuscita dei prodotti derivanti dalla combustione ad una altezza maggiore rispetto a quella di copertura); b) gli sfiati (La parte delle canalizzazioni che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare lo sfogo degli aeriformi in atmosfera); c) gli aeratori (gli elementi che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare il passaggio di aria con l'atmosfera); d) terminali di camini per lo sfiato (gli elementi situati all'estremità di camini e sfiati con la funzione di permettere il tiraggio e la dispersione dei prodotti di combustione e degli aeriformi nell'atmosfera nonché di fungere da protezione dagli agenti atmosferici le canalizzazioni inferiori).

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.02.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Riverniciature: Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche dei terminali delle coperture. [con cadenza ogni 5 anni] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° ; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| | magneto-termico | adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | |
|------------------------|--|

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.02.02 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|--|
| Ripristino comignoli e terminazioni condutture: Ripristino dei condotti, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Ripristino degli elementi di fissaggio. Rimozione di eventuali nidi o di altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli. [con cadenza ogni anno] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° ; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | |
|------------------------|--|

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.02.03 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|--|
| Pulizia dei tiraggi dei camini: Pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi provenienti dai prodotti | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; |

| | |
|--|-------------------------------|
| della combustione. [con cadenza ogni 6 mesi] | Inalazione fumi, gas, vapori. |
|--|-------------------------------|

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| Tavole Allegate | |
|-----------------|--|
|-----------------|--|

03.02.03 Parapetti ed elementi di coronamento

Si tratta di elementi affioranti dalla copertura con la funzione di riparo, difesa o in alternativa di decorazione. Di essi fanno parte: a) i parapetti (la cui funzione è quella di riparare persone e cose da eventuali cadute nel vuoto); b) i coronamenti (si tratta di elementi perimetrali continui sporgenti alla copertura con funzione decorativa e in alcuni casi anche di parapetto); c) gli ornamenti (la cui funzione è di abbellimento delle coperture).

Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.03.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|--|
| Ripristino coronamenti: Ripristino degli elementi costituenti i coronamenti con funzione decorativa mediante integrazione di parti mancanti e/o sostituzione di parti ammalorate con materiali idonei. Interventi mirati al mantenimento delle condizioni di stabilità e sicurezza qualora i coronamenti abbiano anche funzione integrativa di parapetto. Pulizia e lavaggio delle parti decorative con prodotti e detergenti specifici. [con cadenza ogni 3 anni] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|-----------------------------|--|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°; Scale retrattili a | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |

| | | |
|--|---|--|
| | gradini | |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | |
|------------------------|--|

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.03.02 |
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|--|
| Ripristino parapetti: Ripristino degli elementi costituenti i parapetti condotti mediante interventi mirati al mantenimento delle condizioni di stabilità e sicurezza. [con cadenza ogni 3 anni] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|---|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | |
|------------------------|--|

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.03.03 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Riverniciature: Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti costituenti i parapetti e gli elementi di coronamento nonché delle decorazioni. [con cadenza ogni 6 mesi] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° ; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| Tavole Allegate |
|-----------------|
| |

03.02.04 Strato di isolamento termico

Lo strato di isolamento termico ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di resistenza termica globale e allo stesso tempo di attenuare la trasmissione delle onde sonore provocate dai rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzione della sua conducibilità termica e secondo della destinazione d'uso degli ambienti interni. Gli strati di isolamento termico possono essere in: a) calcestruzzi alleggeriti; b) pannelli rigidi o lastre preformati; c) elementi sandwich; d) elementi integrati; e) materiale sciolto.

Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.04.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Rinnovo strati isolanti: Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi. [con cadenza ogni 20 anni] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° ; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | |
|------------------------|--|

03.02.05 Strato di tenuta in coppi

Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di posa che nel caso di manto di copertura in coppi varia in media del 25-30% a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.05.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|--|
| Pulizia manto di copertura: Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari dei coppi ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche. [con cadenza ogni 6 mesi] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° ; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | |
|------------------------|--|

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.05.02 |
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Ripristino manto di copertura: Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori. [quando occorre] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| |
|---|
| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° ; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | |
|------------------------|--|

03.02.06 Strato di tenuta in lastre di acciaio

Essa è caratterizzata da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di posa che varia a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.06.01 |
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|--|
| Pulizia manto di copertura: Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle lastre di acciaio ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche. [con cadenza ogni 6 mesi] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° ; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | |
|------------------------|--|

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.06.02 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Ripristino manto di copertura: Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori. [quando occorre] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|---|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° ; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | |
|------------------------|--|

03.02.07 Strato di tenuta in lastre di ardesia

Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di posa che varia a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.07.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|--|
| Pulizia manto di copertura: Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle lastre di ardesia ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche. [con cadenza ogni 6 mesi] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | |
|------------------------|--|

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.07.02 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|

| | |
|---|--|
| Ripristino manto di copertura: Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori. [quando occorre] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |
|---|--|

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| Tavole Allegate |
|-----------------|
| |

03.02.08 Strato di tenuta in lastre di fibro-cemento

Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di posa che varia a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.08.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|--|
| Pulizia manto di copertura: Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle lastre di fibro-cemento ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche. [con cadenza ogni 6 mesi] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--------------------------------|--|---|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, |

| | | |
|--|--|--|
| | anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | |
|------------------------|--|

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.08.02 |
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Ripristino manto di copertura: Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori. [quando occorre] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| |
|---|
| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | |
|------------------------|--|

03.02.09 Strato di tenuta in lastre di rame

Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di posa che varia a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.09.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Pulizia manto di copertura: Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori. [con cadenza ogni 6 mesi] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| Tavole Allegate |
|-----------------|
| |

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.09.02 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Ripristino manto di copertura: Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori. [quando occorre] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|-----------------------------|--|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°; Scale retrattili a | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |

| | | |
|--|---|--|
| | gradini | |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | |
|------------------------|--|

03.02.10 Strato di tenuta in tegole

Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di posa che nel caso di manto di copertura in tegole varia in media del 33-35% a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.10.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Pulizia manto di copertura: Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle tegole ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche. [con cadenza ogni 6 mesi] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

Tavole Allegate**Scheda II-1**
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.10.02 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Ripristino manto di copertura: Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori. [quando occorre] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

Tavole Allegate**03.02.11 Strato di tenuta in tegole bituminose**

Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di posa che nel caso di manto di copertura in tegole bituminose varia in media del 33-35% a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.11.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|--|
| Pulizia manto di copertura: Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle tegole bituminose ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche. [con cadenza ogni 6 mesi] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro | | |
|--|--|--|
| | | |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° ; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| Tavole Allegate | |
|-----------------|--|
|-----------------|--|

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.02.11.02 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Ripristino manto di copertura: Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori. [quando occorre] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro | | |
|--|--|--|
| | | |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° ; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|--|
| Tavole Allegate | |
|------------------------|--|

03.03 Infissi esterni

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

03.03.01 Serramenti in legno

I serramenti in legno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata qualità con struttura interna priva di difetti, piccoli nodi, fibra diritta. Le specie legnose più utilizzate sono l'abete, il pino, il douglas, il pitch-pine, ecc..

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.03.01.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|--|
| Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. [con cadenza ogni 3 anni] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|--|---|
| Accessi ai luoghi di lavoro | | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tavole Allegate | progetto architettonico |
|------------------------|-------------------------|

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.03.01.02 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|--|
| Ripristino ortogonalità telai mobili: Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. [con | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi. |

| | |
|--------------------|--|
| cadenza ogni anno] | |
|--------------------|--|

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|--|---|
| Accessi ai luoghi di lavoro | | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tavole Allegate | progetto architettonico |
|------------------------|-------------------------|

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.03.01.03 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|---|
| Ripristino protezione verniciatura infissi: Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. [con cadenza ogni 2 anni] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|--|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua | |

| | | |
|---------------------------------|----------|--|
| | potabile | |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tavole Allegate | progetto architettonico |
|------------------------|-------------------------|

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.03.01.04 |
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|---|
| Ripristino protezione verniciatura persiane: Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. [con cadenza ogni 2 anni] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|--|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tavole Allegate | progetto architettonico |
|------------------------|-------------------------|

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.03.01.05 |
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|--|
| Sostituzione infisso: Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. [con cadenza ogni 30 anni] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|--|---|
| Accessi ai luoghi di lavoro | | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tavole Allegate | progetto architettonico |
|------------------------|-------------------------|

03.04 Coperture piane

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane (o coperture continue) sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di tenuta all'acqua, indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non presenta soluzioni di continuità ed è composto da materiali impermeabili che posti all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di acque meteoriche. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: a) elemento di collegamento; b) elemento di supporto; c) elemento di tenuta; d) elemento portante; e) elemento isolante; f) strato di barriera al vapore; g) strato di continuità; h) strato della diffusione del vapore; i) strato di imprimitura; l) strato di ripartizione dei carichi; m) strato di pendenza; n) strato di pendenza; o) strato di protezione; p) strato di separazione o scorrimento; q) strato di tenuta all'aria; r) strato di ventilazione; s) strato drenante; t) strato filtrante.

03.04.01 Canali di gronda e pluviali

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.04.01.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Rinnovo del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, mediante inserimento di strati a secco o mediante colla. Rifacimento completo del manto mediante rimozione del vecchio manto se gravemente danneggiato. [con cadenza ogni 6 mesi] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|---------------|--|---|
|---------------|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tavole Allegate | progetto architettonico |
|------------------------|-------------------------|

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.04.01.02 |
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| |
|---|
| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tavole Allegate | progetto architettonico |
|------------------------|-------------------------|

03.04.02 Comignoli e terminali

Si tratta di elementi integrati nella copertura con la funzione di semplificare lo scambio di aeriformi con l'atmosfera in relazione agli impianti per fluidi del sistema edilizio di cui fanno parte. Di essi fanno parte: a) i camini (la parte della canna fumaria che emerge dalla copertura con la funzione di fuoriuscita dei prodotti derivanti dalla combustione ad una altezza maggiore rispetto a quella di copertura); b) gli sfiati (La parte delle canalizzazioni che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare lo sfogo degli aeriformi in atmosfera); c) gli aeratori (gli elementi che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare il passaggio di aria con l'atmosfera); d) terminali di camini per lo sfato (gli elementi situati all'estremità di camini e sfiati con la funzione di permettere il tiraggio e la dispersione dei prodotti di combustione e degli aeriformi nell'atmosfera nonché di fungere da protezione dagli agenti atmosferici le canalizzazioni inferiori).

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.04.02.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Riverniciature: Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche dei terminali delle coperture. [con cadenza ogni 5 anni] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tavole Allegate | progetto architettonico |
|------------------------|-------------------------|

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.04.02.02 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|--|
| Ripristino comignoli e terminazioni condutture: Ripristino dei condotti, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Ripristino degli elementi di fissaggio. Rimozione di | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| | |
|---|--|
| eventuali nidi o di altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli. [con cadenza ogni anno] | |
|---|--|

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° ; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tavole Allegate | progetto architettonico |
|------------------------|-------------------------|

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.04.02.03 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|---|--|
| Pulizia dei tiraggi dei camini: Pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi provenienti dai prodotti della combustione. [con cadenza ogni 6 mesi] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro |
|--|
| |

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° ; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione | | Zone stoccaggio materiali. |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| materiali | | |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tavole Allegate | progetto architettonico |
|------------------------|-------------------------|

03.04.03 Parapetti ed elementi di coronamento

Si tratta di elementi affioranti dalla copertura con la funzione di riparo, difesa o in alternativa di decorazione. Di essi fanno parte: a) i parapetti (la cui funzione è quella di riparare persone e cose da eventuali cadute nel vuoto); b) i coronamenti (si tratta di elementi perimetrali continui sporgenti alla copertura con funzione decorativa e in alcuni casi anche di parapetto); c) gli ornamenti (la cui funzione è di abbellimento delle coperture).

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 03.04.03.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione | | |

| Tipo di intervento | Rischi rilevati |
|--|--|
| Ripristino coronamenti: Ripristino degli elementi costituenti i coronamenti con funzione decorativa mediante integrazione di parti mancanti e/o sostituzione di parti ammalorate con materiali idonei. Interventi mirati al mantenimento delle condizioni di stabilità e sicurezza qualora i coronamenti abbiano anche funzione integrativa di parapetto. Pulizia e lavaggio delle parti decorative con prodotti e detergenti specifici. [con cadenza ogni 3 anni] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. |


Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
|--|---|--|
| Accessi ai luoghi di lavoro | Botole orizzontali; Botole verticali; Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°; Scale retrattili a gradini | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori | Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | | Zone stoccaggio materiali. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | | Deposito attrezzature. |
| Igiene sul lavoro | Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile | Gabinetti; Locali per lavarsi. |
| Interferenze e protezione terzi | | |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tavole Allegate | progetto architettonico |
|------------------------|-------------------------|

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie





Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa
Distretto di SASSARI



PROGRAMMA DI INTERVENTO DI COSTRUZIONE ALLOGGI E.R.P.
Delibera G.R. n.71/32 del 16/12/2008

PROGETTO

COSTRUZIONE DI N.20 ALLOGGI A TEMPIO loc. Poi e Mantelli

Tav. n°

H

PIANO DI SICUREZZA

Data: Marzo 2011

Il Progettista
(Ing. Gianpaolo Sanna)

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuliano Pazzola)

Il Direttore Generale
(Ing. Sebastiano Bitti)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: COSTRUZIONE DI N. 20 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI TEMPIO IN LOC. POI - MANTELLI

COMMITTENTE: A.R.E.A. Azienda regionale Edilizia Abitativa - Distretto di Sassari

CANTIERE: VIA PERTINI, TEMPIO (SS)

TEMPIO, lì MARZO /2011

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Geometra Pazzola Giuliano)

IL COMMITTENTE

(PRESIDENTE _____)

Geometra Pazzola Giuliano
via A. Cervi 12 07100 Sassari (SS) 079 221200
giulio.pazzola@area.sardegna.it

LAVORO

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

| | |
|--------------------------------|---|
| Natura dell'Opera: | Opera Edile |
| OGGETTO: | COSTRUZIONE DI N. 20 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI TEMPPIO IN LOC POI - MANTELLI |
| Importo presunto dei Lavori: | 1 ´290´148,00 euro |
| Numero imprese in cantiere: | 1 (previsto) |
| Numero di lavoratori autonomi: | 1 (previsto) |
| Numero massimo di lavoratori: | 10 (massimo presunto) |
| Entità presunta del lavoro: | 2201 uomini/giorno |
| Data inizio lavori: | 01/09/2011 |
| Data fine lavori (presunta): | 21/02/2013 |
| Durata in giorni (presunta): | 540 |

Dati del CANTIERE:

| | |
|-----------|---------------------|
| Indirizzo | VIA PERTINI |
| Città: | TEMPPIO (SS) |

COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

| | |
|------------------|---|
| Ragione sociale: | A.R.E.A. Azienda regionale Edilizia Abitativa - Distretto di Sassari |
| Indirizzo: | via A. Cervi 12 |
| Città: | Sassari (SS) |
| Telefono / Fax: | 079221200 079242007 |

nella Persona di:

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Nome e Cognome: | _____ |
| Qualifica: | PRESIDENTE |
| Indirizzo: | Via C.Battisti 6 |
| Città: | CAGLIARI (CA) |
| Telefono / Fax: | 070 20071 070 271066 |
| Partita IVA: | 03077790925 |
| Codice Fiscale: | 03077790925 |

RESPONSABILI

Progettista:

Nome e Cognome: **SANNA GIANPAOLO**
Qualifica: **INGEGNERE**
Indirizzo: **via A. Cervi**
Città: **Sassari (SS)**
CAP: **12**
Telefono / Fax: **079221200 079242007**
Indirizzo e-mail: **gianpaolo.sanna@area.sardegna.it**

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: **SEBASTIANO MONTI**
Qualifica: **Geometra -Funzionario A.R.E.A. Distretto di Sassari**
Indirizzo: **via A. Cervi 12**
Città: **Sassari (SS)**
CAP: **07100**
Telefono / Fax: **079 221200 079 242007**
Indirizzo e-mail: **sebastiano.monti@area.sardegna.it**
Codice Fiscale: **MNTSST50D16G178G**

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: **Giuliano Pazzola**
Qualifica: **Geometra**
Indirizzo: **via A. Cervi 12**
Città: **Sassari (SS)**
CAP: **07100**
Telefono / Fax: **079 221200**
Indirizzo e-mail: **giulio.pazzola@area.sardegna.it**
Codice Fiscale: **PZZGLN52T07I614X**

IMPRESE

DATI IMPRESA:

Impresa: **Appaltatrice**
Ragione sociale: **Impresa Edile**
Tipologia Lavori: **OPERE DI EDILIZIA**

DATI IMPRESA:

Impresa: **Subappaltatrice**
Ragione sociale: **Impresa Movimenti Terra e scavi**

DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed indirizzi utili

GUARDIA MEDICA - 07029 Tempio Pausania (OT) Via Grazia Deledda tel: 079 631477

EMERGENZA SICUREZZA

VIGILI DEL FUOCO - Soccorso Tel. 115

VIGILI DEL FUOCO- 07029 Tempio Pausania (OT) 11, Via De Nicola Enrico tel: 079 631283

CARABINIERI - Pronto Intervento Tel. 112

CARABINIERI-07014 07029 Tempio Pausania (OT) 37, Viale Sturzo Don tel: 079 631107, 079 631367

POLIZIA DI STATO - Soccorso Pubblico Tel. 113

EMERGENZA AMBIENTALE

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE. 07014 07029 Tempio Pausania (OT) 18, Via S. Lorenzo tel: 079 671355

SEGNALAZIONE GUASTI

ABBANOA - Gestore Servizio Idrico Uffici 07029 Tempio Pausania (OT) 8, V. Belluno tel: 0789 648080, 079 632179

ENEL DISTRIBUZIONE Tel. 800 900 800

Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:

1. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008);
2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
3. Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
4. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
6. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
7. Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
10. Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
11. Verbal di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);
12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
14. Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
6. Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE;
12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
14. Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
15. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi metallici fissi;
17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in autorizzazione ministeriale;
19. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
20. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
21. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in esercizio;
22. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;
23. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);
24. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Le aree interessate dall'intervento si trovano all'interno di un contesto urbanistico di media densità abitativa nel quartiere denominato " Poi e Mantelli ". Sono comprese nel P.d.Z. precisamente nei Comparti 42 e 52, per complessivi mq 4.039. Il contesto urbanistico è pressochè definito con la presenza determinante di una edificazione di tipo economico popolare e sovvenzionata (cooperative ecc.) Le altezze degli edifici circostanti sono limitate ai tre piani fuori terra. La Viabilità principale è abbastanza definita ed interessa la Via Togliatti, la Via La Malfa e la Via Sandro Pertini.

Sia la presenza degli edifici confinanti che di quelli frontistanti l'area in oggetto non interferisce sull'eventuale posizionamento di una gru a torre a servizio dl cantiere.

Durante la movimentazione di carichi sospesi con l'utilizzo della gru, si adotteranno tutte quelle precauzioni e misure atte a ridurre se non ad eliminare i rischi connessi con le lavorazioni .

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Descrizione dell'intervento

L'intervento in progetto propone la realizzazione di venti alloggi di ERP in due edifici a tre piani, ciascuno con dieci alloggi, due dei quali, posti a piano terra, avranno una superficie di 95 mq mentre nei piani 1. e 2. si prevedono 4 alloggi per piano, ognuno con una superficie di 57mq.

I due fabbricati, su due lotti distinti, sono caratterizzati da una completa autonomia degli accessi e totale indipendenza della gestione degli spazi scoperti.

L'accesso al singolo edificio avverrà direttamente dal percorso pedonale che si apre sulla Via esistente.

Gli ingressi ai due fabbricati avverranno oltre che attraverso una breve scala esterna necessaria per il superamento del dislivello presente, tramite una rampa con pendenza massima dell'8%. All'interno dei vani scala è presente, nel caso del lotto 42 (EDIFICIO A piano interrato più tre livelli), un vano ascensore dotato di macchinario elevatore, mentre, nel caso del lotto 52 (piano terra più due livelli) un vano chiuso in muratura in cui si prevede, in futuro, l'installazione dell'ascensore che oggi, per motivi economici, non è previsto. Al piano terra è inoltre presente, in entrambi gli edifici, un ambiente ad uso condominiale, con accesso diretto dall'atrio di ingresso.

Le auto, con ingresso diretto dalla Via esistente, avranno a disposizione due spazi per parcheggio, il primo, nel lotto 52, della capacità di 10 posti scoperti, in prossimità degli alloggi. Il secondo, nel lotto 42, è previsto nel piano seminterrato che per effetto del dislivello presente si verrà a creare; anche qui troveranno ricovero 10 autovetture.

Gli spazi scoperti residui saranno destinati a verde privato o pubblico, come chiaramente indicato negli elaborati grafici di progetto.

Lo sviluppo sia planimetrico che prospettico degli edifici è caratterizzato da un'evidente regolarità, dovuto alla forma e alle dimensioni del lotto. Le terrazze presenti, più profonde in corrispondenza della zona giorno, agevoleranno l'utilizzo degli spazi all'aperto durante la stagione climaticamente più favorevole. Sulle coperture a falde inclinate si prevede l'installazione, per ciascun edificio, di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 13 kWp per la produzione di energia elettrica di cui potranno beneficiare gli inquilini che occuperanno gli alloggi (queste opere non sono inserite nel piano economico ma potranno essere realizzate con specifico finanziamento o con accesso al "conto energia").

Con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non solo si ridurranno le spese energetiche per le utenze elettriche presenti, ma si contribuirà attivamente all'attuazione del programma energetico nazionale nella riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e nella promozione delle fonti energetiche rinnovabili, oltre a ridurre le emissioni inquinanti (la riduzione prevista di CO₂ è di circa 13,8 ton/anno) e svolgere una funzione educativa indirizzata al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Il rispetto dei parametri urbanistici-edilizi indicati è deducibile dalla lettura della seguente tabella:

| | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| - superficie complessiva lotto | $S_{\text{lotto}} =$ | 3.889,00 mq |
| - superficie coperta in progetto | $S_{\text{cpr}} =$ | 589,94 mq |
| - rapporto di copertura progetto | $R_r =$ | 0,15 mq/mq |
| - volume in progetto | $V_{\text{pr}} =$ | 5.264,08 mc |
| - Indice fondiario | $i_{\text{ff}} =$ | 1,35 mc/mq |
| - Altezza massima in progetto | $H =$ | 8,60 m (inferiore a 9,50 m). |

Abbattimento barriere architettoniche

L'abbattimento delle barriere architettoniche è garantito dalla presenza delle rampe di raccordo con pendenza non superiore all'8%, in corrispondenza degli accessi all'edificio. Per far fronte ad eventuali utenti portatori di handicap si è riservata, in ciascun alloggio, una quota di tre alloggi, uno dei quali con superficie di mq 95 e due con superficie di mq 57; tali unità sono dotate di accessi adeguati e bagno speciale, nel rispetto di quanto imposto dalla normativa.

Consistenza dell'intervento

Le superfici complessive degli alloggi sono le seguenti:

| | | |
|-------------------------------|------------|-------------|
| - Superficie utile | $S_U =$ | 1.285,72 mq |
| - Superficie non residenziale | $S_{NR} =$ | 536,64 mq |
| - Superficie parcheggi | $S_P =$ | 197,20 mq |
| - Superficie complessiva | $S_C =$ | 1726,02 mq |

| S all og gio (m q) | tipologia | n. alloggi |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| 95 | multipiano 3 camere da letto | 4 |
| 57 | multipiano 2 camere da letto | 16 |
| | Totale alloggi | 20 |

Tecnologie e materiali proposti.

Saranno di tipo tradizionale, ed in particolare:

strutture di fondazione in c.a.;

murature perimetrali portanti in blocchi di legno-cemento coibentati e eventuali pilastri in c.a. nella zona centrale dell'edificio;

solai misti a blocchi di laterizio;

copertura a tetto su struttura in laterizio;

tramezzature in laterizio forato;

intonaco civile a base di malta bastarda e tinteggiature con idropittura nei colori tradizionali già presenti negli edifici limitrofi;

infissi in legno e ringhiere/inferriate metalliche;

pavimentazioni e rivestimenti in cotto/ceramica;

impianto elettrico sottotraccia;

impianto idrico sottotraccia in polietilene e rame sanitario derivato dalla condotta comunale esistente;

impianto fognario in polietilene/pvc allacciato al collettore fognario esistente.

Tutti gli impianti saranno adeguati ai regolamenti e alle normative vigenti in materia.

AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

L'area su cui è previsto l'intervento è ubicata nel quartiere denominato "Poi e Mantelli". Si compone di due lotti distinti che si avvicinano ma non si uniscono nel punto di convergenza delle due strade Via La Malfa e Via Pertini. Il lotto su cui insiste l'edificio denominato "A" ha forma allungata semicircolare di larghezza quasi costante con un dislivello di circa 5 ml nella direzione Nord-nord ovest e confina con un tratto di Via Pertini, con un tratto di via La malfa sul lato a Nord ovest con lotti adiacenti la Via Romita e il lato a ovest con lotto edificato su tre piani. Il lotto su cui insiste l'edificio denominato "B" ha forma trapezoidale, con dislivello di circa ml 7 nella direzione nord-nord ovest per un lato (base maggiore) con Via Togliatti, per un lato con Via La Malfa e confluenza di Via Pertini (base minore) e per un lato su lotto edificato.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collocherà il cantiere è uno dei passaggi fondamentali per giungere alla progettazione del cantiere stesso. E' possibile, infatti, individuare rischi che non derivano dalle attività che si svolgeranno all'interno del cantiere ma che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti. L'individuazione di tali sorgenti di rischio permette l'introduzione di procedure e/o protezioni finalizzate alla loro minimizzazione. Stante il contesto in cui è collocato l'intervento e malgrado al momento nessuna attività pericolosa risulta essere insediata in vicinanza del cantiere, si prevedono pericoli derivanti da situazioni ambientali esterne, quali traffico extraurbano, cittadino e pedonale. Pertanto, al fine di evitare eventuali pericolose interferenze delle attività di cantiere con l'ambiente esterno, tutte le lavorazioni dovranno svolgersi all'interno di un'area adeguatamente segnalata, con divieto d'accesso e di pericolo ai non addetti ai lavori.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

Trattandosi di un'area nell'immediata periferia ma inserita nel contesto urbano insediato, le lavorazioni possono dar luogo a rischi sensibili per l'area circostante, in particolare nei confronti del traffico veicolare, in occasione delle operazioni che richiedono impiego di automezzi quali quelle di approvvigionamento e/o allontanamento di attrezzature e materiali per il cantiere.

Si dovranno prestare le normali misure di cautela per evitare ogni tipo di rischio, il tutto commisurato al tipo di operazioni e alla frequenza delle stesse, ed in particolare:

Rischio Rilevato Misure di prevenzione e protezione Incidente/Investimento di persone da parte di macchine operatrici e materiali

SI deve delimitare preventivamente l'area interessata dall'attività;

Posizionare l'opportuna segnaletica in corrispondenza dell'accesso al cantiere;

Delimitare l'area di intervento di manovra;

Segnalare con personale a terra l'entrata e l'uscita dei mezzi; Segnalare con personale a terra le operazioni di carico/scarico dai mezzi.

Caduta di materiale dall'alto/Urto di persone con materiale Il rischio è sensibile, considerata la natura dei lavori e la posizione dei fabbricati, circondati da aree di pertinenza sufficientemente ampie Emissione di agenti inquinanti fisici:

In relazione alle specifiche attività svolte, devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare l'emissione di inquinanti fisici o chimici (rumori, polveri, gas o vapori e quant'altro). In particolare: Emissione di rumori: la propagazione dei rumori verrà ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori più rumorosi, in vicinanza della altre proprietà, vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata e del pomeriggio.

Relativamente alle emissioni di rumore si ricorda la necessità di rispetto del D.P.C.M. 1 marzo 1991, relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, con riguardo alle attività cosiddette temporanee

Emissione di polveri: è opportuno, specialmente durante le giornate ventilate, inumidire gli accumuli di detriti in modo da ridurre al minimo le emissioni. Inoltre, al fine di evitare rischi di inciampo e di scivolamento per eventuali passanti e conducenti di ciclomotori e biciclette, si dovrà porre particolare attenzione alla pulizia dalle polveri e dai detriti che possono accumularsi a seguito della loro movimentazione e del loro trasporto, lungo la sede stradale.

In cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, pertanto è da escludere la possibile trasmissione di questi all'esterno dell'area di intervento.

Verrà messa in atto una sorveglianza specifica da attuarsi durante ogni operazione che possa propagare l'incendio.

L'accesso al cantiere sarà consentito esclusivamente alle persone autorizzate dalla Direzione dei lavori e agli Ispettori degli organi di vigilanza.

Tutte le persone estranee all'attività lavorativa durante la loro presenza all'interno del cantiere, dovranno essere sempre accompagnate da personale di cantiere.

Per la gestione di questi rischi occorrerà informare i lavoratori e gli eventuali visitatori in merito ai rischi e le misure di prevenzione da intraprendere per una sicura gestione delle attività lavorative.

Si prescrive inoltre quanto segue:

- 1) Ordinare i lavori nello spazio, vietando con opportuni segnali, il transito e la sosta di persone in vicinanza dell'area transennata;
- 2) Ordinare i lavori nel tempo, in modo che l'eventuale transito obbligato di persone nelle immediate vicinanze dei lavori, avvenga a macchinari fermi ed operai in massima allerta, ad evitare ogni possibile pericolo ai passanti;
- 3) Interdire la sosta in prossimità dei tratti in lavorazione a ridosso della recinzione, nonché interdire, se necessario e deviare, se possibile, il flusso veicolare;
- 4) Effettuare il transito, il carico e lo scarico dei materiali nel rispetto delle stesse prescrizioni di cui ai punti precedenti; a tal proposito si sottolinea che il passaggio di escavatori e mezzi pesanti dovrà sempre avvenire in assenza di persone estranee ai lavori. Perché ciò si verifichi occorre predisporre un'attenta vigilanza e la relativa segnalazione.



La zona in esame si localizza per intero all'interno dell'area occupata dal grande batolite granitico della Gallura, che costituisce l'ossatura della Sardegna nord-orientale, e più precisamente nelle falde nord-occidentali del massiccio del Limbara.

La regione è dunque costituita da rocce granitiche di età paleozoica, attraversate da manifestazioni filoniane sia acide (micrograniti, quarzo, pegmatiti) che basiche (lamprofiri).

Da una prima analisi petrografica, le rocce costituenti il plutone granitico, possono essere distinte in due tipi litoidi fondamentali: uno granodioritico ed uno granitico "stricto sensu", quest'ultimo più frequente dell'altro e costituito in massima parte da graniti normali, pegmatitici e micrograniti.

La messa in posto del batolite granitico viene universalmente attribuita a fenomeni di magmatismo sinorogenico connessi con le azioni orogenetiche del ciclo ercinico.

Conseguentemente all'insorgere delle poderose forze orogenetiche, e unitamente alle fenomenologie di contatto, si venne a determinare una profonda trasformazione dei sedimenti terrigeni che costituivano un nucleo primitivo di terre mediterranee.

I prodotti di questa intensa azione metamorfica si possono rilevare, seppure in piccole chiazze, anche a non considerevoli distanze dall'area in oggetto e consentono di ipotizzare una ben più ampia estensione delle coperture metamorfiche.

In questa regione infatti i processi erosivi, operando intensamente sulla copertura scistosa, hanno messo a nudo il nucleo granitico che affiora oggi su una superficie di oltre 1.500 chilometri quadrati e costituisce la più vasta area granitica della Sardegna e una delle più importanti d'Europa.

Tale evoluzione morfologica si è dunque prodotta in un lungo periodo di stasi orogenetica che ha nel contempo determinato l'irrigidimento dello zoccolo scistoso cristallino.

Le azioni della tettonica terziaria si sono manifestate, in questa regione periferica rispetto allo svolgersi della orogenesi alpina, attraverso delle intense azioni disgiuntive che, agendo sull'ormai rigido basamento scistoso-cristallino, hanno originato delle profonde fratture con conseguenti dislocazioni e formazioni di ampie fosse tettoniche.

La catena dei Monti del Limbara, che limita l'area in esame nel settore meridionale, si colloca in continuità strutturale con il pilastro settentrionale del graben di Chilivani, derivato appunto dalla tettonica terziaria.

A tali azioni disgiuntive hanno inoltre fatto seguito delle copiose profusioni di magmi, a chimismo prevalentemente trachitico, che si sono espansi in varie fasi intercalandosi ai prodotti della deposizione marina e lacustre dei bacini derivati dallo sprofondamento di blocchi dello zoccolo.

Sedimenti lacustri, da associare alla formazione del bacino di Oschiri, si rilevano in affioramento solo ad una certa distanza dall'area di nostro interesse e, più precisamente, a sud della S.S. N. 199 in corrispondenza del km. 32.

Tale affioramento costituisce anzi l'estrema propaggine orientale della formazione lacustre del bacino di Oschiri, talché dal rilievo di P.ta Tilicu Mannu ci si riporta nel più esteso dominio granitico.

L'area in esame si colloca presso l'alveo di un affluente di destra del Rio Manzoni, il cui bacino imbrifero ha il limite che si produce sulla vetta di M.te San Giorgio (725 m.s.m.)

In contrapposizione alla maggiore asprezza del paesaggio rilevabile nei domini circostanti, l'area oggetto dell'intervento è caratterizzata da una morfologia collinare, che si produce verso nord-est in morbide forme ampiamente raccordantesi e assolutamente priva di brusche variazioni delle pendenze che si conservano generalmente entro valori non particolarmente elevati; in particolare lungo la direttrice orientata verso Nurchis si osserva come il Rio Parapinta e San Paolo sviluppano i loro corsi tra i rilievi collinari di Nuracu, Ziu Lisandru e M.te Zighinu - tutti aventi un'altitudine intorno ai 500 m.s.m., che rappresentano le quote più elevate, mentre nell'intorno il paesaggio si caratterizza per le tenui pendenze dei versanti.

Una variamente potente coltre eluviale, ricoprente l'imbasamento granitico, addolcisce parzialmente la morfologia dei rilievi meno elevati, talché la regolarità delle forme è solo localmente interrotta dai cumuli di blocchi granitici che, emergendo dalla coltre eluviale, rompono la monotonia del paesaggio.

La valle -fortemente asimmetrica a causa delle elevate quote meridionali della catena del Limbara che non si ripetono nei rilievi settentrionali della direttrice Bortigiadas-Agius- è bordata dagli aspri rilievi del Limbara che degradano, dalle numerose quote superiori ai mille metri, attraverso ripidissimi versanti incisi da corsi d'acqua che sovente danno luogo a piccole cascate.

Le vette più elevate, e non solo, sono modellate spesso in forma di guglie che incombono sulla valle e che, in ragione della loro precaria stabilità e dell'intensa fratturazione del granito, sono all'origine delle numerose frane di crollo che hanno cosparso i versanti dei rilievi di enormi blocchi di roccia.

Il reticolo idrografico, che si sviluppa a carattere dendritico, è spesso impostato su elementi strutturali preesistenti, com'è facile dedurre dall'incisione di certe valli o dalle improvvise variazioni della direzione dei corsi d'acqua. Dall'analisi eseguita e sulla base dei calcoli prodotti è stato possibile esprimere una valutazione dei valori di carico ammissibile, relativamente ai terreni di fondazione delle due strutture residenziale previste da AREA in via Pertini, a Tempio Pausania, e nel lotto immediatamente a sud-est del primo..

Sono state dunque dedotte, secondo le ipotesi progettuali, i valori delle tensioni di rottura del terreno di fondazione. Relativamente alle caratteristiche del terreno di fondazione è stato rilevato che presenta, nel complesso, discrete caratteristiche geotecniche, come si evince appunto dai dati fisico-meccanici provenienti dalle analisi di laboratorio. I sondaggi eseguiti hanno dunque consentito di ricostruire la successione stratigrafica con cui la formazione in posto si produce.

Tutti i sondaggi hanno intercettato una copertura organica costituita da sabbioni arcocici debolmente pedogenizzati ed aventi spessori variabili da pochi centimetri, in via Pertini, a poco meno di un metro nel lotto sud.; successivamente lo scavo ha intercettato immediatamente il granito arenizzato e rapidamente tendente al lapideo, in via Pertini, mentre ha attraversato livelli compresi tra 1.00 e 1.50 m di sabbione arcocico nel lotto sud.

Non è stata ravvisata alcuna circolazione idrica per cui, considerato che i sondaggi sono stati eseguiti dopo un lungo periodo di abbondanti piogge, si deve dedurre l'assenza di falda nei livelli pur permeabili di sabbione arcocico che ricopre la base granitica..

Il calcolo della capacità portante è stato sviluppato ipotizzando un comportamento meccanico ascrivibile ai terreni litoidi e il carico unitario ammissibile (q_a) è risultato di un ordine superiore a quanto comportano le ipotesi progettuali.

Relativamente al lotto ubicato immediatamente a sud di via Pertini, è stato rilevato, attraverso i sondaggi eseguiti, un livello costituito da sabbioni arcosici, derivati dalla degradazione del granito, che saranno presumibilmente interessati dalla strutture di fondazione.

Su tali terreni è stato valutata una possibilità portante dell'ordine di $1.6-1.7 \text{ kg/cm}^2$.

Poiché è possibile che nel corpo dei sabbioni arcosici siano contenuti dei nuclei di roccia compatta che potrebbero dare luogo a pericolose discontinuità del terreno di fondazione, sarà importante precauzione quella di eseguire, una volta sbancato il terreno e individuato il piano di posa, delle attente osservazioni su tale piano allo scopo di verificare le reali condizioni di omogeneità del terreno di fondazione; tale verifica è necessaria anche nel lotto di via Pertini allo scopo di evitare eventuali e negative ripercussioni sulla struttura a seguito di soluzioni nella continuità delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione.

Tratto dallo studio Tecnico-geologico del **Dr. Geol. Emilio Fenu**

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Al termine della recinzione del cantiere dovrà provvedersi alla definizione dei percorsi carrabili e pedonali, così come indicati in planimetria. Nel tracciamento dei percorsi carrabili, si è tenuto conto di utilizzare una fascia di mt 1, per i percorsi pedonali, oltre la sagoma di ingombro del veicolo; Si dovranno tenere presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti nell'area di cantiere.

Recinzioni di cantiere

L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio (generalmente m. 2), in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni. Il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a particolare pericolosità, qual è quella di accesso al cantiere.

Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore notturne l'ingombro della recinzione sarà evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

- 1) Recinzione del cantiere: modalità realizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Recinzione del cantiere: generale. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio (generalmente m. 2), in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni. Il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Recinzione del cantiere: accessi pedonali e carrabili. Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a particolare pericolosità, qual è quella di accesso al cantiere.

Recinzione del cantiere: evidenziazione dell'ingombro. Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore notturne l'ingombro della recinzione sarà evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 109; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 15, Punto 2.2.

- 2) segnale:  Pericolo generico;
- 3) segnale:  Uscita autoveicoli;
- 4) segnale:  Divieto accesso persone;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza;

- 6) segnale:  Casco obbligatorio;

Rischi specifici:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provvisorie, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.
- 2) Scivolamenti, cadute a livello;
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro.
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo manuale o a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere.

Impianti elettrico, dell'acqua, del gas, ecc.

Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del cantiere stesso. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, l'impianto di messa a terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, l'impianto idrico, quello di smaltimento delle acque reflue, ecc.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre l'assemblaggio di tali componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere: non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1);

non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da parte di getti d'acqua.

Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo:

IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Appena ultimati i lavori di movimento terra, dovrà iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a terra per il cantiere, che dovrà essere unico.

L'impianto di terra dovrà essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo si costruirà l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto di messa a terra, inoltre, dovrà essere realizzato ad anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra.

Qualora sul cantiere si renda necessario la presenza anche di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, allora l'impianto di messa a terra dovrà, oltre ad essere unico per l'intero cantiere, anche essere collegato al dispersore delle scariche atmosferiche.

Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere collegate all'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si dovrà riferire ad un apposito calcolo di verifica, eseguito secondo le vigenti norme CEI.

Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potrà formulare.

Modalità di accesso dei mezzi di fornitura materiali

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale di mezzi per la fornitura di materiali, la cui frequenza e quantità è peraltro variabile anche secondo lo stato di evoluzione della costruzione, si procederà a redigere un programma degli accessi, correlato al programma dei lavori.

In funzione di tale programma, al cui aggiornamento saranno chiamati a collaborare con tempestività i datori di lavoro delle varie imprese presenti in cantiere, si prevederanno adeguate aree di carico e scarico nel cantiere, e personale a terra per guidare i mezzi all'interno del cantiere stesso.

Baracche

La baracca, che verrà utilizzata come spazio comune per gli operai (spogliatoio ecc) ed in parte e provvisoriamente come ufficio in cantiere, sarà posizionata sulla destra rispetto all'ingresso del cantiere in una posizione che consente un'accesso quasi immediato a tutte le maestranze ed addetti ai lavori. E' vicino alla viabilità di cantiere ed alla viabilità principale comunale, è in prossimità degli allacci elettrici, idrici e fognari. Non si rappresentano rischi particolari e si raccomanda la semplice tenuta dei DPI di rito.

Gabinetti

I servizi igienici sono costituiti da strutture prefabbricate e saranno posizionati sulla destra rispetto all'ingresso del cantiere adiacente alla baracca in una posizione che consente un'accesso quasi immediato a tutte le maestranze ed addetti ai lavori. E'

vicino alla viabilità di cantiere ed alla viabilità principale comunale, è in prossimità degli allacci elettrici, idrici e fognari. Non si rappresentano rischi particolari e si raccomanda la semplice tenuta dei DPI di rito.

Betoniere

La betoniera, sarà posizionata in prossimità del silos del cemento e calce, della zona di carico e scarico materiali e zona di stoccaggio materiali, così come evidenziato nella planimetria descrittiva.

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

- 1) Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari;

Prescrizioni Organizzative:

Organi rotanti: verifiche. Bisogna far eseguire da personale specializzato, periodicamente ed ogni qualvolta se ne evidenzia la necessità, verifiche sugli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura.

Prescrizioni Esecutive:

Cuscinetti: verifiche. Deve costantemente essere verificato lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare la opportunità della loro lubrificazione o sostituzione.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1.

- 2) Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, stritolamenti", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari;

Prescrizioni Esecutive:

Misurazioni di pezzi in lavorazione. Un pezzo in lavorazione deve essere misurato soltanto con la macchina ferma.

Verifiche delle protezioni prima della lavorazione. Ogni qualvolta il lavoratore si accinga ad iniziare una lavorazione, dovrà preventivamente accertarsi del corretto posizionamento dei carter e di tutte le protezioni da organi mobili.

- 3) Prevenzioni generali a "Urti, colpi, impatti, compressioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari;

Prescrizioni Esecutive:


Protezione dalle proiezioni di schegge e materiali. Nei lavori che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, come spaccatura o scalpellatura di blocchi o simili, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.


Distanza tra lavoratori. Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori durante l'uso di utensili, attrezzature a motore o macchinari.


Riferimenti Normativi:


D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.


- 4) segnale:  Pericolo generico;

- 5) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;

- 6) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;

- 7) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;

- 8) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

- 9) segnale:  Protezione obbligatoria del viso;

- 10) segnale:  Impianti elettrici;
Impianti elettrici sotto tensione

Rischi specifici:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provvisorie, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.
- 2) Elettrocuzione;
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore.
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
- 4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo manuale o a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere.

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Le zone di carico e scarico saranno posizionate nell'area nord del cantiere, in prossimità dell'accesso carrabile.

L'ubicazione di tali aree, inoltre, consentirà alla gru, di trasportare i materiali, attraversando aree dove non sono state collocate postazioni fisse di lavoro (ad esempio, piegaferri, sega circolare, betoniera a bicchiere, ecc.).

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

- 1) Aree di logistica: requisiti comuni;

Prescrizioni Organizzative:

Aree di carico e scarico: banchine e rampe di carico. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportabili. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.

Deposito di materiali in prossimità degli scavi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.


Deposito di diverse qualità di materie o prodotti pericolosi. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.

Deposito di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

Scarti e rifiuti. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplosivi, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

- 2) segnale:  Casco di protezione obbligatorio;
- 3) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 4) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Vietato passare carichi sospesi;
- 6) segnale:  Zona carico scarico;

Rischi specifici:

- 1) Caduta di materiali dall'alto o a livello;
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto o a livello presenti nell'area di insediamento del cantiere.
- 2) Movimentazione manuale dei carichi;
Lesioni a carico della zona dorso lombare causate, per la caratteristica o le condizioni ergonomiche sfavorevoli, a seguito di operazioni di trasporto o sostegno di un carico.
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo manuale o a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere.

Gru

La Gru ,sarà posizionata in prossimità del silos del cemento e calce ,della zona di carico e scarico materiali e zona di stoccaggio materiali, così come evidenziato nella planimetria descrittiva.

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

- 1) Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari;

Prescrizioni Organizzative:

Organi rotanti: verifiche. Bisogna far eseguire da personale specializzato, periodicamente ed ogni qualvolta se ne evidenzia la necessità, verifiche sugli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura.

Prescrizioni Esecutive:

Cuscinetti: verifiche. Deve costantemente essere verificato lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare la opportunità della loro lubrificazione o sostituzione.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1.

- 2) Prevenzioni generali a "Cesoamenti, stritolamenti", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari;

Prescrizioni Esecutive:

Misurazioni di pezzi in lavorazione. Un pezzo in lavorazione deve essere misurato soltanto con la macchina ferma.

Verifiche delle protezioni prima della lavorazione. Ogni qualvolta il lavoratore si accinga ad iniziare una lavorazione, dovrà preventivamente accertarsi del corretto posizionamento dei carter e di tutte le protezioni da organi mobili.

- 3) Prevenzioni generali a "Urti, colpi, impatti, compressioni", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari;






Prescrizioni Esecutive:

Protezione dalle proiezioni di schegge e materiali. Nei lavori che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, come spaccatura o scalpellatura di blocchi o simili, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.

Distanza tra lavoratori. Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori durante l'uso di utensili, attrezzature a motore o macchinari.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

- 4) segnale:  Pericolo generico;
- 5) segnale:  Divieto di accesso;
- 6) segnale:  Divieto generico;
- 7) segnale:  Vietato accesso;
Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori
- 8) segnale:  Calzature di sicurezza;
- 9) segnale:  Casco obbligatorio;
- 10) segnale:  Obbligo generico;

Rischi specifici:

- 1) Caduta di materiali dall'alto o a livello;
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto o a livello presenti nell'area di insediamento del cantiere.
- 2) Elettrocuzione;
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore.
- 3) Movimentazione manuale dei carichi;
Lesioni a carico della zona dorso lombare causate, per la caratteristica o le condizioni ergonomiche sfavorevoli, a seguito di operazioni di trasporto o sostegno di un carico.
- 4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo manuale o a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere.

Piegaferri

La Piegaferri è dislocata in posizione centrale rispetto al cantiere ed è protetta da una tettoia sia per quanto riguarda le eventuali cadute dall'alto che dagli agenti atmosferici.

La zona è adeguatamente segnalata per i rischi connessi alle lavorazioni. L'operatore dispone dei DPI già predisposti

Viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici

Al termine della recinzione del cantiere dovrà provvedersi alla definizione dei percorsi carrabili e pedonali, così come indicati in planimetria. Nel tracciamento dei percorsi carrabili, si è tenuto conto di utilizzare una fascia di mt 1, per i percorsi pedonali, oltre la sagoma di ingombro del veicolo; Si dovranno tenere presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti nell'area di cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

- 1) Percorsi carrabili: caratteristiche e condizioni;

Prescrizioni Organizzative:

Nella definizione dei percorsi carrabili, verificare: **a)** la capacità del terreno del cantiere a sopportare il carico della macchina: definire l'eventuale carico limite; **b)** la condizione manutentiva di eventuali opere di sostegno presenti, in particolare se a valle della zona di lavoro, onde evitarne il cedimento per il sovrappeso della macchina, con il conseguente ribaltamento della macchina stessa; **c)** la pendenza longitudinale e trasversale, che dovrà risultare contenuta ed adeguata ai mezzi d'opera che saranno utilizzati nel cantiere.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 108; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 1.

- 2) Percorsi carrabili: velocità dei mezzi d'opera;

Prescrizioni Organizzative:

Stabilire la velocità massima (15 km/h max) da tenere in cantiere per i mezzi d'opera, ed apporre idonea segnaletica.

- 3) Percorsi carrabili: segnaletica;

Prescrizioni Organizzative:

Predisporre adeguati percorsi di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 2.

- 4) Percorsi carrabili: rampe accesso scavi;

Prescrizioni Organizzative:

Le rampe di accesso allo scavo devono avere: **a)** pendenza adeguata alla possibilità della macchina; **b)** larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo; qualora detto franco venga limitato ad un solo lato per tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m. 20 lungo l'altro lato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 108; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 1.

- 5) Percorsi pedonali: parapetti;

Prescrizioni Organizzative:

I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 108; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 1.



- 6) segnale: Veicoli passo uomo;

Rischi specifici:

- 1) **Caduta di materiale dall'alto o a livello;**
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provvisorie, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.
- 2) **Investimento, ribaltamento;**
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.
- 3) **Scivolamenti, cadute a livello;**
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro.
- 4) **Seppellimento, sprofondamento;**
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre.
- 5) **Urti, colpi, impatti, compressioni;**
Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo manuale o a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere.



ATTENZIONE
ZONA AD ALTO RISCHIO
POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE
DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE
SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI
ESPOSIZIONE



VIETATO
L'INGRESSO
a tutte le persone
non autorizzate





È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI
DI PROTEZIONE PERSONALE IN
DOTAZIONE A CIASCUNO



E'
OBBLIGATORIO

L'USO DEI
MEZZI DI
PROTEZIONE

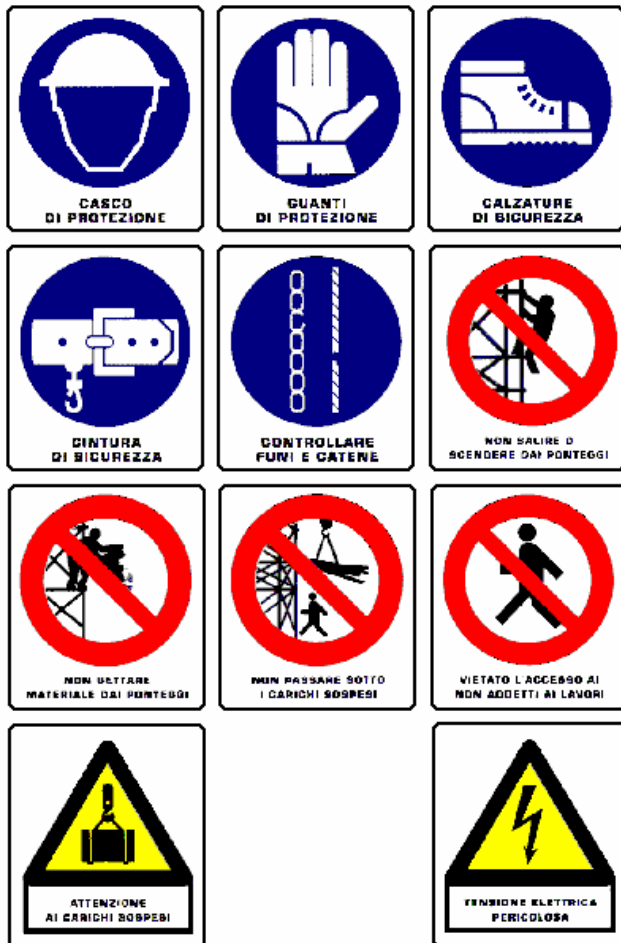

IMPIANTI ELETTRICI SOTTO TENSIONE

E' VIETATO:

- Eseguire lavori su impianti sotto tensione
- Toccare gli impianti se non si è autorizzati
- Togliere i ripari e le custodie di sicurezza prima di aver tolto la tensione



E' OBBLIGATORIO:

- Aprire gli interruttori di alimentazione del circuito prima di effettuare interventi
- Assicurarsi del collegamento a terra prima di lavorare
- Tenersi ben isolati da terra con mani e piedi asciutti o usando pedane e guanti isolati
- Tenere lontano dagli impianti materiali estranei



È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

**VIETATO
L'ACCESSO
AI NON ADDETTI
AI LAVORI**



**ZONA DI
DEPOSITO
ATTREZZATURE**

**AREA
DEPOSITO
MANUFATTI**

**ZONA
STOCCAGGIO
MATERIALI
PERICOLOSI**

**ZONA
STOCCAGGIO
MATERIALI**

**ZONA
STOCCAGGIO
RIFIUTI**

**ZONA DI
CARICO E
SCARICO**



**È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI
PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO**

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

20 ALLOGGI VIA PERTINI TEMPIO

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

EDIFICIO A

Allestimento del cantiere

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- Realizzazione della viabilità del cantiere
- Allestimento di servizi igienico del cantiere
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
- Realizzazione di impianto idrico del cantiere
- Montaggio della gru a torre
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

SCAVI E RINTERRI

- Scavo di sbancamento
- Realizzazione di transenne di delimitazione scavi

Strutture di fondazioni in c.a.

- Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
- Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
- Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
- Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Strutture in elevazione in c.a.

- Rinterro di scavo
- Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
- Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
- Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
- Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Chiusure e divisori

- Realizzazione di tompagnature
- Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali
- Realizzazione di divisori interni

Coperture, terrazzi ecc.

- Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate
- Formazione di massetto per coperture
- Impermeabilizzazione di coperture
- protezione guaine coperture piane
- Realizzazione di opere di lattoneria

Impianti

- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Realizzazione di impianto termico (autonomo)
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Realizzazione di impianto radiotelevisivo
- Realizzazione di impianto telefonico e citofonico
- Realizzazione di impianto ascensore

Finiture esterne

- Formazione intonaci esterni (industrializzati)

Finiture interne

- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Posa di rivestimenti interni

Pavimenti

- Formazione di massetto per pavimenti interni
- Posa di pavimenti per interni

Tinteggiature

- Tinteggiatura di superfici esterne

Tinteggiatura di superfici interne

Posa in opera di serramenti e ringhiere

Posa di serramenti interni

Posa di serramenti esterni

Posa di ringhiere e parapetti

FINE CANTIERE

smontaggio della gru a torre

Smobilizzo del cantiere

EDIFICIO B

Allestimento del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della viabilità del cantiere

Allestimento di servizi igienico del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Montaggio della gru a torre

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

SCAVI E RINTERRI

Scavo di sbancamento

Realizzazione di transenne di delimitazione scavi

Strutture di fondazioni in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Strutture in elevazione in c.a.

Rinterro di scavo

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Chiusure e divisori

Realizzazione di tompagnature

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali

Realizzazione di divisori interni

Coperture, terrazzi ecc.

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate

Formazione di massetto per coperture

Impermeabilizzazione di coperture

protezione guaine coperture piane

Realizzazione di opere di lattoneria

Impianti

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas

Realizzazione di impianto termico (autonomo)

Realizzazione di impianto elettrico interno

Realizzazione di impianto radiotelevisivo

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico

Finiture esterne

Formazione intonaci esterni (industrializzati)

Finiture interne

Formazione intonaci interni (tradizionali)

Posa di rivestimenti interni

Pavimenti

Formazione di massetto per pavimenti interni

Posa di pavimenti per interni

Tinteggiature

Tinteggiatura di superfici esterne

Tinteggiatura di superfici interne

Posa in opera di serramenti e ringhiere

Posa di serramenti interni

Posa di serramenti esterni

Posa di ringhiere e parapetti

FINE CANTIERE

smontaggio della gru a torre

Smobilizzo del cantiere

EDIFICIO A (fase)

Allestimento del cantiere (sottofase)

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)

Realizzazione della recinzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori. La recinzione dovrà essere di altezza non minore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio, realizzata con lamiere grecate, reti o altro efficace sistema di confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo, o altro infissi nel terreno.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 2) segnale:  Pericolo generico;
- 3) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 4) segnale:  Uscita autoveicoli;
- 5) segnale:  Vietato accesso;
Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori
- 6) segnale:  Casco obbligatorio;
- 7) segnale:  Uso mezzi protezione(1);
Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno

Macchine utilizzate:

- 1) Dumper.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Addetto alla realizzazione della recinzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali a tenuta; **d)** mascherina antipolvere; **e)** indumenti ad alta visibilità; **f)** calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala semplice;



Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione della viabilità del cantiere (sottofase)

Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli preferibilmente mediante percorsi separati. A questo scopo, all'interno del cantiere dovranno essere approntate adeguate vie di circolazione carrabile e pedonale, corredate di appropriata segnaletica.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo generico;
- 2) segnale:  Uso mezzi protezione(1);
Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro;
- 2) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere;
Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli preferibilmente mediante percorsi separati.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali a tenuta; **d)** mascherina antipolvere; **e)** indumenti ad alta visibilità; **f)** calzature di sicurezza con suola imperforabile.



Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Operaio polivalente";

Allestimento di servizi igienico del cantiere (sottofase)

Allestimento di servizi igienico costituiti da struttura prefabbricata appositamente approntata, nella quali le maestranze possono usufruire dei servizi igienici, e per lavarsi

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo generico;
- 2) segnale:  Uso mezzi protezione(1);
Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno

Macchine utilizzate:

- 1) Autogrù.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Addetto all'allestimento di servizi igienico costituiti da struttura prefabbricata appositamente approntata, nella quali le maestranze possono usufruire dei servizi igienici, e per lavarsi

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **d)** occhiali di sicurezza.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;


Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (sottofase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere (betoniera, silos, seatoi).

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Uso mezzi protezione(1);
Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno

- 2) segnale:  Carichi sospesi;

- 3) segnale:  Pericolo generico;

Macchine utilizzate:

- 1) Autogrù.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Addetto all'allestimento delle zone del cantiere per lo stoccaggio di materiali, di deposito di materiali e delle attrezzature e per l'installazione di impianti fissi quali betoniera, silos, banco dei ferrioli, ecc..

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **d)** occhiali di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Rumore per "Operaio polivalente";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Scala doppia;
c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche, mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Uso mezzi protezione(1);
Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno
- 2) segnale:  Obbligo di protezione;
Obbligo uso dei mezzi di protezione
- 3) segnale:  Non toccare;
- 4) segnale:  Tensione elettrica;
- 5) segnale:  Impianti elettrici;
Impianti elettrici sotto tensione
- 6) segnale:  Alto rischio;

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Elettricista addetto alla realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche, mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti dielettrici; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **d)** cinture di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Elettrocuzione;
- b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";
- c) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala doppia;
- c) Trapano elettrico;


Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni (in p.v.c. o polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi accessori.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 2) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 3) segnale:  Uso mezzi protezione(1);
Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 6) segnale:  Scavi;
E' severamente proibito avvicinarsi agli scavi

Macchine utilizzate:

- 1) Escavatore.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Idraulico addetto alla realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni (in p.v.c. o polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi accessori.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeforabile; **e)** occhiali o visiera di sicurezza; **f)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Idraulico";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;












Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio della gru a torre (sottofase)

Operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio della gru a torre con l'utilizzo di autogrù per il sollevamento delle varie parti della gru stessa.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;
- 8) segnale:  Alto rischio;
- 9) segnale:  Caduta materiali;
- 10) segnale:  Impianti elettrici;
Impianti elettrici sotto tensione
- 11) segnale:  Vietato accesso;
Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro;
- 2) Autogrù.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre;
Addetto alle operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio della gru a torre con l'utilizzo di autogrù per il sollevamento delle varie parti della gru stessa.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** elmetto (sia per gli addetti al montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente perduto); **b)** guanti; **c)** cintura di sicurezza a dissipazione di energia; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;






Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra, unico per l'intera area di cantiere e composto, essenzialmente, da elementi di dispersione (puntazze), dai conduttori di terra e dai conduttori di protezione. A questi si aggiungono i conduttori equipotenziali destinati alla messa a terra delle masse e delle eventuali masse estranee.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Messa a terra;
- 2) segnale:  Obbligo generico;
- 3) segnale:  Dispersore di terra;
- 4) segnale:  Tensione elettrica;
- 5) segnale:  Alto rischio;

Macchine utilizzate:

- 1) Escavatore.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Elettricista addetto alla realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere ed all'individuazione e collegamento ad esso di tutte le masse metalliche che ne necessitano.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti dielettrici; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile; **d)** cinture di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Elettrocuzione;
- b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";
- c) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala doppia;
- c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

SCAVI E RINTERRI (sottofase)

Scavo di sbancamento (sottofase)

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o escavatore) e/o a mano. Il ciglio superiore dello scavo dovrà risultare pulito e spianato così come le pareti, che devono essere sgombre da irregolarità o blocchi. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Scavi;
E' severamente proibito avvicinarsi agli scavi
- 2) segnale:  Divieto accesso persone;
- 3) segnale:  Uscita autoveicoli;

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro;
- 2) Escavatore;
- 3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto allo scavo di sbancamento;
Addetto all'esecuzione di scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o escavatore) e/o a mano.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile; **e)** mascherina antipolvere; **f)** ottoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;






Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di transenne di delimitazione scavi (sottofase)

Realizzazione di transenne di delimitazione scavi, al fine di impedire l'accesso involontario dei lavoratori e dei mezzi presenti in cantiere. La paratia dovrà essere di altezza non minore di ml 1.20, realizzata con strutture lignee o metalliche, reti o altro efficace sistema di confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo, o altro infissi nel terreno.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Uso mezzi protezione(1);
Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno
- 2) segnale:  Protezione udito;
- 3) segnale:  Scavi;
E' severamente proibito avvicinarsi agli scavi
- 4) segnale:  Uscita autoveicoli;
- 5) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

Macchine utilizzate:

- 1) Dumper.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Addetto alla realizzazione di transenne di delimitazione degli scavi, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali a tenuta; **d)** mascherina antipolvere; **e)** indumenti ad alta visibilità; **f)** calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Operaio polivalente";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

Strutture di fondazioni in c.a. (sottofase)**Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (sottofase)**

Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno, ecc. e successivo disarmo.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Obbligo generico;

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)



- 8) segnale: Protezione obbligatoria del viso;

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Addetto alla realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno, ecc. e successivo disarmo.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** stivali di sicurezza; **d)** cinture di sicurezza; **e)** indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Carpentiere";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Sega circolare;









Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di strutture in fondazione.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 8) segnale:  Protezione obbligatoria del viso;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Addetto alla lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di strutture in fondazione.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **d)** cintura di sicurezza; **e)** occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Punture, tagli, abrasioni;
b) Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.).

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 8) segnale:  Protezione obbligatoria del viso;
- 9) segnale:  Pericolo generico;
- 10) segnale:  Pericolo caduta;

Macchine utilizzate:

- 1) Autobetoniera;
- 2) Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.).

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** stivali di sicurezza; **d)** cinture di sicurezza; **e)** indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Carpentiere";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Andatoie e Passerelle;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Vibratore elettrico per calcestruzzo;



Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Elettrocuzione.

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di tondini di ferro per armature di solaio in c.a. o prefabbricato.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Cartello;
- 2) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;
Addetto alla lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di tondini di ferro per armature di solaio in c.a. o prefabbricato.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **d)** cintura di sicurezza; **e)** occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Punture, tagli, abrasioni;
- c) Rumore per "Ferraiole o aiuto ferraiole";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala semplice;
- c) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (sottofase)

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:



- 1) segnale: Cartello;



- 2) segnale: Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Autobetoniera;
- 2) Autopompa per cls;
- 3) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;
Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** stivali di sicurezza; **d)** cinture di sicurezza; **e)** indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Rumore per "Carpentiere";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio metallico fisso;
- c) Scala doppia;
- d) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Strutture in elevazione in c.a. (sottofase)

Rinterro di scavo (sottofase)

Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:



- 1) segnale: Divieto di accesso alle persone non autorizzate;



- 2) segnale: Pericolo generico;





- 3) segnale: Caduta con dislivello;



- 4) segnale: Casco di protezione obbligatoria;



- 5) segnale: Protezione obbligatoria dell'udito;

- 6) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 7) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;

Macchine utilizzate:

- 1) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al rinterro di scavo;
Addetto al rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al rinterro di scavo;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **e)** mascherina antipolvere; **f)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;








Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)

Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso, di tipologia a tubi e giunti, a telai prefabbricati, o a montanti e traversi prefabbricati, in conformità alle istruzioni del libretto di Autorizzazione Ministeriale e secondo le procedure del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio).

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Allestimento ponteggio;
- 2) segnale:  Alto rischio;
- 3) segnale:  Carichi sospesi;
- 4) segnale:  Carrelli di movimentazione;
- 5) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 6) segnale:  Impianti elettrici;
Impianti elettrici sotto tensione
- 7) segnale:  Cartello;

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro;
2) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Addetto alle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso, di tipologia a tubi e giunti, a telai prefabbricati, o a montanti e traversi prefabbricati, in conformità alle istruzioni del libretto di Autorizzazione Ministeriale e secondo le procedure del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio).

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** elmetto (sia per gli addetti al montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente perduto); **b)** guanti; **c)** cintura di sicurezza a dissipazione di energia; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Elettrocuzione;
b) Movimentazione manuale dei carichi;
c) Rumore per "Ponteggiatore";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio metallico fisso;
- c) Scala semplice;
- d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, sbalzi, ecc. e successivo disarmo.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 8) segnale:  Protezione obbligatoria del viso;
- 9) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 10) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;
Addetto alla realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, sbalzi, ecc. e successivo disarmo.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** stivali di sicurezza; **d)** cinture di sicurezza; **e)** indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Rumore per "Carpentiere";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Andatoie e Passerelle;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Ponteggio metallico fisso;
- d) Scala semplice;
- e) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:


Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle cassature di tondini di ferro per armature di strutture in elevazione.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:   Cartello;

- 2) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;
Addetto alla lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle cassature di tondini di ferro per armature di strutture in elevazione.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **d)** cintura di sicurezza; **e)** occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Punture, tagli, abrasioni;
c) Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:


Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.)

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Cartello;

- 2) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Autobetoniera;
2) Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.).

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** stivali di sicurezza; **d)** cinture di sicurezza; **e)** indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Rumore per "Carpentiere";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Ponteggio metallico fisso;
d) Scala semplice;
e) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:


Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Elettrocuzione.

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa di tondini di ferro per armature di solaio in c.a. o prefabbricato.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Cartello;

- 2) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;
Addetto alla lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di tondini di ferro per armature di solaio in c.a. o prefabbricato.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **d)** cintura di sicurezza; **e)** occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Punture, tagli, abrasioni;
c) Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:


Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (sottofase)

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Cartello;

- 2) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Autobetoniera;
2) Autopompa per cls;
3) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;
Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** stivali di sicurezza; **d)** cinture di sicurezza; **e)** indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Rumore per "Carpentiere";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;
c) Scala doppia;
d) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Chiusure e divisori (sottofase)

Realizzazione di rompagnature (sottofase)

Realizzazione di rompagnature in laterizio forato e/o mattoni pieni.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;

- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 8) segnale:  Protezione obbligatoria del viso;
- 9) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 10) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione diOMPagnature;
Addetto alla realizzazione diOMPagnature in laterizio forato e/o mattoni pieni.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione diOMPagnature;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeforabile e puntale d'acciaio; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) Rumore per "Operaio comune (murature)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Betoniera a bicchiere;
- c) Ponteggio metallico fisso;
- d) Ponte su cavalletti;
- e) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali (sottofase)

Applicazione, su superfici interne verticali precedentemente trattate (pulizia, verifica ed eventuale ripristino della pianeità, applicazione di rasante), di pannelli isolanti mediante collanti e tasselli e dei relativi pezzi speciali.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 3) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 4) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali;
Addetto all'applicazione, su superfici interne verticali precedentemente trattate (pulizia, verifica ed eventuale ripristino della pianeità, applicazione di rasante), di pannelli isolanti mediante collanti e tasselli e dei relativi pezzi speciali.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile e puntale d'acciaio; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Operaio comune (murature)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Betoniera a bicchiere;
- c) Ponteggio metallico fisso;
- d) Ponte su cavalletti;
- e) Scala semplice;
- f) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

Realizzazione di divisori interni (sottofase)

Realizzazione di pareti divisorie interne in mattoni forati e malta cementizia.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo generico;
- 2) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 5) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di divisori interni;
Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in mattoni forati e malta cementizia.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di divisori interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile e puntale d'acciaio; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Operaio comune (murature)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Betoniera a bicchiere;
- c) Ponte su cavalletti;
- d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Coperture ,terrazzi ecc. (sottofase)

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate (sottofase)

Applicazione di pannelli isolanti di qualsiasi tipo su superfici esterne orizzontali, previo pulizia ed eventuale ripristino della planeità, mediante collanti, tasselli o a fiamma.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo di inciampo;

- 2) segnale:  Protezione obbligatoria per gli occhi;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate;
Addetto alla applicazione di pannelli isolanti di qualsiasi tipo su superfici esterne orizzontali, previo pulizia ed eventuale ripristino della pianeità, mediante collanti o tasselli.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Rumore per "Operaio comune (murature)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Betoniera a bichiere;
- c) Ponteggio metallico fisso;
- d) Ponte su cavalletti;
- e) Scala semplice;
- f) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

Formazione di massetto per coperture (sottofase)

Formazione del massetto per le pendenze per coperture comunque eseguito (in calcestruzzo, in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, con vermiculite, con perline di polistirolo espanso, in malta bastarda).

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 2) segnale:  Protezione obbligatoria per gli occhi;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla formazione di massetto per coperture;
Addetto alla formazione del massetto per le pendenze per coperture comunque eseguito (in calcestruzzo, in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, con vermiculite, con perline di polistirolo espanso, in malta bastarda, ecc.).

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla formazione di massetto per coperture;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed impermeabile; **d)** occhiali.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Rumore per "Pavimentista preparatore fondo";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Impastatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi.

Impermeabilizzazione di coperture (sottofase)

Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 2) segnale:  Protezione obbligatoria per gli occhi;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto all'impermeabilizzazione di coperture;
Addetto alla realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza a sfilamento rapido con suola antisdrucciolo e impermeabile; **d)** mascherina con filtro specifico; **e)** occhiali di protezione; **f)** indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Rumore per "Impermeabilizzatore";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Cannello a gas;
- c) Ponteggio metallico fisso;
- d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:



Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

protezione guaine coperture piane (sottofase)

posa di strati di drenaggio realizzati con misti di fiume o frantumati, esenti da materie organiche o coesive, a granulometria gradualmente decrescente per coperture piane ed a protezione delle guaine

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 2) segnale:  Protezione obbligatoria per gli occhi;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;

- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla posa di strato drenante su coperture piane;
Addetto alla posa di strato drenante per copertura realizzata con con misti di fiume o frantumati, esenti da materie organiche o coesive, a granulometria gradualmente decrescente .

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla posa di pavimenti su coperture piane;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile e puntale d'acciaio; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti";
c) Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;
c) Battipistole elettrico;
d) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Realizzazione di opere di lattoneria (sottofase)

Realizzazione di opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e pluviali).

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 2) segnale:  Protezione obbligatoria per gli occhi;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria;
Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e pluviali).

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di opere di lattoneria;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile; **d)** mascherina con filtro antipolvere; **e)** indumenti protettivi (tute); **f)** cintura di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Rumore per "Lattoniere (tetto)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Impianti (sottofase)

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas (sottofase)

Realizzazione delle canalizzazioni relative agli impianti idrico e posa delle rubinetterie e degli apparecchi sanitari. Durante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli elementi e realizzazione di supporti.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 2) segnale:  Protezione obbligatoria per gli occhi;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas;
Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni relative agli impianti idrico e posa delle rubinetterie e degli apparecchi sanitari.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **e)** occhiali o visiera di sicurezza; **f)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Idraulico";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala semplice;
- c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:


Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Realizzazione di impianto termico (autonomo) (sottofase)

Realizzazione di impianto termico (autonomo) mediante la posa in opera di tubazioni in rame o polietilene reticolato, di corpi scaldanti con staffe a muro, di sistemi di controllo elettrici o elettronici per il controllo della temperatura, della caldaia, ecc. Durante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli elementi e realizzazione di supporti.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 2) segnale:  Protezione obbligatoria per gli occhi;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;

- 6) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto termico (autonomo);
Addetto alla realizzazione di impianto termico (autonomo) mediante la posa in opera di tubazioni in ferro, rame o polietilene reticolato, di corpi scaldanti con staffe a muro, di sistemi di controllo elettrici o elettronici per il controllo della temperatura, della caldaia, ecc..

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto termico (autonomo);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile; **e)** occhiali o visiera di sicurezza; **f)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Impiantista termico";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Saldatrice elettrica;
c) Scala semplice;
d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Ustioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto elettrico interno (sottofase)

Realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di alloggio o di zona, consistente nella posa in opera di canalette in p.v.c. sotto traccia flessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di rame con isolamento in p.v.c. non propagante l'incendio, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione (magnetotermi differenziali, "salvavita", ecc.) e comando, impianto di messa a terra. Durante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli elementi e realizzazione di supporti.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 2) segnale:  Protezione obbligatoria per gli occhi;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;
Addetto alla realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di alloggio o di zona, consistente nella posa in opera di canalette in p.v.c. sotto traccia flessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di rame con isolamento in p.v.c. non propagante l'incendio, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione (magnetotermi differenziali, "salvavita", ecc.) e comando, impianto di messa a terra.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti isolanti; **b)** occhiali protettivi; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";
b) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Ponte su cavalletti;
c) Scala doppia;
d) Scanalatrice per muri ed intonaci;
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni.

Realizzazione di impianto radiotelevisivo (sottofase)

Realizzazione di impianto radiotelevisivo centralizzato, mediante il fissaggio di idonei sostegni sul tetto, inserimento nei tubi di protezione rigidi o flessibili dei cavi TV, posa in opera di centraline, cablaggio. Durante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli elementi e realizzazione di supporti.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 2) segnale:  Protezione obbligatoria per gli occhi;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto radiotelevisivo;
Addetto alla realizzazione di impianto radiotelevisivo centralizzato.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto radiotelevisivo;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti isolanti; **b)** occhiali protettivi; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";
- c) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio mobile o trabattello;
- c) Scala doppia;
- d) Scanalatrice per muri ed intonaci;
- e) Trapano elettrico;


Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni.

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico (sottofase)

Realizzazione di impianto dell'impianto telefonico e citofonico. Durante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli elementi e realizzazione di supporti.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo generico;
- 2) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 3) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto telefonico e citofonico;
Addetto alla realizzazione di impianto dell'impianto telefonico e citofonico.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto telefonico e citofonico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti isolanti; **b)** occhiali protettivi; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucchiolo.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";
- b) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio mobile o trabattello;
- c) Scala doppia;
- d) Scanalatrice per muri ed intonaci;
- e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni.

Realizzazione di impianto ascensore (sottofase)

Realizzazione dell'impianto ascensore, mediante il montaggio delle guide, dell'organo di trazione o pistone oleodinamico con relativa centralina di pompaggio, quadro elettrico, cabina, porte di piano, ecc. Durante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli elementi e realizzazione di supporti.

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto ascensore;
Addetto alla realizzazione dell'impianto ascensore, mediante il montaggio delle guide, dell'organo di trazione o pistone oleodinamico con relativa centralina di pompaggio, quadro elettrico, cabina, porte di piano, ecc..

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto ascensore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti isolanti; **b)** occhiali protettivi; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucchiolo.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";
- c) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponte su cavalletti;
- c) Ponteggio mobile o trabattello;
- d) Scala doppia;
- e) Scala semplice;
- f) Scanalatrice per muri ed intonaci;
- g) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni.





Finiture esterne (sottofase)

Formazione intonaci esterni (industrializzati) (sottofase)

Formazione di intonaci esterni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;

- 7) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 8) segnale:  Protezione obbligatoria del viso;
- 9) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 10) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla formazione intonaci esterni (industrializzati);
Addetto alla formazione di intonaci esterni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni (industrializzati);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile; **d)** maschera respiratoria a filtri; **e)** occhiali.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Rumore per "Riquadratore (intonaci industrializzati)";
d) Vibrazioni per "Riquadratore";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Intonacatrice;
c) Ponteggio metallico fisso;
d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Finiture interne (sottofase)

Formazione intonaci interni (tradizionali) (sottofase)

Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 2) segnale:  Protezione obbligatoria per gli occhi;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali);
Addetto alla formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile; **d)** maschera respiratoria a filtri; **e)** occhiali.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Riquadratore (intonaci tradizionali)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Impastatrice;
- c) Ponte su cavalletti;
- d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.

Posa di rivestimenti interni (sottofase)

Posa di rivestimenti interni realizzati con piastrelle in clinker, cotto, gres, ceramiche in genere, e malta a base cementizia o adesivi.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 2) segnale:  Protezione obbligatoria per gli occhi;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla posa di rivestimenti interni;
Addetto alla posa di rivestimenti interni, realizzata con piastrelle in clinker, cotto, gres, ecc. ed adesivi speciali.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponte su cavalletti;
- c) Scala semplice;
- d) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.


Pavimenti (sottofase)

Formazione di massetto per pavimenti interni (sottofase)

Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 2) segnale:  Protezione obbligatoria per gli occhi;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;

- 6) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;
Addetto alla formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed impermeabile; **d)** occhiali.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Pavimentista preparatore fondo";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Impastatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di pavimenti per interni (sottofase)

Posa di pavimenti interni realizzati con piastrelle di gres, cotto, clinker, ceramiche in genere.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 2) segnale:  Protezione obbligatoria per gli occhi;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla posa di pavimenti per interni;
Addetto alla posa di pavimenti interni realizzati con piastrelle di gres, cotto, clinker, ceramiche in genere.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile e puntale d'acciaio; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti";
b) Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Battipiastrille elettrico;
c) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Tinteggiature (sottofase)

Tinteggiatura di superfici esterne (sottofase)

Tinteggiatura di pareti esterne, eseguita a pennello, rullo o a spruzzo.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 8) segnale:  Protezione obbligatoria del viso;
- 9) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 10) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;
Addetto alla tinteggiatura di pareti esterne, eseguita a pennello, rullo o a spruzzo.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeforabile; **d)** mascherina con filtro antipolvere; **e)** indumenti protettivi (tute); **f)** cintura di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) Rumore per "Decoratore";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio metallico fisso;
- c) Ponteggio mobile o trabattello;
- d) Scala doppia;
- e) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:


Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoamenti, stritolamenti.

Tinteggiatura di superfici interne (sottofase)

Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, eseguita a mano con rullo o pennello previo preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (svernicatori).

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 2) segnale:  Protezione obbligatoria per gli occhi;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;

- 6) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Addetto alla tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, eseguita a mano con rullo o pennello.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeforabile; **d)** mascherina con filtro antipolvere; **e)** indumenti protettivi (tute); **f)** cintura di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Decoratore";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Ponte su cavalletti;
c) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Cesoimenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa in opera di serramenti e ringhiere (sottofase)

Posa di serramenti interni (sottofase)

Posa di serramenti interni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc..

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla posa di serramenti interni;
Addetto alla posa di serramenti interni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla posa di serramenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** occhiali protettivi; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeforabile; **d)** mascherina antipolvere.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Serramentista";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Ponte su cavalletti;
c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:





Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di serramenti esterni (sottofase)

Posa di serramenti esterni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;

- 7) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 8) segnale:  Protezione obbligatoria del viso;
- 9) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 10) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla posa di serramenti esterni;
Addetto alla posa di serramenti esterni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla posa di serramenti esterni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** occhiali protettivi; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeforabile; **d)** mascherina antipolvere.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) Rumore per "Serramentista";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio metallico fisso;
- c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di ringhiere e parapetti (sottofase)

Posa di ringhiere e parapetti in ferro.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 8) segnale:  Protezione obbligatoria del viso;
- 9) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 10) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla posa di ringhiere e parapetti;
Addetto alla posa di ringhiere e parapetti in ferro.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla posa di ringhiere e parapetti;

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed impermeforabile; **d)** occhiali; **e)** ottoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) Rumore per "Fabbro";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio metallico fisso;
- c) Saldatrice elettrica;
- d) Scala semplice;
- e) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- f) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Ustioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre.

FINE CANTIERE (sottofase)

smontaggio della gru a torre (sottofase)

Operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio della gru a torre con l'utilizzo di autogrù per il sollevamento delle varie parti della gru stessa.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;
- 8) segnale:  Alto rischio;
- 9) segnale:  Caduta materiali;
- 10) segnale:  Impianti elettrici;
Impianti elettrici sotto tensione
- 11) segnale:  Vietato accesso;
Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro;
- 2) Autogrù.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre;
Addetto alle operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio della gru a torre con l'utilizzo di autogrù per il sollevamento delle varie parti della gru stessa.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre;

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** elmetto (sia per gli addetti al montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente perduto); **b)** guanti; **c)** cintura di sicurezza a dissipazione di energia; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisorie e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 2) segnale:  Pericolo generico;
- 3) segnale:  Caduta con dislivello;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 6) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 7) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro;
- 2) Autogrù.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisorie e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **d)** occhiali di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- b) Rumore per "Operaio polivalente";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio metallico fisso;
- c) Scala doppia;
- d) Trapano elettrico;



Rischi generati dall'uso degli attrezzi:






Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Cesoamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

EDIFICIO B (fase)**Allestimento del cantiere (sottofase)****Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)**

Realizzazione della recinzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori. La recinzione dovrà essere di altezza non minore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio, realizzata con lamiere grecate, reti o altro efficace sistema di confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo, o altro infissi nel terreno.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 2) segnale:  Pericolo generico;

- 3) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 4) segnale:  Uscita autoveicoli;
- 5) segnale:  Vietato accesso;
Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori
- 6) segnale:  Casco obbligatorio;
- 7) segnale:  Uso mezzi protezione(1);
Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno

Macchine utilizzate:

- 1) Dumper.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Addetto alla realizzazione della recinzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali a tenuta; **d)** mascherina antipolvere; **e)** indumenti ad alta visibilità; **f)** calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;



Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione della viabilità del cantiere (sottofase)

Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli preferibilmente mediante percorsi separati. A questo scopo, all'interno del cantiere dovranno essere approntate adeguate vie di circolazione carrabile e pedonale, corredate di appropriata segnaletica.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo generico;
- 2) segnale:  Uso mezzi protezione(1);
Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro;
2) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere;
Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli preferibilmente mediante percorsi separati.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali a tenuta; **d)** mascherina antipolvere; **e)** indumenti ad alta visibilità; **f)** calzature di sicurezza con suola imperforabile.



Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Operaio polivalente";

Allestimento di servizi igienico del cantiere (sottofase)

Allestimento di servizi igienico costituiti da struttura prefabbricata appositamente approntata, nella quali le maestranze possono usufruire dei servizi igienici, e per lavarsi

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Pericolo generico;
- 2) segnale:  Uso mezzi protezione(1);
Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno

Macchine utilizzate:

- 1) Autogrù.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Addetto all'allestimento di servizi igienico costituiti da struttura prefabbricata appositamente approntata, nella quali le maestranze possono usufruire dei, servizi igienici, e per lavarsi

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **d)** occhiali di sicurezza.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;


Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (sottofase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere (betoniera, silos, seatoi).

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Uso mezzi protezione(1);
Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno

- 2) segnale:  Carichi sospesi;

- 3) segnale:  Pericolo generico;

Macchine utilizzate:

- 1) Autogrù.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Addetto all'allestimento delle zone del cantiere per lo stoccaggio di materiali, di deposito di materiali e delle attrezzature e per l'installazione di impianti fissi quali betoniera, silos, banco dei ferrioli, ecc..

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **d)** occhiali di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- b) Rumore per "Operaio polivalente";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala doppia;
- c) Trapano elettrico;


Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche, mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Uso mezzi protezione(1);
Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno

- 2) segnale:  Obbligo di protezione;
Obbligo uso dei mezzi di protezione

- 3) segnale:  Non toccare;

- 4) segnale:  Tensione elettrica;

- 5) segnale:  Impianti elettrici;
Impianti elettrici sotto tensione



- 6) segnale: Alto rischio;

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Elettricista addetto alla realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche, mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti dielettrici; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeforabile; **d)** cinture di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Elettrocuzione;
b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";
c) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Scala doppia;
c) Trapano elettrico;






Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra, unico per l'intera area di cantiere e composto, essenzialmente, da elementi di dispersione (puntazze), dai conduttori di terra e dai conduttori di protezione. A questi si aggiungono i conduttori equipotenziali destinati alla messa a terra delle masse e delle eventuali masse estranee.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Messa a terra;
2) segnale:  Obbligo generico;
3) segnale:  Dispersore di terra;
4) segnale:  Tensione elettrica;
5) segnale:  Alto rischio;

Macchine utilizzate:

- 1) Escavatore.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Elettricista addetto alla realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere ed all'individuazione e collegamento ad esso di tutte le masse metalliche che ne necessitano.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti dielettrici; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeforabile; **d)** cinture di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Elettrocuzione;
b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";
c) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Scala doppia;
c) Trapano elettrico;








Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Montaggio della gru a torre (sottofase)

Operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio della gru a torre con l'utilizzo di autogrù per il sollevamento delle varie parti della gru stessa.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;
- 8) segnale:  Alto rischio;
- 9) segnale:  Caduta materiali;
- 10) segnale:  Impianti elettrici;
Impianti elettrici sotto tensione
- 11) segnale:  Vietato accesso;
Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro;
- 2) Autogrù.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre;
Addetto alle operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio della gru a torre con l'utilizzo di autogrù per il sollevamento delle varie parti della gru stessa.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** elmetto (sia per gli addetti al montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente perduto); **b)** guanti; **c)** cintura di sicurezza a dissipazione di energia; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni (in p.v.c. o polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi accessori.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 2) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 3) segnale:  Uso mezzi protezione(1);
Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 6) segnale:  Scavi;
E' severamente proibito avvicinarsi agli scavi

Macchine utilizzate:

- 1) Escavatore.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Idraulico addetto alle realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni (in p.v.c. o polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi accessori.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile; **e)** occhiali o visiera di sicurezza; **f)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Idraulico";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

SCAVI E RINTERRI (sottofase)

Scavo di sbancamento (sottofase)

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o escavatore) e/o a mano. Il ciglio superiore dello scavo dovrà risultare pulito e spianato così come le pareti, che devono essere sgombre da irregolarità o blocchi. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Scavi;
E' severamente proibito avvicinarsi agli scavi
- 2) segnale:  Divieto accesso persone;
- 3) segnale:  Uscita autoveicoli;

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro;
- 2) Escavatore;
- 3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto allo scavo di sbancamento;
Addetto all'esecuzione di scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o escavatore) e/o a mano.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile; **e)** mascherina antipolvere; **f)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;


Rischi generati dall'uso degli attrezzi:





Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di transenne di delimitazione scavi (sottofase)

Realizzazione di transenne di delimitazione scavi, al fine di impedire l'accesso involontario dei lavoratori e dei mezzi presenti in cantiere, . La paratia dovrà essere di altezza non minore di ml 1.20, realizzata con strutture lignee o metalliche, reti o altro efficace sistema di confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo, o altro infissi nel terreno.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Uso mezzi protezione(1);
Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno

- 2) segnale:  Protezione udito;
- 3) segnale:  Scavi;
E' severamente proibito avvicinarsi agli scavi
- 4) segnale:  Uscita autoveicoli;
- 5) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

Macchine utilizzate:

- 1) Dumper.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Addetto alla realizzazione di transenne di delimitazione degli scavi, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali a tenuta; **d)** mascherina antipolvere; **e)** indumenti ad alta visibilità; **f)** calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Operaio polivalente";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:


Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

Strutture di fondazioni in c.a. (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno, ecc. e successivo disarmo.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 8) segnale:  Protezione obbligatoria del viso;

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Addetto alla realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno, ecc. e successivo disarmo.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** stivali di sicurezza; **d)** cinture di sicurezza; **e)** indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Carpentiere";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala semplice;
- c) Sega circolare;









Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle cassature di tondini di ferro per armature di strutture in fondazione.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 8) segnale:  Protezione obbligatoria del viso;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Addetto alla lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle cassature di tondini di ferro per armature di strutture in fondazione.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antidrucciolo e impermeabile; **d)** cintura di sicurezza; **e)** occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Punture, tagli, abrasioni;
- b) Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:






Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.).

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;

- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 8) segnale:  Protezione obbligatoria del viso;
- 9) segnale:  Pericolo generico;
- 10) segnale:  Pericolo caduta;

Macchine utilizzate:

- 1) Autobetoniera;
- 2) Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.).

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** stivali di sicurezza; **d)** cinture di sicurezza; **e)** indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Carpentiere";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Andatoie e Passerelle;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Vibratore elettrico per calcestruzzo;



Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Elettrocuzione.

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di tondini di ferro per armature di solaio in c.a. o prefabbricato.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Cartello;
- 2) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;
Addetto alla lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di tondini di ferro per armature di solaio in c.a. o prefabbricato.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile; **d)** cintura di sicurezza; **e)** occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Punture, tagli, abrasioni;
- c) Rumore per "Ferraiole o aiuto ferraiole";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala semplice;
- c) Trancia-piegaferri;



Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamanti, stritolamenti; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (sottofase)

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:



- 1) segnale:  Cartello;
- 2) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Autobetoniera;
- 2) Autopompa per cls;
- 3) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;
Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** stivali di sicurezza; **d)** cinture di sicurezza; **e)** indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Rumore per "Carpentiere";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio metallico fisso;
- c) Scala doppia;
- d) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Strutture in elevazione in c.a. (sottofase)

Rinterro di scavo (sottofase)

Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 2) segnale:  Pericolo generico;
- 3) segnale:  Caduta con dislivello;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 6) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 7) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;

Macchine utilizzate:

- 1) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al rinterro di scavo;
Addetto al rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al rinterro di scavo;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile; **e)** mascherina antipolvere; **f)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;








Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)

Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso, di tipologia a tubi e giunti, a telai prefabbricati, o a montanti e traversi prefabbricati, in conformità alle istruzioni del libretto di Autorizzazione Ministeriale e secondo le procedure del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio).

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Allestimento ponteggio;
- 2) segnale:  Alto rischio;
- 3) segnale:  Carichi sospesi;
- 4) segnale:  Carrelli di movimentazione;
- 5) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 6) segnale:  Impianti elettrici;
Impianti elettrici sotto tensione
- 7) segnale:  Cartello;

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro;
- 2) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Addetto alle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso, di tipologia a tubi e giunti, a telai prefabbricati, o a montanti e traversi prefabbricati, in conformità alle istruzioni del libretto di Autorizzazione Ministeriale e secondo le procedure del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio).

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** elmetto (sia per gli addetti al montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente perduto); **b)** guanti; **c)** cintura di sicurezza a dissipazione di energia; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Elettrocuzione;
- b) Movimentazione manuale dei carichi;
- c) Rumore per "Ponteggiatore";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio metallico fisso;
- c) Scala semplice;
- d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, sbalzi, ecc. e successivo disarmo.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;

- 3) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 8) segnale:  Protezione obbligatoria del viso;
- 9) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 10) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;
Addetto alla realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, sbalzi, ecc. e successivo disarmo.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** stivali di sicurezza; **d)** cinture di sicurezza; **e)** indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Rumore per "Carpentiere";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Andatoie e Passerelle;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Ponteggio metallico fisso;
- d) Scala semplice;
- e) Sega circolare;



Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle cassature di tondini di ferro per armature di strutture in elevazione.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Cartello;
- 2) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;
Addetto alla lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle cassature di tondini di ferro per armature di strutture in elevazione.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile; **d)** cintura di sicurezza; **e)** occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Punture, tagli, abrasioni;
- c) Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala semplice;
- c) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.)

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale: Cartello;



- 2) segnale: Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Autobetoniera;
- 2) Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.).

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** stivali di sicurezza; **d)** cinture di sicurezza; **e)** indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Rumore per "Carpentiere";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Andatoie e Passerelle;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Ponteggio metallico fisso;
- d) Scala semplice;
- e) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Elettrocuzione.

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di tondini di ferro per armature di solaio in c.a. o prefabbricato.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale: Cartello;



- 2) segnale: Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;
Addetto alla lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di tondini di ferro per armature di solaio in c.a. o prefabbricato.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile; **d)** cintura di sicurezza; **e)** occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Punture, tagli, abrasioni;
- c) Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala semplice;
- c) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (sottofase)

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:



- 1) segnale: Cartello;
- 2) segnale: Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Autobetoniera;
- 2) Autopompa per cls;
- 3) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;
Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** stivali di sicurezza; **d)** cinture di sicurezza; **e)** indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Rumore per "Carpentiere";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio metallico fisso;
- c) Scala doppia;
- d) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Cesoamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Chiusure e divisori (sottofase)

Realizzazione diompagnature (sottofase)

Realizzazione di ompagnature in laterizio forato e/o mattoni pieni.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale: Carichi sospesi;
- 2) segnale: Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale: Pericolo di inciampo;
- 4) segnale: Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale: Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale: Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale: Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 8) segnale: Protezione obbligatoria del viso;

9) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

10) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di compagnature;
Addetto alla realizzazione di compagnature in laterizio forato e/o mattoni pieni.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di compagnature;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile e puntale d'acciaio; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) Rumore per "Operaio comune (murature)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Betoniera a bicchiere;
- c) Ponteggio metallico fisso;
- d) Ponte su cavalletti;
- e) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali (sottofase)

Applicazione, su superfici interne verticali precedentemente trattate (pulizia, verifica ed eventuale ripristino della planità, applicazione di rasante), di pannelli isolanti mediante collanti e tasselli e dei relativi pezzi speciali.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali;
Addetto all'applicazione, su superfici interne verticali precedentemente trattate (pulizia, verifica ed eventuale ripristino della planità, applicazione di rasante), di pannelli isolanti mediante collanti e tasselli e dei relativi pezzi speciali.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile e puntale d'acciaio; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Operaio comune (murature)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Betoniera a bicchiere;
- c) Ponteggio metallico fisso;
- d) Ponte su cavalletti;
- e) Scala semplice;
- f) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

Realizzazione di divisori interni (sottofase)

Realizzazione di pareti divisorie interne in mattoni forati e malta cementizia.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di divisori interni;
Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in mattoni forati e malta cementizia.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di divisori interni;

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile e puntale d'acciaio; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Operaio comune (murature)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Betoniera a bicchiere;
c) Ponte su cavalletti;
d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Copertur ,terrazzi ecc. (sottofase)

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate (sottofase)

Applicazione di pannelli isolanti di qualsiasi tipo su superfici esterne orizzontali, previo pulizia ed eventuale ripristino della pianeità, mediante collanti, tasselli o a fiamma.

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate;
Addetto alla applicazione di pannelli isolanti di qualsiasi tipo su superfici esterne orizzontali, previo pulizia ed eventuale ripristino della pianeità, mediante collanti o tasselli.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile e puntale d'acciaio; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Rumore per "Operaio comune (murature)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Betoniera a bicchiere;
c) Ponteggio metallico fisso;
d) Ponte su cavalletti;
e) Scala semplice;
f) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

Formazione di massetto per coperture (sottofase)

Formazione del massetto per le pendenze per coperture comunque eseguito (in calcestruzzo, in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, con vermiculite, con perline di polistirolo espanso, in malta bastarda).

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla formazione di massetto per coperture;
Addetto alla formazione del massetto per le pendenze per coperture comunque eseguito (in calcestruzzo, in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, con vermiculite, con perline di polistirolo espanso, in malta bastarda, ecc.).

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla formazione di massetto per coperture;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed impermeabile; **d)** occhiali.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Rumore per "Pavimentista preparatore fondo";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;

b) Impastatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi.

Impermeabilizzazione di coperture (sottofase)

Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto all'impermeabilizzazione di coperture;

Addetto alla realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza a sfilamento rapido con suola antidrucciolo e imperforabile; **d)** mascherina con filtro specifico; **e)** occhiali di protezione; **f)** indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Rumore per "Impermeabilizzatore";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Cannello a gas;
c) Ponteggio metallico fisso;
d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

protezione guaine coperture piane (sottofase)

posa di strati di drenaggio realizzati con misti di fiume o frantumati, esenti da materie organiche o coesive, a granulometria gradualmente decrescente per coperture piane ed a protezione delle guaine

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla posa di strato drenante su coperture piane;

Addetto alla posa di strato drenante per copertura realizzata con con misti di fiume o frantumati, esenti da materie organiche o coesive, a granulometria gradualmente decrescente.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla posa di pavimenti su coperture piane;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antidrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti";
c) Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;
c) Battipiastrille elettrico;
d) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Realizzazione di opere di lattoneria (sottofase)

Realizzazione di opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e pluviali).

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria;

Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e pluviali).

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di opere di lattoneria;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **d)** mascherina con filtro antipolvere; **e)** indumenti protettivi (tute); **f)** cintura di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Rumore per "Lattoniere (tetto)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;
c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Impianti (sottofase)

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas (sottofase)

Realizzazione delle canalizzazioni relative agli impianti idrico e posa delle rubinetterie e degli apparecchi sanitari. Durante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli elementi e realizzazione di supporti.

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas;

Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni relative agli impianti idrico e posa delle rubinetterie e degli apparecchi sanitari.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **e)** occhiali o visiera di sicurezza; **f)** ottoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Idraulico";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Realizzazione di impianto termico (autonomo) (sottofase)

Realizzazione di impianto termico (autonomo) mediante la posa in opera di tubazioni in, rame o polietilene reticolato, di corpi scaldanti con staffe a muro, di sistemi di controllo elettrici o elettronici per il controllo della temperatura, della caldaia, ecc. Durante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli elementi e realizzazione di supporti.

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto termico (autonomo);

Addetto alla realizzazione di impianto termico (autonomo) mediante la posa in opera di tubazioni in ferro, rame o polietilene reticolato, di corpi scaldanti con staffe a muro, di sistemi di controllo elettrici o elettronici per il controllo della temperatura, della caldaia, ecc..

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto termico (autonomo);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **e)** occhiali o visiera di sicurezza; **f)** ottoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Impiantista termico";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Saldatrice elettrica;
c) Scala semplice;
d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Ustioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto elettrico interno (sottofase)

Realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di alloggio o di zona, consistente nella posa in opera di canalette in p.v.c. sotto traccia flessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di rame con isolamento in p.v.c. non propagante l'incendio, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione (magnetotermi differenziali, "salvavita", ecc.) e comando, impianto di messa a terra. Durante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli elementi e realizzazione di supporti.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;

Addetto alla realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di alloggio o di zona, consistente nella posa in opera di canalette in p.v.c. sotto traccia flessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di rame con isolamento in p.v.c. non propagante l'incendio, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione (magnetotermi differenziali, "salvavita", ecc.) e comando, impianto di messa a terra.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti isolanti; **b)** occhiali protettivi; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";
b) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Ponte su cavalletti;
c) Scala doppia;
d) Scanalatrice per muri ed intonaci;
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni.

Realizzazione di impianto radiotelevisivo (sottofase)

Realizzazione di impianto radiotelevisivo centralizzato, mediante il fissaggio di idonei sostegni sul tetto, inserimento nei tubi di protezione rigidi o flessibili dei cavi TV, posa in opera di centraline, cablaggio. Durante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli elementi e realizzazione di supporti.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto radiotelevisivo;

Addetto alla realizzazione di impianto radiotelevisivo centralizzato.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto radiotelevisivo;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti isolanti; **b)** occhiali protettivi; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";
c) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio mobile o trabattello;
c) Scala doppia;
d) Scanalatrice per muri ed intonaci;
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni.

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico (sottofase)

Realizzazione di impianto dell'impianto telefonico e citofonico. Durante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli elementi e realizzazione di supporti.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto telefonico e citofonico;

Addetto alla realizzazione di impianto dell'impianto telefonico e citofonico.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto telefonico e citofonico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti isolanti; **b)** occhiali protettivi; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";
b) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio mobile o trabattello;
c) Scala doppia;
d) Scanalatrice per muri ed intonaci;
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni.

Finiture esterne (sottofase)

Formazione intonaci esterni (industrializzati) (sottofase)

Formazione di intonaci esterni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 8) segnale:  Protezione obbligatoria del viso;
- 9) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 10) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla formazione intonaci esterni (industrializzati);
Addetto alla formazione di intonaci esterni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni (industrializzati);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **d)** maschera respiratoria a filtri; **e)** occhiali.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Rumore per "Riquadratore (intonaci industrializzati)";
d) Vibrazioni per "Riquadratore";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Intonacatrice;
c) Ponteggio metallico fisso;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio;

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Finiture interne (sottofase)

Formazione intonaci interni (tradizionali) (sottofase)

Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali);

Addetto alla formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **d)** maschera respiratoria a filtri; **e)** occhiali.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Riquadratore (intonaci tradizionali)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Impastatrice;

c) Ponte su cavalletti;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.

Posa di rivestimenti interni (sottofase)

Posa di rivestimenti interni realizzati con piastrelle in clinker, cotto, gres, ceramiche in genere, e malta a base cementizia o adesivi.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di rivestimenti interni;

Addetto alla posa di rivestimenti interni, realizzata con piastrelle in clinker, cotto, gres, ecc. ed adesivi speciali.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; **e)** ottoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

c) Scala semplice;

d) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Pavimenti (sottofase)

Formazione di massetto per pavimenti interni (sottofase)

Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;

Addetto alla formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; **d)** occhiali.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Pavimentista preparatore fondo";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Impastatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di pavimenti per interni (sottofase)

Posa di pavimenti interni realizzati con piastrelle di gres, cotto, clinker, ceramiche in genere.

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla posa di pavimenti per interni;

Addetto alla posa di pavimenti interni realizzati con piastrelle di gres, cotto, clinker, ceramiche in genere.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti";
b) Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Battipiastrille elettrico;
c) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Tinteggiature (sottofase)

Tinteggiatura di superfici esterne (sottofase)

Tinteggiatura di pareti esterne, eseguita a pennello, rullo o a spruzzo.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 8) segnale:  Protezione obbligatoria del viso;
- 9) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 10) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;
Addetto alla tinteggiatura di pareti esterne, eseguita a pennello, rullo o a spruzzo.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeforabile; **d)** mascherina con filtro antipolvere; **e)** indumenti protettivi (tute); **f)** cintura di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Rumore per "Decoratore";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;
c) Ponteggio mobile o trabattello;
d) Scala doppia;
e) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoamenti, stritolamenti.

Tinteggiatura di superfici interne (sottofase)

Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, eseguita a mano con rullo o pennello previo preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Addetto alla tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, eseguita a mano con rullo o pennello.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeforabile; **d)** mascherina con filtro antipolvere; **e)** indumenti protettivi (tute); **f)** cintura di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Decoratore";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Ponte su cavalletti;
c) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Cesoamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa in opera di serramenti e ringhiere (sottofase)

Posa di serramenti interni (sottofase)

Posa di serramenti interni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc..

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla posa di serramenti interni;
Addetto alla posa di serramenti interni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla posa di serramenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** occhiali protettivi; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeforabile; **d)** mascherina antipolvere.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore per "Serramentista";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponte su cavalletti;
- c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di serramenti esterni (sottofase)

Posa di serramenti esterni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 8) segnale:  Protezione obbligatoria del viso;
- 9) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 10) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla posa di serramenti esterni;
Addetto alla posa di serramenti esterni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla posa di serramenti esterni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** occhiali protettivi; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **d)** mascherina antipolvere.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) Rumore per "Serramentista";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio metallico fisso;
- c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di ringhiere e parapetti (sottofase)

Posa di ringhiere e parapetti in ferro.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;

- 3) segnale:  Pericolo di inciampo;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;
- 7) segnale:  Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
- 8) segnale:  Protezione obbligatoria del viso;
- 9) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 10) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Macchine utilizzate:

- 1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla posa di ringhiere e parapetti;
Addetto alla posa di ringhiere e parapetti in ferro.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla posa di ringhiere e parapetti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; **d)** occhiali; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) Rumore per "Fabbro";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio metallico fisso;
- c) Saldatrice elettrica;
- d) Scala semplice;
- e) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- f) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Ustioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre.

FINE CANTIERE (sottofase)

smontaggio della gru a torre (sottofase)

Operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio della gru a torre con l'utilizzo di autogrù per il sollevamento delle varie parti della gru stessa.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Carichi sospesi;
- 2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa;
- 3) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 4) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 5) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 6) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;

- 7) segnale:  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;
- 8) segnale:  Alto rischio;
- 9) segnale:  Caduta materiali;
- 10) segnale:  Impianti elettrici;
Impianti elettrici sotto tensione
- 11) segnale:  Vietato accesso;
Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro;
- 2) Autogrù.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre;
Addetto alle operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio della gru a torre con l'utilizzo di autogrù per il sollevamento delle varie parti della gru stessa.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** elmetto (sia per gli addetti al montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente perduto); **b)** guanti; **c)** cintura di sicurezza a dissipazione di energia; **d)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisorie e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

- 1) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
- 2) segnale:  Pericolo generico;
- 3) segnale:  Caduta con dislivello;
- 4) segnale:  Casco di protezione obbligatoria;
- 5) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito;
- 6) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie;
- 7) segnale:  Guanti di protezione obbligatoria;

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro;
- 2) Autogrù.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisorie e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:

- a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **d)** occhiali di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- b) Rumore per "Operaio polivalente";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio metallico fisso;
- c) Scala doppia;
- d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Cesoimenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.



RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

Elenco dei rischi:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Elettrocuzione;
- 4) Movimentazione manuale dei carichi;
- 5) Punture, tagli, abrasioni;
- 6) Rumore per "Carpentiere";
- 7) Rumore per "Decoratore";
- 8) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";
- 9) Rumore per "Fabbro";
- 10) Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo";
- 11) Rumore per "Idraulico";
- 12) Rumore per "Impermeabilizzatore";
- 13) Rumore per "Impiantista termico";
- 14) Rumore per "Lattoniere (tetto)";
- 15) Rumore per "Operaio comune (murature)";
- 16) Rumore per "Operaio polivalente";
- 17) Rumore per "Pavimentista preparatore fondo";
- 18) Rumore per "Ponteggiatore";
- 19) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti";
- 20) Rumore per "Riquadratore (intonaci industrializzati)";
- 21) Rumore per "Riquadratore (intonaci tradizionali)";
- 22) Rumore per "Serramentista";
- 23) Seppellimento, sprofondamento;
- 24) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";
- 25) Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti";
- 26) Vibrazioni per "Riquadratore".

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

Descrizione del Rischio:

Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio della gru a torre; smontaggio della gru a torre;

Prescrizioni Organizzative:

Il personale addetto al montaggio ed alla manutenzione della gru, dovrà indossare le cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e doppia fune di trattenuta, la cui lunghezza non deve superare 1,5 m, nei lavori lungo il traliccio ed il braccio della gru, quando si operi al di fuori delle protezioni fisse.

b) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Rinterro di scavo;

Prescrizioni Esecutive:

Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

c) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Formazione di massetto per coperture; Impermeabilizzazione di coperture; protezione guaine coperture piane; Realizzazione di opere di lattoneria; Posa di ringhiere e parapetti;

Prescrizioni Organizzative:

Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146.

d) Nelle lavorazioni: Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseformi per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di cm 40 per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 129.

- e) **Nelle lavorazioni: Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;**

Prescrizioni Esecutive:

Le aperture lasciate nei solai (vani ascensori, cavedi, ecc.) devono essere protette al momento stesso del disarmo, per evitare cadute di persone attraverso le medesime.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146.

- f) **Nelle lavorazioni: Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;**

Prescrizioni Esecutive:

Deve provvedersi a proteggere le rampe di scale fin dalla fase della loro armatura; i parapetti dovranno essere rifatti subito dopo il disarmo e mantenuti fino alla posa in opera delle ringhiere definitive.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146.

- g) **Nelle lavorazioni: Realizzazione diompagnature; Formazione intonaci esterni (industrializzati); Tinteggiatura di superfici esterne; Posa di serramenti esterni;**

Prescrizioni Esecutive:

Nelle operazioni di ricezione del carico su ponteggi o castelli, utilizzare bastoni muniti di uncini, evitando accuratamente di sporgersi oltre le protezioni.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 148.

- h) **Nelle lavorazioni: Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate; Formazione di massetto per coperture; Impermeabilizzazione di coperture; Realizzazione di opere di lattoneria; Realizzazione di impianto radiotelevisivo;**

Prescrizioni Esecutive:

Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 148.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provvisorie, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione diompagnature; Realizzazione di impianto ascensore; Formazione intonaci esterni (industrializzati); Tinteggiatura di superfici esterne; Posa di serramenti esterni; Posa di ringhiere e parapetti; Smobilizzo del cantiere;**

Prescrizioni Esecutive:

Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.

Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario.

Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.

Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.

Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto quasi al suo piano di destinazione.

Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognerà accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso.

Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

Descrizione del Rischio:

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;**

Prescrizioni Organizzative:

Impianto elettrico: requisiti fondamentali. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e posti in opera secondo la regola d'arte. I materiali, le apparecchiature, i

macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte.

Componenti elettrici: marchi e certificazioni. Tutti i componenti elettrici dell'impianto devono essere conformi alle norme CEI ed essere corredati dai seguenti marchi: **a)** costruttore; **b)** grado di protezione; **c)** organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE. In caso di assenza del marchio relativo ad un organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE, il prodotto dovrà essere corredato di dichiarazione di conformità alle norme redatta dal costruttore, da tenere in cantiere a disposizione degli ispettori.

Componenti elettrici: grado di protezione. Il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, deve essere: **a)** non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70-1); **b)** non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da parte di getti d'acqua. In particolare, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo: **a)** IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi; **b)** IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. E' da ricordare che tutte le prese a norma sono dotate di un sistema di ritenuta che eviti il contatto accidentale della spina. Le prese a spina con corrente nominale maggiore di 16 A devono essere di tipo interbloccato, con interblocco perfettamente funzionante.

Impianto elettrico: schema unifilare. Nei cantieri alimentati in bassa tensione ed in particolare nei grossi complessi, dove la molteplicità delle linee e dei condotti ne richiede una conoscenza dimensionale e topografica, si consiglia di disporre lo schema elettrico unifilare di distribuzione e quello dei circuiti ausiliari.

Illuminazione di sicurezza del cantiere. Tutte le zone del cantiere particolarmente buie (zone destinate a parcheggi sotterranei, zone interne di edifici con notevole estensione planimetrica, ecc.), dovranno essere dotate di adeguata illuminazione di sicurezza, sufficiente ad indicare con chiarezza le vie di uscita qualora venga a mancare l'illuminazione ordinaria.

Interruttore differenziale. Immediatamente a valle del punto di consegna dell'ente distributore deve essere installato, in un contenitore di materiale isolante con chiusura a chiave, un interruttore automatico e differenziale di tipo selettivo; ove ciò non risultasse possibile, si dovrà provvedere a realizzare la parte di impianto posta a monte di esso in classe II (doppio isolamento). La corrente nominale ($I_{\Delta n}$) di detto interruttore, deve essere coordinata con la resistenza di terra (R_T) del dispersore in modo che sia $R_T \times I_{\Delta n} \leq 25$ V. L'efficienza di tutti gli interruttori differenziali presenti sul cantiere deve essere frequentemente verificata agendo sul tasto di sganciamento manuale presente su ciascun interruttore.

Differenti tipi di alimentazione del circuito. Qualora fossero presenti più tipi di alimentazione, il collegamento all'impianto dovrà avvenire mediante dispositivi che ne impediscano l'interconnessione.

Fornitura di energia ad altre imprese. Devono essere assolutamente vietati allacci di fortuna per la fornitura di energia elettrica ad eventuali altre imprese. Nel caso che altre imprese utilizzino l'impianto elettrico, si dovrà pretendere che il materiale elettrico utilizzato sia conforme alle norme nonché in perfetto stato di conservazione.

Luoghi conduttori ristretti. Sono da considerarsi "luoghi conduttori ristretti" tutti quei luoghi ove il lavoratore possa venire a contatto con superfici in tensione con un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi (ad esempio i serbatoi metallici o le cavità entro strutture non isolanti), i lavori svolti su tralicci e quelli eseguiti in presenza di acqua o fango. Per assicurare adeguata protezione nei confronti dei "contatti diretti", si dovrà realizzare l'impianto con barriere ed involucri, che offrano garanzie di una elevata tenuta, e che presentino un grado di protezione pari almeno a IP XX B, oppure un grado di isolamento, anche degli isolatori, in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V per un minuto. Sono tassativamente vietate misure di protezione realizzate tramite ostacoli o distanziatori. Per quanto riguarda i "contatti indiretti", le misure di protezione vanno distinte fra quelle per componenti fissi e mobili dell'impianto. Quattro sono le possibili soluzioni di isolamento per quanto riguarda i componenti fissi: **a)** alimentazione in bassissima tensione di sicurezza (SELV) max 50 V (25 V nei cantieri) in c.a. e 120 V in c.c.; **b)** separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento; **c)** impiego di componenti di classe II (compresi i cavi), con utenze protette da un differenziale con corrente di intervento non superiore a 0,05 A e dotate di un adeguato IP; **d)** interruzione automatica, mediante un dispositivo differenziale, con corrente di intervento non superiore a 0,05 A ed installazione di un collegamento equipotenziale supplementare fra le masse degli apparecchi fissi e le parti conduttrici (in genere masse estranee) del luogo conduttore ristretto. Le lampade elettriche, ad esempio, vanno in genere alimentate da sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV). Per quanto riguarda gli utensili elettrici portatili, essi possono essere o alimentati da sistemi a bassissima tensione (SELV), oppure da trasformatori di isolamento se a ciascun avvolgimento secondario venga collegato un solo componente. La soluzione, però, da preferire è quella di utilizzare utensili aventi grado di isolamento di classe II. In ogni caso, se si sceglie di utilizzare sistemi di alimentazione a bassissima tensione o trasformatori di isolamento, le sorgenti di alimentazione e i trasformatori devono essere tenuti all'esterno del luogo conduttore ristretto.

Realizzazione di varchi protetti. La realizzazione dei varchi protetti deve avvenire in assenza di energia elettrica nel tratto interessato, che pur se privo di energia, deve essere ugualmente collegato a terra. I varchi protetti in metallo devono essere tassativamente collegati a terra.

Verifiche a cura dell'elettricista. Al termine della realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere (ed a intervalli di tempo regolari durante il suo esercizio) dovrà essere eseguita da parte di un elettricista abilitato, una verifica visiva generale e le seguenti prove strumentali, i cui esiti andranno obbligatoriamente riportati in un rapporto da tenersi in cantiere, per essere mostrato al personale ispettivo. Prove strumentali: **1)** verifica della continuità dei conduttori; **2)** prova di polarità; **3)** prove di funzionamento; **4)** verifica circuiti SELV; **5)** prove interruttori differenziali; **6)** verifica protezione per separazione elettrica; **7)** misura della resistenza di terra di un dispersore; **8)** misura della resistività del terreno; **9)** misura della resistenza totale (sistema TT); **10)** misura dell'impedenza Z_g del circuito di guasto (sistema TN); **11)** misura della resistenza dell'anello di guasto (TT) senza neutro distribuito; **12)** ricerca di masse estranee; **13)** misura della resistenza di terra di un picchetto o di un dispersore in fase di installazione; **14)** misura della corrente di guasto a terra (TT); **15)** misura della corrente di guasto a terra (TN); **16)** misura della corrente minima di cortocircuito prevista (TN); **18)** misura della corrente minima di cortocircuito prevista (TT).

Soggetti abilitati ad eseguire i lavori. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità".

Riferimenti Normativi:

Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.1; Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.2; Legge 18 ottobre 1977 n.791; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 81; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 9; CEI 23-12; CEI 70-1; CEI 64-8/7; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Impianto di messa a terra: denuncia. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di conformità è presentata allo stesso.

Impianto di messa a terra: verifiche periodiche. Gli impianti di messa a terra devono essere verificati periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza, da parte dell'ASL competente per territorio. I relativi verbali, rilasciati dai tecnici dell'ASL, dovranno essere tenuti sul cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.

Impianto di messa a terra: inizio lavori. Appena ultimati i lavori di movimento terra, deve iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a terra per il cantiere.

Impianto di messa a terra: generalità. L'impianto di terra deve essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo la forma di protezione che offre il maggior grado di sicurezza, è il coordinamento fra l'impianto di terra stesso e le protezioni attive (interruttori o dispositivi differenziali). La sicurezza verrà garantita se la resistenza di terra (R_T) del dispersore e la corrente nominale ($I_{\Delta n}$) differenziale del dispositivo di protezione saranno coordinate secondo la relazione $R_T \times I_{\Delta n} \leq 25 \text{ V}$, nel caso di corrente alternata. Nel caso di corrente continua il valore della tensione di contatto non dovrà essere superiore a 60 V.

Impianto di messa a terra: componenti. L'impianto di messa a terra è composto dagli elementi di dispersione, dai conduttori di terra, dai conduttori di protezione e dai conduttori equipotenziali, destinati, questi ultimi, alla messa a terra delle masse e delle eventuali masse estranee.

Impianto di messa a terra: unicità impianto. L'impianto di messa a terra dovrà essere unico per l'intero cantiere e dovrà essere collegato al dispersore delle cariche atmosferiche se esiste.

Impianto di messa a terra: realizzazione ad anello. L'impianto di messa a terra dovrà essere realizzato ad anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra.

Impianto di messa a terra: caratteristiche e dimensioni degli elementi dispersori. Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volt. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle particolarità degli impianti. Gli elementi dispersori intenzionali interrati, dovranno essere realizzati con materiale il più possibile resistente alla corrosione (rame o ferro zincato) ed andranno posizionati ad una profondità maggiore di 70 cm, profondità alla quale non risentiranno dei fenomeni di essiccamento o congelamento del terreno. E' vietato utilizzare come dispersore per le prese di terra le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. I ferri di armatura del calcestruzzo interrato devono essere considerati ottimi elementi di dispersione, in quanto la loro velocità di corrosione è notevolmente inferiore a quella che si avrebbe sullo stesso materiale se fosse direttamente a contatto con il terreno. Il calcestruzzo, inoltre, grazie alla sua composizione alcalina ed alla sua natura fortemente igroscopica è un buon conduttore di corrente, e tende a drenare ed a trattenere l'umidità del terreno, mantenendo la sua conducibilità anche in zone molto asciutte. Le norme CEI 11-8 forniscono le dimensioni minime dei conduttori utilizzabili come dispersori, in funzione della loro morfologia e del materiale con cui sono realizzati: **a)** per la tipologia a piastra, la dimensione minima consentita è di 3 mm, sia se si realizzi in acciaio zincato che in rame; **b)** per la tipologia a nastro la dimensione e la sezione minima devono essere rispettivamente di 3 mm e 100 mm², se realizzato in acciaio zincato, e di 3 mm e 50 mm² se in rame; **c)** se si utilizza un tondino o conduttore massicci, la sezione minima consentita sarà di 50 mm², se realizzato in acciaio zincato, o di 35 mm² se in rame; **d)** se si utilizza un conduttore cordato, il diametro dei fili dovrà risultare non minore di 1.8 mm, sia che sia realizzato in acciaio zincato che in rame, ma la sua sezione dovrà essere non inferiore a 50 mm² nel primo caso, o a 35 mm² nel secondo; **e)** qualora si adoperi un picchetto a tubo, il suo diametro esterno ed il suo spessore dovrà essere di 40 mm e 2 mm², se costituito di acciaio zincato, oppure di 30 mm e 3 mm² se costituito in rame; **f)** se si utilizza un picchetto massiccio, il diametro esterno dovrà essere non inferiore a 20 mm, se realizzato in acciaio zincato, o 15 mm se in rame; **g)** infine, se si decide di utilizzare un picchetto in profilato, lo spessore ed il diametro trasversale dovranno risultare, rispettivamente, di 5 mm e 50 mm, sia se costituito di acciaio zincato che in rame. In tutti i casi suddetti, può utilizzarsi anche acciaio privo di rivestimento protettivo, purché con spessore aumentato del 50 % e con sezione minima 100 mm².

Impianto di messa a terra: conduttori. Il nodo principale dell'impianto di messa a terra dovrà essere realizzato mediante un morsetto od una sbarra, cui andranno collegati i conduttori di terra, quelli equipotenziali e quelli di protezione, che uniscono all'impianto di terra le masse dei quadri e degli utilizzatori elettrici. Gli alveoli di terra delle prese, così come le masse dei quadri metallici, andranno collegati al nodo principale per mezzo di un conduttore di protezione di sezione pari a quello del conduttore di fase, con un minimo di 2,5 mm² (oppure 4 mm² nel caso non fosse prevista alcuna protezione meccanica del conduttore). Le strutture metalliche quali ponteggi, cancellate, travature, canali, ecc. e tutte quelle interessate dal passaggio di cavi elettrici, dovranno essere dotate di messa a terra mediante conduttori equipotenziali di sezione non inferiore a metà di quella del conduttore principale dell'impianto, con un minimo di 6 mm² al fine di garantire alla connessione una sufficiente tenuta alle sollecitazioni meccaniche. Se il conduttore equipotenziale è in rame la sua sezione può essere anche inferiore a 25 mm². I conduttori elettrici dell'impianto di messa a terra devono rispettare la codifica dei colori (giallo-verde per i conduttori di terra, di protezione e equipotenziali, mentre nel caso che il cavo sia nudo deve portare fascette giallo verdi con il simbolo della terra). I morsetti destinati al collegamento di conduttori di terra, equipotenziali e di protezione, devono essere contraddistinti con lo stesso segno grafico. Le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste e i dispersori devono essere realizzate in modo idoneo. I conduttori di protezione e di terra collegati ai picchetti devono esser di sezioni adeguate e comunque non inferiore a quelle di seguito riportate: **a)** per conduttori di fase dell'impianto di sezione $S \leq 16 \text{ mm}^2$, la sezione del conduttore di protezione dovrà essere $S_p = S$; **b)** per conduttori di fase dell'impianto di sezione S compresa tra 16 e 35 mm², la sezione del conduttore di protezione dovrà essere $S_p = 16 \text{ mm}^2$; **c)** per conduttori di fase dell'impianto di sezione $S \geq 35 \text{ mm}^2$, la sezione del conduttore di protezione dovrà essere $S_p = S/2 \text{ mm}^2$.

Impianto di messa a terra: collegamenti a macchine e apparecchiature. Tutte le apparecchiature elettriche di classe I e le grandi masse metalliche devono essere collegate all'impianto di terra: questi collegamenti dovranno essere effettuati in corrispondenza delle masse elettriche, cioè di quelle parti che possono andare in tensione per cedimento dell'isolamento funzionale. Il cavo di protezione delle utenze elettriche deve essere compreso nel cavo di alimentazione: si evita, in questo modo, l'alimentazione di utenze non collegate a terra. Le apparecchiature di classe II non vanno collegate a terra.

Riferimenti Normativi:

D.I. 15 ottobre 1993 n.519, Art. 3; D.P.R. 22 ottobre 2001 n.462, Art. 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 86; CEI 11-1; CEI 64-8.

c) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:

Quando occorre effettuare lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere

inferiore ai seguenti limiti: Un [kV] <= 1 allora D [m] >= 3; 1 < Un [kV] <= 30 allora D [m] >= 3,5; 30 < Un [kV] <= 132 allora D [m] >= 5; Un [kV] > 132 allora D [m] >= 7
o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 117.

RISCHIO: "Movimentazione manuale dei carichi"

Descrizione del Rischio:

Lesioni a carico della zona dorso lombare causate, per la caratteristica o le condizioni ergonomiche sfavorevoli, a seguito di operazioni di trasporto o sostegno di un carico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:

Movimentazione manuale dei carichi: misure generali. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Movimentazione manuale dei carichi: adozione di metodi di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro: **a)** organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; **b)** valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione; **c)** evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta; **d)** sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria.

Movimentazione manuale dei carichi: elementi di riferimento. La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: **a)** il carico è troppo pesante; **b)** è ingombrante o difficile da afferrare; **c)** è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; **d)** è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; **e)** può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: **a)** è eccessivo; **b)** può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; **c)** può comportare un movimento brusco del carico; **d)** è compiuto col corpo in posizione instabile. Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: **a)** lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta; **b)** il pavimento è irregolare, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione; **c)** il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; **d)** il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; **e)** la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate. L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze: **a)** sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; **b)** pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti; **c)** distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; **d)** un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

Prescrizioni Esecutive:

Movimentazione manuale dei carichi: modalità di stoccaggio. Le modalità di stoccaggio del materiale movimentato devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Verificare la compattezza del terreno prima di iniziare lo stoccaggio.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 168; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 33.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

Descrizione del Rischio:

Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Esecutive:

I ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamente segnalati e protetti con nastro colorato e/o mediante tavole legate provvisoriamente agli stessi.

RISCHIO: Rumore per "Carpentiere"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 81 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;**

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione ($L_{Aeq} > 85$ dB(A)) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza è effettuata dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; g) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; h) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate.

Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell'udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell'udito:

1) Casserature (A51), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).

2) Utilizzo sega circolare (B591), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).

RISCHIO: Rumore per "Decoratore"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 127 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Manutenzioni).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni: Tinteggiatura di superfici esterne; Tinteggiatura di superfici interne;**

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico interno; Realizzazione di impianto radiotelevisivo; Realizzazione di impianto telefonico e citofonico; Realizzazione di impianto ascensore;**

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 dB(A)) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicit  della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entit  e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonch  ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilit  per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; g) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualit  di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto   di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensit  dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivit , il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate.

Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosit . I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse   limitato, ove ci  sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attivit  e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell'udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell'udito:

1) Utilizzo scanalatrice elettrica (B581), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).

2) Scanalature con attrezzi manuali (A60), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).

RISCHIO: Rumore per "Fabbro"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 90 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione   "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attivit  di tutto il cantiere   "Superiore a 85 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni: Posa di ringhiere e parapetti;**

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 dB(A)) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della

valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; g) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate.

Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell'udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell'udito:

1) Posa ringhiere (generico) (A74), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).

RISCHIO: Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 150 del C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni (Opere d'arte)).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Uguale a 80 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;**

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; g) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: Rumore per "Idraulico"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 91 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas;**

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; g) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: Rumore per "Impermeabilizzatore"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 289 del C.P.T. Torino (Impermeabilizzazioni - Impermeabilizzazioni (Guaine)).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni: Impermeabilizzazione di coperture;**

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 dB(A)) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza è effettuata dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; g) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul

posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate.

Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell'udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell'udito:

1) Posa guaine (utilizzo cannello) (B176), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).

RISCHIO: Rumore per "Impiantista termico"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 92 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto termico (autonomo);

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A)) e minori o uguali ai valori superiori di azione (Lex ≤ 85 dB(A)), su loro richiesta e qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; g) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell'udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell'udito:

1) Posa corpi radianti (A76), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).

RISCHIO: Rumore per "Lattoniere (tetto)"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 126 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Manutenzioni).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Uguale a 80 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di opere di lattoneria;

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; g) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: Rumore per "Operaio comune (murature)"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 43 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di compagnature; Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali; Realizzazione di divisori interni; Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate;

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 dB(A)) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza è effettuata dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; g) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate.

Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell'udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell'udito:

1) Utilizzo sega circolare per laterizi (B595), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 25 dB(A)).

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).

RISCHIO: Rumore per "Operaio polivalente"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 49.1 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabilità del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione di transenne di delimitazione scavi; Smobilizzo del cantiere;**

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A)) e minori o uguali ai valori superiori di azione (Lex <= 85 dB(A)), su loro richiesta e qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell'udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell'udito:

1) Posa manufatti (serramenti, ringhiere, sanitari, corpi radianti) (A33), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).

RISCHIO: Rumore per "Pavimentista preparatore fondo"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 37 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni: Formazione di massetto per coperture; Formazione di massetto per pavimenti interni;**

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: Rumore per "Ponteggiatore"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 31 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 38 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: protezione guaine coperture piane; Posa di rivestimenti interni; Posa di pavimenti per interni;

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A)) e minori o uguali ai valori superiori di azione (Lex ≤ 85 dB(A)), su loro richiesta e qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di

isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell'udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell'udito:

1) Posa piastrelle (A30), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).

2) Battitura pavimento (utilizzo battipiastrille) (B138), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).

RISCHIO: Rumore per "Riquadratore (intonaci industrializzati)"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 36 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci esterni (industrializzati);

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A)) e minori o uguali ai valori superiori di azione (Lex ≤ 85 dB(A)), su loro richiesta e qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; g) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell'udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell'udito:

1) Formazione intonaci industrializzati (utilizzo pistola per intonaco) (B505), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).

RISCHIO: Rumore per "Riquadratore (intonaci tradizionali)"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 35 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci interni (tradizionali);

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: Rumore per "Serramentista"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 89 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Posa di serramenti interni; Posa di serramenti esterni;

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A)) e minori o uguali ai valori superiori di azione (Lex ≤ 85 dB(A)), su loro richiesta e qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; g) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; h) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell'udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell'udito:

1) Posa serramenti (A73), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"

Descrizione del Rischio:

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Rinterro di scavo;

Prescrizioni Organizzative:

Scavi in trincea: sbadacchiature vietate. Le pareti inclinate non dovranno essere armate con sbadacchi orizzontali in quanto i puntelli ed i traversi potrebbero slittare verso l'alto per effetto della spinta del terreno. Si dovrà verificare che le pareti inclinate abbiano pendenza di sicurezza.

Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sostegno. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. Qualora la lavorazione richieda che il lavoratore operi in posizione curva, anche per periodi di tempo limitati, la suddetta armatura di sostegno dovrà essere posta in opera già da profondità maggiori od uguali a 1,20 m. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm 30. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporre idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'esportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 119.

b) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Rinterro di scavo;

Prescrizioni Esecutive:

E' tassativamente vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)"

Descrizione del Rischio:

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo scanalatrice per 15%.

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico interno; Realizzazione di impianto radiotelevisivo; Realizzazione di impianto telefonico e citofonico; Realizzazione di impianto ascensore;

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s².

Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 5 m/s².

Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.

Adozione di sistemi di lavoro. Il datore di lavoro adotta sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre al minimo la forza di prensione o spinta da applicare all'utensile.

Manutenzione attrezzi o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico degli attrezzi o macchine condotte a mano.

Utilizzo corretto di attrezzi o macchine condotte a mano. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di prensione e di impugnatura delle attrezzature o macchine condotte a mano in conformità alla formazione ricevuta.

Procedure di lavoro e esercizi alle mani. I lavoratori devono assicurarsi di avere le mani riscaldate prima e durante il turno di lavoro ed effettuare esercizi e massaggi alle mani durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta.

Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

Fornitura di DPI (guanti antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.

Fornitura di DPI (maniglie antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.

RISCHIO: Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti"

Descrizione del Rischio:

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 38 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) battitura pavimento (utilizzo battipiastrille) per 5%.

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: protezione guaine coperture piane; Posa di pavimenti per interni;

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s².

Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 5 m/s².

RISCHIO: Vibrazioni per "Riquadratore"

Descrizione del Rischio:

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 86 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) formazioni intonaci industrializzati (utilizzo pistola per intonaco) per 45%.

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci esterni (industrializzati);

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s².

Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 5 m/s².

Elenco degli attrezzi:

- 1) Andatoie e Passerelle;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Battipiastrille elettrico;
- 4) Betoniera a bicchiere;
- 5) Cannello a gas;
- 6) Carriola;
- 7) Impastatrice;
- 8) Intonacatrice;
- 9) Ponte su cavalletti;
- 10) Ponteggio metallico fisso;
- 11) Ponteggio mobile o trabattello;
- 12) Saldatrice elettrica;
- 13) Scala doppia;
- 14) Scala semplice;
- 15) Scanalatrice per muri ed intonaci;
- 16) Sega circolare;
- 17) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- 18) Taglierina elettrica;
- 19) Trancia-piegaferri;
- 20) Trapano elettrico;
- 21) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono delle opere provvisorie che vengono predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Modalità d'utilizzo: 1) Controllare la stabilità, solidità e completezza dell'andatoia o passerella, rivolgendo particolare attenzione al tavolato di calpestio ed ai parapetti; 2) Evitare di sovraccaricare l'andatoia o passerella; 3) Ogni anomalia o instabilità dell'andatoia o passerella, andrà tempestivamente segnalata al preposto e/o al datore di lavoro.

Principali modalità di posa in opera: 1) Le andatoie o passerelle devono avere larghezza non inferiore a m 0.60 se destinate al solo passaggio dei lavoratori, a m 1.20 se destinate anche al trasporto dei materiali; 2) La pendenza non deve essere superiore al 50%; 3) Per andatoie lunghe, la passerella dovrà esser interrotta da pianerottoli di riposo; 4) Sul calpestio delle andatoie e passerelle, andranno fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di un uomo carico; 5) I lati delle andatoie e passerelle prospicienti il vuoto, dovranno essere munite di normali parapetti e tavole fermapiè; 6) Qualora le andatoie e passerelle costituiscano un passaggio stabile non provvisorio e sussista la possibilità di caduta di materiali dall'alto, andranno adeguatamente protette a mezzo di un impalcato di sicurezza.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.

- 2) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** calzature di sicurezza; **b)** guanti; **c)** indumenti protettivi (tute).

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Punture, tagli, abrasioni;
- 2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile; 2) Assicurarsi del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio.

Durante l'uso: 1) Utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli; 2) Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedi ad allontanare adeguatamente terzi presenti; 3) Assumi una posizione stabile e corretta; 4) Evita di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori.
Dopo l'uso: 1) Riponi correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.

- 2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** occhiali; **d)** guanti.

Battipiastrille elettrico

Utensile elettrico per la posa in opera di piastrelle.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Movimentazione manuale dei carichi;
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Battipiastrille elettrico: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Assicurati del buono stato dei pressacavi; accertati che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 2) Accertati del corretto funzionamento dell'interruttore; assicurati dell'efficacia delle protezioni e delle parti elettriche a vista; accertati dell'efficienza dei comandi.

Durante l'uso: 1) Accertati che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti; accertati che i collegamenti volanti a presa e spina, quando indispensabili, siano realizzati con elementi aventi almeno protezione IP 67 e posizionati fuori dai tratti interrati; 2) Utilizza prolunghe realizzate secondo le norme di sicurezza (cavo per posa mobile) per portare l'alimentazione in luoghi ove non sono presenti quadri elettrici, evitando assolutamente di approntare prolunghe artigianalmente; 3) Utilizza l'impugnatura della spina per disconnetterla da una presa, evitando accuratamente di farlo tendendo il cavo; 4) Evita di connettere la spina su prese in tensione, accertandoti preventivamente che risultino "aperti" sia l'interruttore dell'apparecchiatura elettrica che quello posto a monte della spina; 5) Non richiudere mai un circuito elettrico disconnesso automaticamente dai dispositivi di protezione, senza prima aver individuato e riparato il guasto; 6) Assicurati di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 7) Delimita l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato; 8) Evita assolutamente di rimuovere o modificare i dispositivi di protezione; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto l'alimentazione elettrica; 2) Ripulisci con cura i cavi di alimentazione prima di provvedere a riporli; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione elettrica.

Riferimenti Normativi:

D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43.

- 2) DPI: utilizzatore battipiastrille elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** calzature di sicurezza; **b)** ginocchiere; **c)** ottoprotettori; **d)** guanti antivibrazioni.

Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere è una macchina destinata al confezionamento di malta, di dimensioni contenute, costituita da una vasca di capacità solitamente di 300-500 litri, montata su di un asse a due ruote per facilitarne il trasporto. Il motore, frequentemente elettrico, è contenuto in un armadio metallico laterale con gli organi di trasmissione che, attraverso il contatto del pignone con la corona dentata, determinano il movimento rotatorio del tamburo di impasto. Il tamburo (o bicchiere), al cui interno sono collocati gli organi lavoratori, è dotato di una apertura per consentire il carico e lo scarico del materiale. Quest'ultima operazione avviene manualmente attraverso un volante laterale che comanda l'inclinazione del bicchiere e il rovesciamento dello stesso per la fuoriuscita dell'impasto. Durante il normale funzionamento il volante è bloccato, per eseguire la manovra di rovesciamento occorre sbloccare il volante tramite l'apposito pedale. Solitamente questo tipo di macchina viene utilizzato per il confezionamento di malta per murature ed intonaci e per la produzione di calcestruzzi se occorrenti in piccole quantità.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Cesoimenti, stritolamenti;
- 3) Elettrocuzione;
- 4) Getti, schizzi;
- 5) Inalazione polveri, fibre;
- 6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
- 7) Movimentazione manuale dei carichi;
- 8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Betoniera a bicchiere: misure preventive e protettive;

Prima dell'uso: 1) Accertati della presenza e dell'efficienza delle protezioni (carter) da contatto accidentale degli ingranaggi, delle pulegge, delle cinghie e degli altri organi di trasmissione del moto (lo sportello del vano motore della betoniera non costituisce protezione); 2) Prendi visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza; 3) Controlla la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 4) Accertati che il volante di comando azionante il ribaltamento del bicchiere, abbia i raggi accecati nei punti in cui esiste il pericolo di tranciamento; 5) Assicurati che il pedale di sgancio del volante azionante il ribaltamento del bicchiere sia dotato di protezione al di sopra ed ai lati; 6) Nel caso che la pulsantiera di comando sia esterna al vano motore, assicurati della presenza di un lucchetto sullo sportello della pulsantiera stessa; 7) Accertati che in prossimità della macchina siano presenti cartelli con l'indicazione delle principali norme d'uso e di sicurezza; 8) Verifica che i comandi siano dotati di dispositivi efficienti per impedire l'avviamento accidentale del motore; 9) Assicurati della stabilità del terreno dove è stata installata la macchina (assenza di cedimenti) e dell'efficacia del drenaggio (assenza di ristagni d'acqua); 10) Accertati della stabilità della macchina; 11) In particolare se la betoniera è dotata di pneumatici per il traino, assicurati che non siano stati asportati, verifica il loro stato manutentivo e la pressione di gonfiaggio, l'azionamento del freno di stazionamento e/o l'inserimento di cunei in legno; 12) Inoltre, se sono presenti gli appositi regolatori di altezza, verificane il corretto utilizzo o, in loro assenza, accertati che vengano utilizzati assi di legno e mai pietre o mattoni; 13) Assicurati, nel caso in cui l'impasto viene scaricato all'interno di fosse accessibili dalla benna della gru, che i parapetti posti a protezione di tali fosse siano efficienti ed in grado di resistere ad eventuali urti con le benne stesse; 14) Accertati del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica l'efficienza degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra; 15) Assicurati che gli indumenti che indossi non presentino possibili appigli (lacci, tasche larghe, maniche ampie, ecc.) che potrebbero agganciarsi negli organi in moto.

Durante l'uso: 1) Evita assolutamente di asportare o modificare le protezioni degli organi in moto; evita assolutamente di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione (pulizia, lubrificazione, riparazione, ecc.) su organi in movimento; 2) Evita assolutamente di introdurre attrezzi o parti del corpo all'interno della tazza in rotazione, prestando particolare cura a che tutte le operazioni di carico si concludano prima dell'avviamento del motore; 3) Evita di movimentare carichi eccessivamente pesanti o di effettuarlo in condizioni disagiate, e utilizza appropriate attrezzature (pale, secchioni, ecc.); 4) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operatività) e l'interruttore generale di alimentazione del quadro; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

Circolare Ministero del Lavoro n.103/80; Circolare Ministero del Lavoro 29 giugno 1981 n.76; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

- 2) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** occhiali; **d)** maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); **e)** otoprotettori; **f)** indumenti protettivi (tute).

Cannello a gas

Usato essenzialmente per la posa di membrane bituminose, il cannello a gas funziona utilizzando gas propano. Diverse sono le soluzioni con cui il cannello viene commercialmente proposto, con braccio di diversa lunghezza e con campane intercambiabili di diverso diametro per permettere di raggiungere più livelli di potenza calorica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Inalazione fumi, gas, vapori;
- 2) Incendi, esplosioni;
- 3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
- 4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 5) Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Cannello a gas: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Assicurarsi del buono stato delle tubazioni di adduzione al cannello, evitando di realizzare qualsiasi riparazione di fortuna ma sostituendo le tubazioni se ammalorate; 2) Accertati che le tubazioni siano disposte in curve ampie, lontano dai punti di passaggio e/o proteggendole da calpestio, scintille, fonti di calore e dal contatto con attrezzature o rottami taglienti; 3) Accertati del buono stato delle connessioni (bombole-tubazioni; tubazioni-cannello, ecc.); 4) Accertati della presenza e funzionalità del dispositivo di riduzione della pressione e, a valle di esso, delle valvole contro il ritorno di fiamma; 5) Ricordati di movimentare le bombole con gli appositi carrelli, posizionandole sempre in posizione verticale; 6) Assicurati che nelle vicinanze del posto di lavoro non vi sia presenza di materiali infiammabili; 7) Accertati che la postazione di lavoro sia adeguatamente ventilata.

Durante l'uso: 1) Accertati della presenza, in prossimità del luogo di lavoro, di un estintore; evita assolutamente di lasciare fiamme libere incustodite; 2) Proteggi le bombole dall'esposizione solare e/o da fonti di calore; 3) Durante le pause di lavoro, provvedi a spegnere la fiamma e ad interrompere il flusso del gas, chiudendo le apposite valvole; 4) Evita assolutamente di utilizzare la fiamma libera in prossimità del tubo e della bombola del gas; 5) Evita assolutamente di piegare le tubazioni per interrompere l'afflusso di gas; 6) Evita di sottoporre a trazione le tubazioni di alimentazione; 7) Provvedi ad accendere il cannello utilizzando gli appositi accenditori, senza mai usare modalità di fortuna, come fiammiferi, torce di carta, ecc.; 8) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Provvedi a spegnere la fiamma, chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 2) Provvedi a riporre le apparecchiature in luoghi aerati, lontani dagli agenti atmosferici e da sorgenti di calore; 3) Assicurati che le bombole siano stoccate in posizione verticale, e ricordati che è assolutamente vietato realizzare depositi di combustibili in locali sotterranei.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

- 2) DPI: utilizzatore cannello a gas;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** calzature di sicurezza; **b)** guanti; **c)** occhiali; **d)** maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); **e)** otoprotettori; **f)** guanti; **g)** indumenti protettivi (tute).

Carriola

Attrezzatura di cantiere per la movimentazione manuale di materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Punture, tagli, abrasioni;
- 2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Carriola: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Modalità d'utilizzo: **1)** Utilizza la carriola spingendola, evitando di trascinarla; **2)** Accertati del buono stato delle manopole e della ruota.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.

- 2) DPI: utilizzatore carriola;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** guanti; **d)** indumenti protettivi (tute).

Impastatrice

L'impastatrice è una macchina da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Inalazione polveri, fibre;
- 4) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
- 5) Movimentazione manuale dei carichi;
- 6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Impastatrice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: **1)** Accertati della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale degli ingranaggi, delle pulegge, delle cinghie e degli altri organi di trasmissione del moto; **2)** Prendi visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza; **3)** Accertati del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica l'efficienza degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra; **4)** Controlla la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); **5)** Accertati della stabilità della macchina; **6)** In particolare se la betoniera è dotata di pneumatici per il traino, assicurati che non siano stati asportati, verifica il loro stato manutentivo e la pressione di gonfiaggio, l'azionamento del freno di stazionamento e/o l'inserimento di cunei in legno; **7)** Accertati del buono stato della griglia di protezione e dell'efficienza del dispositivo di interruzione del moto degli organi lavoratori a seguito del suo sollevamento della griglia stessa; **8)** Assicurati dell'integrità dei componenti elettrici a vista; **9)** Assicurati che gli indumenti che indossi non presentino possibili appigli (lacci, tasche larghe, maniche ampie, ecc.) che potrebbero agganciarsi negli organi in moto.

Durante l'uso: **1)** Accertati che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti; **2)** Non manomettere il dispositivo automatico di blocco degli organi lavoratori al sollevamento della griglia; **3)** Evita assolutamente di asportare o modificare le protezioni degli organi in moto; **4)** Evita assolutamente di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione (pulizia, lubrificazione, riparazione, ecc.) su organi in movimento.

Dopo l'uso: **1)** Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operatività) e l'interruttore generale di alimentazione del quadro; **2)** Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

Circolare Ministero del Lavoro n.103/80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

- 2) DPI: utilizzatore impastatrice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); **d)** guanti; **e)** indumenti protettivi (tute).

Intonacatrice

L'intonacatrice è una macchina che serve a proiettare malta fluida di cemento sotto pressione per formare intonaci, getti per rivestimento di pareti, ecc.

La macchina è essenzialmente costituita da una camera di lavorazione dove vengono introdotti i materiali asciutti premiscelati (cemento e sabbia), un condotto di espulsione terminante in un ugello miscelatore (pistola).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Getti, schizzi;
- 2) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
- 3) Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Intonacatrice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale con gli organi in moto; 2) Assicurati dell'efficienza degli interruttori di comando; 3) Accertati dell'integrità delle tubazioni e dei cavi di alimentazione; 4) Assicurati dell'affidabilità delle connessioni tra tubi di alimentazione e terminale della pompa; 5) Accertati della pulizia dell'ugello e delle tubazioni; 6) Assicurati dell'integrità dei componenti elettrici a vista; 7) Accertati dell'efficienza del dispositivo contro il riavviamento accidentale; 8) Provvedi a delimitare adeguatamente la zona di lavoro, segnalando l'area interessata da un livello di rumorosità elevata.

Durante l'uso: 1) Accertati che le tubazioni e i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo da evitare che possano subire danneggiamenti; 2) Assicurati che i tubi non siano piegati con raggio di curvatura eccessivamente piccolo; 3) Assicurati di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni; 4) Per rimuovere eventuali intasamenti blocca la tubazione interessata, dirigendo il getto verso una zona interdotta al personale; 5) Ricordati di interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro; 6) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operatività) e l'interruttore generale di alimentazione del quadro; 2) Assicurati di aver spento il compressore, chiuso i rubinetti e staccato l'utensile dal compressore; 3) Ricordati di pulire accuratamente gli utensili e le tubazioni; 4) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

- 2) DPI: utilizzatore intonacatrice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** copricapo; **b)** calzature di sicurezza; **c)** occhiali; **d)** ottoprotettori; **e)** guanti; **f)** indumenti protettivi (tute).

Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti è costituito da un impalcato di assi in legno di dimensioni adeguate, sostenuto da cavalletti solitamente metallici, poste a distanze prefissate.

La sua utilizzazione riguarda, solitamente, lavori all'interno di edifici, dove a causa delle ridotte altezze e della brevità dei lavori da eseguire, non è consigliabile il montaggio di un ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Modalità d'utilizzo: 1) Assicurati dell'integrità e corretta posa in opera del tavolato, dell'accostamento delle tavole e delle buone condizioni dei cavalletti; 2) Accertati della planarità del ponte: quando necessario, utilizza zeppe di legno per spessorare il ponte e mai mattoni o blocchi di cemento; 3) Evita assolutamente di realizzare dei ponti su cavalletti su impalcato dei ponteggi esterni o di realizzare ponti su cavalletti uno in sovrapposizione all'altro; 4) Evita di sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi, ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi necessari per la lavorazione in corso.

Principali modalità di posa in opera: 1) Possono essere adoperati solo per lavori da effettuarsi all'interno di edifici o, quando all'esterno, se al piano terra; 2) L'altezza massima dei ponti su cavalletti è di m 2; 3) I montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di cemento; 4) I piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto; 5) Il ponte dovrà poggiare su tre cavalletti posti a distanza non superiore di m 1.80: qualora vengano utilizzati tavoloni aventi sezione 30 cm x 5 cm x 4 m, potranno adoperarsi solo due cavalletti a distanza non superiore a m 3.60; 6) Le tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20; 7) La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2.

- 2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** guanti.

- 3) Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Modalità d'utilizzo: 1) Assicurati dell'integrità e corretta posa in opera del tavolato, dell'accostamento delle tavole e delle buone condizioni dei cavalletti; 2) Accertati della planarità del ponte: quando necessario, utilizza zeppe di legno per spessorare il ponte e mai mattoni o blocchi di cemento; 3) Evita assolutamente di realizzare dei ponti su cavalletti su impalcato dei ponteggi esterni o di realizzare ponti su cavalletti uno in sovrapposizione all'altro; 4) Evita di sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi, ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi necessari per la lavorazione in corso.

Principali modalità di posa in opera: 1) Possono essere adoperati solo per lavori da effettuarsi all'interno di edifici o, quando all'esterno, se al piano terra; 2) L'altezza massima dei ponti su cavalletti è di m 2; 3) I montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di cemento; 4) I piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto; 5) La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole

con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti; **6)** Le tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20; **7)** La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2..

Ponteggio metallico fisso

Il ponteggio fisso è un'opera provvisoria che viene realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri. Essenzialmente si tratta di una struttura reticolare realizzata con elementi metallici. Dal punto di vista morfologico le varie tipologie esistenti in commercio sono sostanzialmente riconducibili a due: quella a tubi e giunti e quella a telai prefabbricati. La prima si compone di tubi (correnti, montanti e diagonali) collegati tra loro mediante appositi giunti, la seconda di telai fissi, cioè di forma e dimensioni predefinite, posti uno sull'altro a costituire la stilata, collegata alla stilata attigua tramite correnti o diagonali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Modalità d'uso: Utilizzare il ponteggio in conformità al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS) presente in cantiere. In particolare: **1)** Accertarsi che il ponteggio si mantenga in buone condizioni di manutenzione; **2)** Evitare assolutamente di salire o scendere lungo i montanti del ponteggio, ma utilizzare le apposite scale; **3)** Evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio; **4)** Evitare di gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere o gli stessi elementi metallici del ponteggio; **5)** Abbandonare il ponteggio nel caso sopraggiunga un forte vento; **6)** Utilizzare sempre la cintura di sicurezza, durante le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio, o ogni qualvolta i dispositivi di protezione collettiva non garantiscano da rischio di caduta dall'alto; **7)** Utilizzare bastoni muniti di uncini, evitando accuratamente di sporgersi oltre le protezioni, nelle operazioni di ricezione del carico su ponteggi o castelli; **8)** Evitare di sovraccaricare il ponteggio, creando depositi ed attrezzature in quantità eccessive: è possibile realizzare solo piccoli depositi temporanei dei materiali ed attrezzi strettamente necessari ai lavori; **9)** Evitare di effettuare lavorazioni a distanza minore di 5 m da linee elettriche aeree, se non direttamente autorizzato dal preposto.

Principali modalità di posa in opera: Il ponteggio va necessariamente allestito ogni qualvolta si prevedano lavori a quota superiore a m. 2 e il montaggio dovrà avvenire in conformità al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS) presente in cantiere. In particolare: **1)** Accertarsi che il ponteggio metallico sia munito della relativa documentazione ministeriale (libretto di autorizzazione ministeriale) e che sia installato secondo le indicazioni del costruttore; **2)** Verificare che tutti gli elementi metallici del ponteggio portino impressi il nome o il marchio del fabbricante; **3)** Prima di iniziare il montaggio del ponteggio è necessario verificare la resistenza del piano d'appoggio, che dovrà essere protetto dalle infiltrazioni d'acqua o cedimenti; **4)** La ripartizione del carico sul piano di appoggio deve essere realizzata a mezzo di basette; **5)** Qualora il terreno non fosse in grado di resistere alle pressioni trasmesse dalla base d'appoggio del ponteggio, andranno interposti elementi resistenti, allo scopo di ripartire i carichi, come tavole di legno di adeguato spessore (4 o 5 cm); **6)** Ogni elemento di ripartizione deve interessare almeno due montanti fissando ad essi le basette; **7)** Se il terreno risultasse non orizzontale si dovrà procedere o ad un suo livellamento, oppure bisognerà utilizzare basette regolabili, evitando rigorosamente il posizionamento di altri materiali (come pietre, mattoni, ecc.) di resistenza incerta; **8)** Gli impalcati del ponteggio devono risultare accostati alla costruzione: è consentito un distacco non superiore a 30 cm; **9)** Nel caso occorra disporre di distanze maggiori tra ponteggio e costruzione bisogna predisporre un parapetto completo verso la parte interna del ponteggio; **10)** Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con tavole in legno, esse dovranno risultare sempre ben accostate tra loro, al fine di evitare cadute di materiali o attrezzi. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti modalità di posa in opera: **a)** dimensioni delle tavole non inferiori a 4x30cm o 5x20cm; **b)** sovrapposizione tra tavole successive posta "a cavallo" di un traverso e di lunghezza pari almeno a 40cm; **c)** ciascuna tavola dovrà essere adeguatamente fissata (in modo da non scivolare sui traversi) e poggiata su almeno tre traversi senza presentare parti a sbalzo; **11)** Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con elementi in metallo, andranno verificati l'efficienza del perno di bloccaggio e il suo effettivo inserimento. **12)** Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m. 2,50, la cui funzione è quella di trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola; **13)** I ponteggi devono essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale: è ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino un'adeguata rigidità trasversale; **14)** I ponteggi devono essere dotati di appositi parapetti disposti anche sulle testate. Possono essere realizzati nei seguenti modi: **a)** mediante un corrente posto ad un'altezza minima di 1 m dal piano di calpestio e da una tavola fermapiè aderente al piano di camminamento, di altezza variabile ma tale da non lasciare uno spazio vuoto tra se ed il corrente suddetto maggiore di 60 cm; **b)** mediante un corrente superiore con le caratteristiche anzidette, una tavola fermapiè, aderente al piano di camminamento, alta non meno di 20 cm ed un corrente intermedio che non lasci tra se e gli elementi citati, spazi vuoti di altezza maggiore di 60 cm. In ogni caso, i correnti e le tavole fermapiè devono essere poste nella parte interna dei montanti; **15)** Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti di cui uno può fare parte del parapetto; **16)** Il ponteggio deve essere ancorato a parti stabili della costruzione (sono da escludersi balconi, inferriate, pluviali, ecc.), evitando di utilizzare fili di ferro e/o altro materiali simili; **17)** Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo; **18)** Le scale per l'accesso agli impalcati, devono essere vincolate, non in prosecuzione una dell'altra, sporgere di almeno un metro dal piano di arrivo, protette se poste verso la parte esterna del ponteggio; **19)** Tutte le zone di lavoro e di passaggio poste a ridosso del ponteggio devono essere protette da appositi parasassi (mantovana) esteso per almeno 1,20 m oltre la sagoma del ponteggio stesso; in alternativa si dovrà predisporre la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante in modo da impedire a chiunque l'accesso; **20)** Il primo parasassi deve essere posto a livello del solaio di copertura del piano terreno e poi ogni 12 metri di sviluppo del ponteggio; **21)** Sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del ponteggio, dovrà provvedersi ad applicare teli e/o reti di nylon per contenere la caduta di materiali. Tale misura andrà utilizzata congiuntamente al parasassi e mai in sua sostituzione; **22)** E' sempre necessario prevedere un ponte di servizio per lo scarico dei materiali, per il quale dovrà predisporre un apposito progetto. I relativi parapetti dovranno essere completamente chiusi, al fine di evitare che il materiale scaricato possa cadere dall'alto; **23)** Le diagonali di supporto dello sbalzo devono scaricare la loro azione, e quindi i carichi della piazzola, sui nodi e non sui correnti, i quali non sono in grado di assorbire carichi di flessione se non minimi. Per ogni piazzola devono essere eseguiti specifici ancoraggi; **24)** Con apposito cartello dovrà

essere indicato il carico massimo ammesso dal progetto; **29)** Il montaggio del ponteggio non dovrà svilupparsi in anticipo rispetto allo sviluppo della costruzione: giunti alla prima soletta, prima di innalzare le casseforme per i successivi pilastri è necessario costruire il ponteggio al piano raggiunto e così di seguito piano per piano. In ogni caso il dislivello non deve mai superare i 4 metri; **30)** L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1 l'ultimo impalcato o il piano di gronda; **31)** Il ponteggio metallico deve essere collegato elettricamente "a terra" non oltre 25 metri di sviluppo lineare, secondo il percorso più breve possibile e evitando brusche svolte e strozzature; devono comunque prevedersi non meno di due derivazioni. **32)** Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione V; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 19.

- 2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** guanti; **d)** attrezzatura anticaduta.

- 3) Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Modalità d'uso: Utilizzare il ponteggio in conformità al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS) presente in cantiere. In particolare: **1)** Accertarsi che il ponteggio si mantenga in buone condizioni di manutenzione; **2)** Evita assolutamente di salire o scendere lungo i montanti del ponteggio, ma utilizza le apposite scale; **3)** Evita di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio; **4)** Evitare di gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere o gli stessi elementi metallici del ponteggio; **5)** Abbandona il ponteggio nel caso sopraggiunga un forte vento; **6)** Utilizza sempre la cintura di sicurezza, durante le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio, o ogni qualvolta i dispositivi di protezione collettiva non garantiscano da rischio di caduta dall'alto; **7)** Utilizza bastoni muniti di uncini, evitando accuratamente di sporgerti oltre le protezioni, nelle operazioni di ricezione del carico su ponteggi o castelli; **8)** Evita di sovraccaricare il ponteggio, creando depositi ed attrezzature in quantità eccessive: è possibile realizzare solo piccoli depositi temporanei dei materiali ed attrezzi strettamente necessari ai lavori; **9)** Evita di effettuare lavorazioni a distanza minore di 5 m da linee elettriche aeree, se non direttamente autorizzato dal preposto.

Principali modalità di posa in opera: Il ponteggio va necessariamente allestito ogni qualvolta si prevedano lavori a quota superiore a m. 2 e il montaggio dovrà avvenire in conformità al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS) presente in cantiere. In particolare: **1)** Accertarsi che il ponteggio metallico sia munito della relativa documentazione ministeriale (libretto di autorizzazione ministeriale) e che sia installato secondo le indicazioni del costruttore; **2)** Verificare che tutti gli elementi metallici del ponteggio portino impressi il nome o il marchio del fabbricante; **3)** Prima di iniziare il montaggio del ponteggio è necessario verificare la resistenza del piano d'appoggio, che dovrà essere protetto dalle infiltrazioni d'acqua o cedimenti; **4)** La ripartizione del carico sul piano di appoggio deve essere realizzata a mezzo di basette; **5)** Qualora il terreno non fosse in grado di resistere alle pressioni trasmesse dalla base d'appoggio del ponteggio, andranno interposti elementi resistenti, allo scopo di ripartire i carichi, come tavole di legno di adeguato spessore (4 o 5 cm); **6)** Ogni elemento di ripartizione deve interessare almeno due montanti fissando ad essi le basette; **7)** Se il terreno risultasse non orizzontale si dovrà procedere o ad un suo livellamento, oppure bisognerà utilizzare basette regolabili, evitando rigorosamente il posizionamento di altri materiali (come pietre, mattoni, ecc.) di resistenza incerta; **8)** Gli impalcati del ponteggio devono risultare accostati alla costruzione è consentito un distacco non superiore a 20 cm; **9)** Nel caso occorra disporre di distanze maggiori tra ponteggio e costruzione bisogna predisporre un parapetto completo verso la parte interna del ponteggio; **10)** Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con tavole in legno, esse dovranno risultare sempre ben accostate tra loro, al fine di evitare cadute di materiali o attrezzi. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti modalità di posa in opera: **a)** dimensioni delle tavole non inferiori a 4x30cm o 5x20cm; **b)** sovrapposizione tra tavole successive posta "a cavallo" di un traverso e di lunghezza pari almeno a 40cm; **c)** ciascuna tavola dovrà essere adeguatamente fissata (in modo da non scivolare sui traversi) e poggiata su almeno tre traversi senza presentare parti a sbalzo; **11)** Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con elementi in metallo, andranno verificati l'efficienza del perno di bloccaggio e il suo effettivo inserimento. **12)** Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50, la cui funzione è quella di trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola; **13)** I ponteggi devono essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale è ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino un'adeguata rigidità trasversale; **14)** I ponteggi devono essere dotati di appositi parapetti disposti anche sulle testate. Possono essere realizzati nei seguenti modi: **a)** mediante un corrente posto ad un'altezza minima di 95 cm dal piano di calpestio e da una tavola fermapiè aderente al piano di camminamento, di altezza variabile ma tale da non lasciare uno spazio vuoto tra se ed il corrente suddetto maggiore di 60 cm; **b)** mediante un corrente superiore con le caratteristiche anzidette, una tavola fermapiè, aderente al piano di camminamento, alta non meno di 15 cm ed un corrente intermedio che non lasci tra se e gli elementi citati, spazi vuoti di altezza maggiore di 60 cm. In ogni caso, i correnti e le tavole fermapiè devono essere poste nella parte interna dei montanti; **15)** Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti di cui uno può fare parte del parapetto; **16)** Il ponteggio deve essere ancorato a parti stabili della costruzione (sono da escludersi balconi, inferriate, pluviali, ecc.), evitando di utilizzare fil di ferro e/o altro materiali simili; **17)** Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo; **18)** Le scale per l'accesso agli impalcati, devono essere vincolate, non in prosecuzione una dell'altra, sporgere di almeno un metro dal piano di arrivo, protette se poste verso la parte esterna del ponteggio; **19)** Tutte le zone di lavoro e di passaggio poste a ridosso del ponteggio devono essere protette da apposito parasassi (mantovana) esteso per almeno 1,20 m oltre la sagoma del ponteggio stesso; in alternativa si dovrà predisporre la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante in modo da impedire a chiunque l'accesso; **20)** Il primo parasassi deve essere posto a livello del solaio di copertura del piano terreno e poi ogni 12 metri di sviluppo del ponteggio; **21)** Sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del ponteggio, dovrà provvedersi ad applicare teli e/o reti di nylon per contenere la caduta di materiali. Tale misura andrà utilizzata congiuntamente al parasassi e mai in sua sostituzione; **22)** E' sempre necessario prevedere un ponte di servizio per lo scarico dei materiali, per il quale dovrà predisporre un apposito progetto. I relativi parapetti dovranno essere completamente chiusi, al fine di evitare che il materiale scaricato possa cadere dall'alto; **23)** Le diagonali di supporto dello sbalzo devono scaricare la loro azione, e quindi i carichi della piazzola, sui nodi e non sui correnti, i quali non sono in grado di assorbire carichi di flessione se non minimi. Per ogni piazzola devono essere eseguiti specifici ancoraggi; **24)** Con apposito cartello dovrà essere indicato il carico massimo ammesso dal progetto; **29)** Il montaggio del ponteggio non dovrà svilupparsi in anticipo rispetto allo sviluppo della costruzione: giunti alla prima soletta, prima di innalzare le casseforme per i successivi pilastri è necessario costruire il ponteggio al piano raggiunto e così di seguito piano per piano. In ogni caso il dislivello non deve mai superare i 4 metri; **30)** L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1 l'ultimo impalcato o il piano di gronda; **31)** Il ponteggio metallico deve essere collegato elettricamente "a terra" non oltre 25 metri di sviluppo lineare, secondo il percorso più breve possibile e evitando brusche svolte e strozzature; devono comunque prevedersi non meno di due derivazioni. **32)** Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, deve assicurarsi della

verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione V; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 3..

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponte su ruote o trabattello è una piccola impalcatura che può essere facilmente spostata durante il lavoro consentendo rapidità di intervento. È costituita da una struttura metallica detta castello che può raggiungere anche i 15 metri di altezza. All'interno del castello possono trovare alloggio a quote differenti diversi impalcati. L'accesso al piano di lavoro avviene all'interno del castello tramite scale a mano che collegano i diversi impalcati. Trova impiego principalmente per lavori di finitura e di manutenzione, ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Movimentazione manuale dei carichi;
- 4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Modalità d'utilizzo: 1) Assicurati del buono stato di tutti gli elementi del ponteggio (aste, incastri, collegamenti); 2) Accertati che il ponte sia stato montato in tutte le sue parti, con tutte le componenti previste dal produttore; 3) Assicurati della perfetta planarità e verticalità della struttura e, quando necessario, provvedi a ripartire il carico del ponte sul terreno con tavoloni; 4) Accertati dell'efficacia del blocco ruote; evita assolutamente di utilizzare impalcati di fortuna, ma utilizza solo quelli in dotazione o indicati dal produttore; 5) Evita assolutamente di installare sul ponte apparecchi di sollevamento; 6) Prima di effettuare spostamenti del ponteggio, accertati che non vi siano persone sopra di esso; 7) Assicurati che non vi siano linee elettriche aeree a distanza inferiore a m. 5; 8) Assicurati, nel caso di utilizzo all'esterno e di considerevole sviluppo verticale, che il ponte risulti ancorato alla costruzione almeno ogni due piani.

Principali modalità di posa in opera: 1) Il trabattello dovrà essere realizzato dell'altezza indicata dal produttore, senza aggiunte di sovrastrutture; 2) La massima altezza consentita è di m. 15, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro; 3) La base dovrà essere di dimensioni tali da resistere ai carichi e da offrire garanzie al ribaltamento conseguenti alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento; 4) I ponti la cui altezza superi m. 6, andranno dotati di piedi stabilizzatori; il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato; il ponte dovrà essere dotato alla base di dispositivi del controllo dell'orizzontalità; 5) Le ruote del ponte devono essere metalliche, con diametro e larghezza non inferiore rispettivamente a 20 cm e 5 cm, e dotate di meccanismo per il bloccaggio: col ponte in opera, devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei o con stabilizzatori; 6) Sull'elemento di base deve sempre essere presente una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto; 7) Il ponte deve essere progettato per carichi non inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione; 8) Per impedire lo sfilo delle aste, esse devono essere di un sistema di bloccaggio (elementi verticali, correnti, diagonali); 9) L'impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi; 10) Il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapièda alta almeno cm 20; 11) Il piano di lavoro dovrà essere corredato di un regolare sottoponte a non più di m 2,50; 12) L'accesso ai vari piani di lavoro deve avvenire attraverso scale a mano regolamentari: qualora esse presentino un'inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza; 13) Per l'accesso ai vari piani di lavoro sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile.

Riferimenti Normativi:

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI.

- 2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** guanti.

Saldatrice elettrica

La saldatrice elettrica è un utensile di uso comune alimentato a bassa tensione con isolamento di classe II.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione fumi, gas, vapori;
- 3) Incendi, esplosioni;
- 4) Radiazioni non ionizzanti;
- 5) Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 2) Evita assolutamente di operare saldature in presenza di gas o vapori infiammabili esplodenti (ad esempio su recipienti o su tubi che abbiano contenuto materiali pericolosi); 3) Accertati dell'integrità della pinza porta elettrodo; 4) Provvedi a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la sosta.

Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; 2) Provvedi ad allontanare il personale

non addetto alle operazioni di saldatura; **3)** Durante le pause di lavoro, ricordati di interrompere l'alimentazione elettrica; **4)** Qualora debbano essere effettuate saldature in ambienti chiusi o confinati, assicurati della presenza e dell'efficienza di un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o ventilazione; **5)** Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: **1)** Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; **2)** Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver snesso l'alimentazione elettrica.

Riferimenti Normativi:

D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43.

- 2) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); **d)** guanti; **e)** grembiule da saldatore; **f)** indumenti protettivi (tute).

Scala doppia

La scala doppia deriva dall'unione di due scale semplici incernierate tra loro alla sommità e dotate di un limitatore di apertura. Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, opere di finitura ed impiantistiche, ecc..

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Cesoimenti, stritolamenti;
- 3) Movimentazione manuale dei carichi;
- 4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Modalità d'utilizzo: **1)** Evita assolutamente di utilizzare scale metalliche per effettuare interventi su elementi in tensione; **2)** Evita assolutamente di utilizzare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto; **3)** Evita assolutamente di operare "a cavalcioni" sulla scala o di utilizzarla su qualsiasi opera provvisoria; **4)** Puoi accedere sulla eventuale piattaforma, e/o sul gradino sottostante, solo qualora i montanti siano stati prolungati di almeno 60 cm al di sopra di essa; **5)** Non effettuare spostamenti laterali della scala se su di essa è presente un lavoratore; **6)** Evita di salire sull'ultimo gradino o piolo della scala; **7)** Sia nella salita che nella discesa, utilizza la scala sempre rivolgendoti verso di essa; **8)** Ricordati che non è consentita la contemporanea presenza di più lavoratori sulla scala.

Principali modalità di posa in opera: **1)** Le scale devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso; **2)** Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza; **3)** Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; **4)** I pioli devono essere privi di nodi ed ben incastrati nei montanti; **5)** Le scale devono possedere dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti così come, analogamente, anche i pioli devono essere del tipo antisdrucciolevole; **6)** E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.

- 2) DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** guanti.

- 3) Scala doppia: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Modalità d'utilizzo: **1)** Evita assolutamente di utilizzare scale metalliche per effettuare interventi su elementi in tensione; **2)** Il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura; **3)** Evita di salire sull'ultimo gradino o piolo della scala; **4)** Sia nella salita che nella discesa, utilizza la scala sempre rivolgendoti verso di essa; **5)** Ricordati che non è consentita la contemporanea presenza di più lavoratori sulla scala; **6)** E' assolutamente vietato lavorare a cavalcioni della scala; **7)** E' vietato l'uso della scala doppia su qualsiasi opera provvisoria.

Principali modalità di posa in opera: **1)** Quando l'uso della scala, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona; **2)** Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; **3)** Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; **4)** Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura; **5)** Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; **6)** E' consentito l'accesso sulla eventuale piattaforma, e/o sul gradino sottostante, solo qualora i montanti siano stati prolungati di almeno 60 cm al di sopra di essa.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.

Scala semplice

La scala semplice è un'attrezzatura di lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da una serie di pioli trasversali incastrati e distanziati in egual misura. Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, salita su opere provvisorie, opere di finitura ed impiantistiche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Movimentazione manuale dei carichi;
- 3) Scivolamenti, cadute a livello;
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro.
- 4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Modalità d'utilizzo: 1) Se utilizzi una scala non vincolata, essa deve essere trattenuta al piede da altro lavoratore; 2) Nel caso in cui sia possibile agganciare adeguatamente la scala, provvedi ad agganciare la cintura di sicurezza ad un piolo della scala stessa; 3) Non effettuare spostamenti laterali della scala se su di essa è presente un lavoratore; 4) Evita l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 5) Sia nella salita che nella discesa, utilizza la scala sempre rivolgendoti verso di essa; 6) Ricordati che non è consentita la contemporanea presenza di più lavoratori sulla scala; 7) Se utilizzi scale ad elementi innestabili per effettuare lavori in quota, assicurati che sia presente una persona a terra che effettui una vigilanza continua sulla scala stessa.

Principali modalità di posa in opera: 1) La lunghezza della scala in opera non deve superare i m 15; 2) Per lunghezze superiori agli m 8 devono essere munite di rompitratta; 3) La scala deve superare di almeno m 1 il piano di accesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato); 4) Deve essere curata, inoltre, la corrispondenza del piolo con lo stesso; 5) Le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra; 6) Le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisorie (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto; 7) La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; 8) E' vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 9) Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; 10) Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombrato da eventuali materiali e lontano dai passaggi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.

- 2) DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti.

- 3) Scala semplice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Modalità d'utilizzo: 1) Evita assolutamente di utilizzare scale metalliche per effettuare interventi su elementi in tensione; 2) Il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura; 3) Evita di salire sull'ultimo gradino o piolo della scala; 4) Sia nella salita che nella discesa, utilizza la scala sempre rivolgendoti verso di essa; 5) Ricordati che non è consentita la contemporanea presenza di più lavoratori sulla scala; 6) Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale; 7) Durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

Principali modalità di posa in opera: 1) Quando l'uso della scala, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona; 2) Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; 3) Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; 4) Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura; 5) Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; 6) Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra; 7) Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra; 8) La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di reggetta o sistemi equivalenti. 9) La scala dovrà posizionarsi con un'inclinazione tale che la sua proiezione sull'orizzontale sia all'incirca pari ad 1/4 della sua lunghezza (75°).

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.

Scanalatrice per muri ed intonaci

La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile alimentato elettricamente, utilizzato, anzitutto, per la realizzazione di impianti sotto traccia, o per la rimozione di strati di intonaco ammalorati.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
- 4) Punture, tagli, abrasioni;
- 5) Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Scanalatrice per muri ed intonaci: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) non collegato a terra; 2) Assicurati del corretto funzionamento dei dispositivi di comando (pulsanti e dispositivi di arresto) accertandoti, in special modo, dell'efficienza del dispositivo "a uomo presente" (automatico ritorno alla posizione di arresto, quando si rilascia l'impugnatura); 3) Accertati che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per

eseguire eventuali riparazioni; **4)** Assicurati che la zona di taglio non sia in tensione o attraversata da impianti tecnologici attivi; **5)** Accertati che le feritoie di raffreddamento, collocate sull'involucro esterno dell'utensile siano libere da qualsiasi ostruzione; **6)** Assicurati del corretto fissaggio dei dischi o della fresa, e della loro integrità; **7)** Accertati dell'integrità e del corretto posizionamento del carter di protezione; **8)** Provvedi a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la sosta; **9)** Segnala l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato.

Durante l'uso: **1)** Utilizza entrambe le mani per tenere saldamente l'attrezzo; **2)** Durante le pause di lavoro, ricordati di interrompere l'alimentazione elettrica; **3)** Assicurati che terzi non possano inavvertitamente riavviare impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc) che interessano la zona di lavoro; **4)** Posizionati in modo stabile prima di dare inizio alle lavorazioni; **5)** Evita assolutamente di manomettere le protezioni dell'organo lavoratore; **6)** Assicurati di utilizzare frese o dischi idonei alla lavorazione da intraprendere; **7)** Evita assolutamente di compiere operazioni di registrazione, manutenzione o riparazione su organi in movimento; **8)** Evita di toccare l'organo lavoratore al termine del lavoro poiché certamente surriscaldato; **9)** Durante la levigatura evita di esercitare forza sull'attrezzo appoggiandoti al materiale; **10)** Al termine delle operazioni di taglio, presta particolare attenzione ai contraccolpi dovuti al cedimento del materiale; **11)** Durante le operazioni di taglio, evita assolutamente di toccare le parti metalliche dell'utensile; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: **1)** Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; **2)** Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione elettrica.

Riferimenti Normativi:

D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-51; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43.

- 2) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** occhiali; **d)** maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); **e)** otoprotettori; **f)** guanti antivibrazioni; **g)** indumenti protettivi (tute).

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni. Dal punto di vista tipologico, le seghe circolari si differenziano, anzitutto, per essere fisse o mobili; altri parametri di diversificazione possono essere il tipo di motore elettrico (mono o trifase), la profondità del taglio della lama, la possibilità di regolare o meno la sua inclinazione, la trasmissione a cinghia o diretta. Le seghe circolari con postazione fissa sono costituite da un banco di lavoro al di sotto del quale viene ubicato un motore elettrico cui è vincolata la sega vera e propria con disco a sega o dentato. Al di sopra della sega è disposta una cuffia di protezione, posteriormente un coltello divisorio in acciaio ed inferiormente un carter a protezione delle cinghie di trasmissione e della lama. La versione portatile presenta un'impugnatura, affiancata al corpo motore dell'utensile, grazie alla quale è possibile dirigere il taglio, mentre il coltello divisore è posizionato nella parte inferiore.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Scivolamenti, cadute a livello;
- 5) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 6) Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Sega circolare: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: **1)** Accertati della presenza e del buon funzionamento della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro, che deve lasciare scoperta la parte del disco strettamente necessaria ad effettuare il taglio; **2)** Assicurati della presenza del coltello divisore collocato posteriormente al disco e della sua corretta posizione (a non più di 3 mm dalle lame), il cui scopo è tenere aperto il taglio operato sul pezzo in lavorazione; **3)** Assicurati della presenza degli schermi collocati ai due lati del disco (nella parte sottostante il banco di lavoro), di protezione da contatti accidentali; **4)** Assicurati della stabilità della macchina; **5)** Controlla la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); **6)** Accertati dell'integrità dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili; **7)** Assicurati dell'integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere e del buon funzionamento degli interruttori elettrici di azionamento e di manovra; **8)** Prendi visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza.

Durante l'uso: **1)** Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; **2)** Provvedi a registrare la cuffia di protezione in modo che l'imbocco sfiori il pezzo in lavorazione o, per quelle basculanti, accertati che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro; **3)** Qualora debbano essere eseguite lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali (spingitoi in legno, ecc.) per trattenere e movimentare il pezzo in prossimità degli organi lavoratori; **4)** Mantieni sgombro da materiali il banco di lavoro e l'area circostante la macchina; **5)** Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: **1)** Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici della macchina (interrotto ogni operatività) e l'interruttore generale di alimentazione al quadro; **2)** Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente; **3)** Pulisci la macchina da eventuali residui di materiale e, in particolare, verifica che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori di alimentazione e/o messa a terra.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

- 2) DPI: utilizzatore sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** occhiali; **d)** otoprotettori; **e)** guanti.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare a disco o a squadra, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è, a seconda del tipo di disco (abrasivo o diamantato), quella di tagliare, smussare, lisciare superfici anche estese. Dal punto di vista tipologico le smerigliatrici si differenziano per alimentazione (elettrica o pneumatica), e funzionamento (le mini smerigliatrici hanno potenza limitata, alto numero di giri e dischi di diametro che va da i 115 mm ai 125 mm mentre le smerigliatrici hanno potenza maggiore, velocità minore ma montano dischi di diametro da 180 mm a 230 mm).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) non collegato a terra; assicurati del corretto funzionamento dei dispositivi di comando (pulsanti e dispositivi di arresto) accertandoti, in special modo, dell'efficienza del dispositivo "a uomo presente" (automatico ritorno alla posizione di arresto, quando si rilascia l'impugnatura); 2) Accertati che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 3) Accertati dell'assenza di materiale infiammabile in prossimità del posto di lavoro; 4) Assicurati che l'elemento su cui operare non sia in tensione o attraversato da impianti tecnologici attivi; 5) Evita assolutamente di operare tagli e/o smerigliature su contenitori o bombole che contengano o abbiano contenuto gas infiammabili o esplosivi o altre sostanze in grado di produrre vapori esplosivi; 6) Accertati che le feritoie di raffreddamento, collocate sull'involucro esterno dell'utensile siano libere da qualsiasi ostruzione; 7) Assicurati del corretto fissaggio del disco, e della sua idoneità al lavoro da eseguire; 8) Accertati dell'integrità ed efficienza del disco; accertati dell'integrità e del corretto posizionamento delle protezioni del disco e paraschegge; 9) Provvedi a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la sosta; segnala l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato.

Durante l'uso: 1) Utilizza entrambe le mani per tenere saldamente l'attrezzo; 2) Provvedi a bloccare pezzi in lavorazione, mediante l'uso di morsetti ecc., evitando assolutamente qualsiasi soluzione di fortuna (utilizzo dei piedi, ecc.); 3) Durante le pause di lavoro, ricordati di interrompere l'alimentazione elettrica; 4) Assicurati che terzi non possano inavvertitamente riavviare impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc) che interessano la zona di lavoro; 5) Posizionati in modo stabile prima di dare inizio alle lavorazioni; evita assolutamente di manomettere le protezioni del disco; 6) Evita assolutamente di compiere operazioni di registrazione, manutenzione o riparazione su organi in movimento; 7) Evita di toccare il disco al termine del lavoro (taglio e/o smerigliatura), poiché certamente surriscaldato; 8) Durante la levigatura evita di esercitare forza sull'attrezzo appoggiandoti al materiale; 9) Al termine delle operazioni di taglio, presta particolare attenzione ai contraccolpi dovuti al cedimento del materiale; 10) Durante le operazioni di taglio praticate su muri, pavimenti o altre strutture che possano nascondere cavi elettrici, evita assolutamente di toccare le parti metalliche dell'utensile; 11) Evita di velocizzare l'arresto del disco utilizzando il pezzo in lavorazione; 12) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione elettrica.

Riferimenti Normativi:

D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43.

- 2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** occhiali; **d)** maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); **e)** otoprotettori; **f)** guanti antivibrazioni; **g)** indumenti protettivi (tute).

Taglierina elettrica

Attrezzatura elettrica da cantiere per il taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Taglierina elettrica: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati della stabilità della macchina; 2) Accertati del corretto fissaggio della lama e degli accessori; 3) Accertati del buon stato e della corretta disposizione delle protezioni dagli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, ecc.); 4) Accertati dell'efficienza della lama di protezione del disco; 5) Assicurati dell'efficienza del carrellino portapezzi; 6) Accertati che l'area di lavoro sia sufficientemente illuminata; 7) Accertati dell'integrità dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili; 8) Assicurati del corretto funzionamento dell'interruttore di avviamento; 9) Assicurati del corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza (bobina di sgancio) contro l'avviamento automatico in caso di accidentale rimessa in tensione della macchina; 10) Accertati che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia esposto a

danneggiamenti (causati dal materiale lavorato o da lavorare, transito di persone, ecc); **11)** Provvedi a riempire il contenitore d'acqua; **12)** Controlla la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia).

Durante l'uso: **1)** Utilizza il carrello portapezzi per procedere alla lavorazione; **2)** Accertati che il pezzo da lavorare sia posizionato correttamente; **3)** Assumi una posizione stabile e ben equilibrata prima di procedere nel lavoro; **4)** Assicurati che la vaschetta posta sotto il piano di lavoro contenga sempre una sufficiente quantità d'acqua; **5)** Accertati che la macchina non si surriscaldi eccessivamente; **6)** Provvedi a mantenere ordinata l'area di lavoro, ed in special modo, adoperati affinché il piano di lavoro sia sempre pulito e sgombro da materiali di scarto; **7)** Assicurati di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; **8)** Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: **1)** Ricordati di scollegare elettricamente la macchina; pulisci la macchina da eventuali residui di materiale curando, in particolare, la pulizia della vaschetta dell'acqua; **2)** Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43.

- 2) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** calzature di sicurezza; **b)** guanti.

Trancia-piegaferri

La trancia-piegaferri viene utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato cementizio armato. E' costituita da una piastra circolare al cui centro è fissato un perno che serve d'appoggio al ferro tondino da piegare; in posizione leggermente decentrata, è fissato il perno sagomatore mentre lungo la circonferenza della piastra rotante abbiamo una serie di fori, nei quali vengono infissi appositi perni, che consentono di determinare l'angolo di piegatura del ferro tondino. Nella parte frontale, rispetto all'operatore, è collocata la tranciaferri costituita da un coltello mobile, azionato con pedaliera o con pulsante posizionato sulla piastra.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Trancia-piegaferri: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: **1)** Accertati dell'integrità dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili; assicurati dell'integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere e del buon funzionamento degli interruttori elettrici di azionamento e di manovra; **2)** Controlla la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); **3)** Accertati della stabilità della macchina; **4)** Accertati dell'adeguatezza dell'area di lavoro circostante il banco di lavorazione; **5)** Assicurati dell'efficienza del pedale di comando e dell'interruttore; **6)** Prendi visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza; **7)** Accertati della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di manovra e agli altri organi di trasmissione del moto (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.) e del buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto.

Durante l'uso: **1)** Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; **2)** Presta particolare attenzione nel mantenere ad adeguata distanza le mani dagli organi lavoratori; **3)** Qualora debbano essere eseguite lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali per trattenere e movimentare il pezzo in prossimità degli organi lavoratori; **4)** Evita di tagliare più tondini o barre contemporaneamente; **5)** Mantieni sgombro da materiali il banco di lavoro; **6)** Evita assolutamente di rimuovere i dispositivi di protezione; **7)** Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: **1)** Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici della macchina (interrotto ogni operatività) e l'interruttore generale di alimentazione al quadro; **2)** Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente; **3)** Pulisci la macchina da eventuali residui di materiale e, in particolare, verifica che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori di alimentazione e/o messa a terra.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

- 2) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** guanti; **d)** indumenti protettivi (tute).

Trapano elettrico

Il trapano è un utensile di uso comune, adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale (legno, metallo, calcestruzzo, ecc.), ad alimentazione prevalentemente elettrica. Esso è costituito essenzialmente da un motore elettrico, da un giunto meccanico (mandrino) che, accoppiato ad un variatore, produce un moto di rotazione e percussione, e dalla punta vera e propria. Il moto di percussione può mancare nelle versioni più semplici dell'utensile, così come quelle più sofisticate possono essere corredate da un dispositivo che permette di invertire il moto della punta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 2) Accertati che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; assicurati del corretto funzionamento dell'interruttore; 3) Accertati del buon funzionamento dell'utensile; 4) Assicurati del corretto fissaggio della punta; 5) Accertati che le feritoie di raffreddamento, collocate sull'involucro esterno dell'utensile siano libere da qualsiasi ostruzione; assicurati che l'elemento su cui operare non sia in tensione o attraversato da impianti tecnologici attivi.

Durante l'uso: 1) Durante le pause di lavoro, ricordati di interrompere l'alimentazione elettrica; 2) Posizionati in modo stabile prima di dare inizio alle lavorazioni; 3) Evita assolutamente di compiere operazioni di registrazione, manutenzione o riparazione su organi in movimento; 4) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici; 5) Assicurati che terzi non possano inavvertitamente riavviare impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc) che interessano la zona di lavoro; 6) Durante le operazioni di taglio praticate su muri, pavimenti o altre strutture che possano nascondere cavi elettrici, evita assolutamente di toccare le parti metalliche dell'utensile; 7) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione elettrica.

Riferimenti Normativi:

D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43.

- 2) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** calzature di sicurezza; **b)** maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); **c)** otoprotettori; **d)** guanti.

Vibratore elettrico per calcestruzzo

Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzo da cantiere per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Vibratore elettrico per calcestruzzo: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati che i cavi di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 2) Accertati che i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo da essere preservati da danneggiamenti; 3) Assicurati di aver posizionato il trasformatore in un luogo asciutto.

Durante l'uso: 1) Durante le pause di lavoro ricorda di scollegare l'alimentazione elettrica; 2) Assicurati di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni; 3) Evita di mantenere l'organo lavoratore (cosiddetto "ago") a lungo fuori dal getto; 4) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Ricordati di scollegare l'alimentazione elettrica dell'utensile; 2) Accertati di aver pulito con cura l'attrezzo; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione elettrica.

Riferimenti Normativi:

D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43.

- 2) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** copricapo; **b)** calzature di sicurezza; **c)** guanti; **d)** indumenti protettivi (tute).

Elenco delle macchine:

- 1) Autobetoniera;
- 2) Autocarro;
- 3) Autogrù;
- 4) Autopompa per cls;
- 5) Dumper;
- 6) Escavatore;
- 7) Gru a torre;
- 8) Pala meccanica.

Autobetoniera

L'autobetoniera è un mezzo d'opera su gomma destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera. Essa è costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente ed una tramoggia rotante destinata al trasporto dei calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Cesoimenti, stritolamenti;
- 4) Investimento, ribaltamento;
- 5) Rumore per "Operatore autobetoniera";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Uguale a 80 dB(A)".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione ($L_{ex} > 80 \text{ dB(A)}$) e minori o uguali ai valori superiori di azione ($L_{ex} \leq 85 \text{ dB(A)}$), su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell'udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell'udito:

- 1) Carico materiale (B27), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).

- 6) Scivolamenti, cadute a livello;
- 7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 8) Vibrazioni per "Operatore autobetoniera";

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s².

Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s².

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) Autobetoniera: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi (con particolare riguardo per i comandi del tamburo e i dispositivi di blocco in posizione di riposo) e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in movimento (catena di trasmissione, ruote dentate, ecc.); 5) Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico; 6) Controlla la stabilità della scaletta; 7) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 8) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 9) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 10) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 11) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 12) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 13) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 14) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 15) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.

Durante l'uso: 1) Accertati, prima di effettuare spostamenti, che il canale di scarico sia ben ancorato al mezzo; 2) Annuncia l'inizio delle operazioni mediante l'apposito segnalatore acustico; 3) Durante le operazioni di scarico, sorveglia costantemente il canale per impedirne oscillazioni e contraccolpi; 4) Se presente la benna di caricamento, mantieniti a distanza di sicurezza durante le manovre di caricamento, impedendo a chiunque di avvicinarsi; 5) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 6) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo particolare attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente; 2) In particolare accertati che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente prima di procedere alla pulizia del tamburo, della tramoggia e del canale.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; Circolare Ministero del Lavoro n. 103/80.

- 2) DPI: operatore autobetoniera;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

- a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Autocarro

L'autocarro è una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da demolizioni o scavi, ecc., costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un cassone generalmente ribaltabile, a mezzo di un sistema oleodinamico.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 3) Inalazione polveri, fibre;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
- 7) Movimentazione manuale dei carichi;
- 8) Rumore per "Operatore autocarro";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

9) Scivolamenti, cadute a livello;

10) Urti, colpi, impatti, compressioni;

11) Vibrazioni per "Operatore autocarro";

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. È obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s².

Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per $A(8) > 1 \text{ m/s}^2$.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Autocarro: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 5) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 6) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 7) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 10) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 11) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 12) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.

Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio dell'azionamento del ribaltabile mediante l'apposito segnalatore acustico; 2) Impedisci a chiunque di farsi trasportare all'interno del cassone; 3) Evita assolutamente di azionare il ribaltabile se il mezzo è in posizione inclinata; 4) Nel caricare il cassone poni attenzione a: disporre i carichi in maniera da non squilibrare il mezzo, vincolarli in modo da impedire spostamenti accidentali durante il trasporto, non superare l'ingombro ed il carico massimo; 5) Evita sempre di caricare il mezzo oltre le sponde, qualora vengano movimentati materiali sfusi; 6) Accertati sempre, prima del trasporto, che le sponde siano correttamente agganciate; 7) Durante le operazioni di carico e scarico scendi dal mezzo se la cabina di guida non è dotata di roll-bar antischiacciamento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo particolare attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** guanti; **d)** indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Autogrù

L'autogrù è un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina o da apposita postazione. Il suo impiego in cantiere può essere il più disparato, data la versatilità del mezzo e le differenti potenzialità dei tipi in commercio, e può andare dal sollevamento (e posizionamento) dei componenti della gru, a quello di macchine o dei semplici materiali da costruzione, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Inalazione polveri, fibre;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
- 7) Movimentazione manuale dei carichi;
- 8) Punture, tagli, abrasioni;
- 9) Rumore per "Operatore autogrù";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

10) Scivolamenti, cadute a livello;

11) Urti, colpi, impatti, compressioni;

12) Vibrazioni per "Operatore autogrù";

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s².

Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s².

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) Autogrù: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in movimento; 5) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 10) Durante gli spostamenti del mezzo e durante le manovre di sollevamento, aziona il girofaro; 11) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 13) Stabilizza il mezzo utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove necessario, provvedi ad ampliarne l'appoggio con basi dotate adeguata resistenza; 14) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.

Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di sollevamento mediante l'apposito segnalatore acustico; 2) Durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 3) Il sollevamento e/o lo scarico deve essere sempre effettuato con le funi in posizione verticale; 4) Attieniti alle indicazioni del personale a terra durante le operazioni di sollevamento e spostamento del carico; 5) Evita di far transitare il carico al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Evita assolutamente di effettuare manutenzioni su organi in movimento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Evita di lasciare carichi sospesi; 2) Ritira il braccio telescopico e accertati di aver azionato il freno di stazionamento; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

- 2) DPI: operatore autogrù;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) ottoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

- a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Autopompa per cls

L'autopompa per getti di cls è un automezzo su gomma attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo, allo stato fluido, per getti in quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Cesoamenti, stritolamenti;
- 4) Elettrocuzione;
- 5) Getti, schizzi;
- 6) Investimento, ribaltamento;
- 7) Movimentazione manuale dei carichi;
- 8) Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di

lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

9) Scivolamenti, cadute a livello;

10) Urti, colpi, impatti, compressioni;

11) Vibrazioni per "Operatore pompa per il cls (autopompa)";

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) spostamenti per 20%.

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. È obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s².

Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per $A(8) > 1 \text{ m/s}^2$.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Autopompa per cls: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Controlla la funzionalità della pulsantiera; 4) Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale; 5) Controlla che tutti gli organi di trasmissione siano protetti da contatti accidentali; 6) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 7) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 8) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 9) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 10) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 11) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo e della zona attraversata dalle tubazioni; 13) Stabilizza il mezzo utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove necessario, provvedi ad ampliarne l'appoggio con basi dotate adeguata resistenza; 14) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.

Durante l'uso: 1) Coadiuvare il conducente dell'autobetoniera durante le manovre di avvicinamento all'autopompa; 2) Annuncia l'inizio delle manovre di pompaggio mediante l'apposito segnalatore acustico; 3) Evita assolutamente di asportare la griglia di protezione della vasca; 4) Durante le operazioni di pompaggio, sorveglia costantemente l'estremità flessibile del terminale della pompa per impedirne oscillazioni e contraccolpi; 5) Evita assolutamente di utilizzare il braccio d'uso della pompa per il sollevamento e/o la movimentazione di carichi; 6) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 7) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autopompa per cls;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) guanti; e) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Dumper

Il dumper è una macchina utilizzata esclusivamente per il trasporto e lo scarico del materiale, costituita da un corpo semovente su ruote, munito di un cassone.

Lo scarico del materiale può avvenire posteriormente o lateralmente mediante appositi dispositivi oppure semplicemente a gravità. Il telaio della macchina può essere rigido o articolato intorno ad un asse verticale. In alcuni tipi di dumper, al fine di facilitare la manovra di scarico o distribuzione del materiale, il posto di guida ed i relativi comandi possono essere reversibili.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 3) Investimento, ribaltamento;
- 4) Movimentazione manuale dei carichi;
- 5) Rumore per "Operatore dumper";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione ($L_{ex} > 85$ dB(A)) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza è effettuata dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate.

Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell'udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell'udito:

- 1) Utilizzo dumper (B194), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).

- 6) Scivolamenti, cadute a livello;
- 7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 8) Vibrazioni per "Operatore dumper";

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo dumper per 60%.

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e

segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s².

Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s².

Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.

Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi.

Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare su strade accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile.

Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale.

Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta.

Dispositivi di protezione individuale:

Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore).

Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) Dumper: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 4) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 5) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 6) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 7) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra.

Durante l'uso: 1) Impedisci a chiunque di farsi trasportare all'interno del cassone; 2) Evita di percorrere in retromarcia lunghi percorsi; 3) Effettua gli spostamenti con il cassone in posizione di riposo; 4) Evita assolutamente di azionare il ribaltabile se il mezzo è in posizione inclinata o in condizioni di stabilità precaria; 5) Provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 6) Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Evita assolutamente di effettuare manutenzioni su organi in movimento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Accertati di aver azionato il freno di stazionamento quando riponi il mezzo; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo particolare attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

- 2) DPI: operatore dumper;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** ottoprotettori; **d)** guanti; **e)** maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); **f)** indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

- a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Escavatore

L'escavatore è una macchina particolarmente versatile che può essere indifferentemente utilizzata per gli scavi di sbancamento o a sezione obbligata, per opere di demolizioni, per lo scavo in galleria, semplicemente modificando l'utensile disposto alla fine del braccio meccanico. Nel caso di utilizzo per scavi, l'utensile impiegato è una benna che può essere azionata mediante funi o un sistema oleodinamico. L'escavatore è costituito da: **a)** un corpo base che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto al terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il movimento della macchina sul piano di lavoro; **b)** un corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, può ruotare di 360 gradi rispetto al corpo base e nel quale sono posizionati sia la postazione di comando che il motore e l'utensile funzionale.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Investimento, ribaltamento;
- 4) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
- 5) Rumore per "Operatore escavatore";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

- 6) Scivolamenti, cadute a livello;
- 7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 8) Vibrazioni per "Operatore escavatore";

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%.

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. È obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s².

Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per $A(8) > 1 \text{ m/s}^2$.

Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.

Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi.

Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare su strade accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile.

Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale.

Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta.

Dispositivi di protezione individuale:

Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore).

Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) Escavatore: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 5) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 9) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 10) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 11) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 13) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.

Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore acustico; 2) Se il mezzo ne è dotato, ricorda di utilizzare sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di scavo durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 3) Impedisci a chiunque l'accesso a bordo del mezzo; 4) Impedisci a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della benna; 5) Evita di traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal terreno tale da assicurare una buona visibilità e stabilità; 8) Durante le interruzioni momentanee del lavoro, abbassa a terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco dei comandi; 9) Durante le operazioni di sostituzione dei denti della benna, utilizza sempre occhiali di protezione ed otoprotettori; 10) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di stazionamento ed inserito il blocco dei comandi; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

- 2) DPI: operatore escavatore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** calzature di sicurezza; **c)** maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); **d)** otoprotettori; **e)** guanti; **f)** indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

- a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Gru a torre

La gru a torre è il principale mezzo di sollevamento e movimentazione dei carichi in cantiere. E' azionata da un proprio motore ed è costituita, essenzialmente, dalle seguenti parti: **a)** la struttura, composta da profilati e tubolari metallici saldati ed imbullonati in modo da realizzare un traliccio; **b)** il sistema stabilizzante, costituito dalla zavorra di base e, per le gru con rotazione in alto, da quella di controfreccia posta sulla parte rotante, mentre per quelle con rotazione in basso, la zavorra di controfreccia viene sostituita dall'azione di un tirante collegato a quella di base; **c)** gli organi di movimento, composti dai motori, generalmente elettrici, e dai meccanismi che servono per manovrare la gru; **d)** i dispositivi di sicurezza, i cui principali sono di carattere elettrico. Esistono in commercio numerosi tipi di gru, che si differenziano principalmente per le dimensioni e quindi per le portate sollevabili. Le gru possono essere dotate di basamenti fissi o su rotaie, per consentire un più agevole utilizzo durante lo sviluppo del cantiere senza dover essere costretti a smontarla e montarla ripetutamente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Elettrocuzione;
- 4) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
- 5) Rumore per "Gruista (gru a torre)";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 25 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

- 6) Scivolamenti, cadute a livello;
- 7) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) Gru a torre: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati che non vi siano cedimenti della base d'appoggio della gru o che si evidenzino ristagni d'acqua; 2) Verifica che non si proceda a scavi in prossimità della base d'appoggio della gru o, se necessari, tali scavi vengano adeguatamente armati; 3) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e dei gruppi ottici di illuminazione; 4) Verifica che non vi siano linee elettriche o strutture fisse interferenti l'area di manovra della gru; 5) Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in movimento; 6) Controlla la funzionalità della pulsantiera; 7) Accertati che sia correttamente disposta la protezione della zavorra (nel caso di rotazione bassa); 8) Accertati che sia stato effettuato il rifornimento di lubrificante agli ingrassatori relativi agli organi in rotazione; 9) Controlla la funzionalità della sicura di chiusura del gancio e del freno della rotazione; 10) Controlla l'efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni; 11) Qualora vi sia presenza di più gru interferenti, e la loro reciproca movimentazione sia stata pianificata, prendi visione degli ordini di servizio relativi alle modalità di movimentazione e di segnalazione; 12) Effettua un'accurata verifica delle condizioni della gru a seguito di fenomeni meteorologici rilevanti o eventi tellurici.

Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre mediante l'apposito segnalatore acustico; 2) Evita di far transitare il carico al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 3) Ricordati di utilizzare la forca solo per le operazioni di carico e scarico degli automezzi, senza mai superare l'altezza da terra di m. 2; 4) Utilizza solo contenitori adeguati al tipo di materiale da movimentare (in particolare per materiali minuti, adopera benne, cestelli, cassoni metallici dotati di ganci di chiusura); 5) Il sollevamento e/o lo scarico deve essere sempre effettuato con le funi in posizione verticale; 6) Il sollevamento e/o lo scarico deve essere sempre effettuato con gradualità; 7) Verifica che i carichi siano sempre ben equilibrati imbracati, attenendoti sempre alle portate indicate sui cartelli; 8) Prima di far sganciare il carico, accertati sempre che esso sia stabile; 9) Durante le soste, ritira il gancio in posizione di riposo, libera la gru al vento scollegandola elettricamente, ed evita di lasciare carichi sospesi; 10) In presenza di forte vento, sospendi ogni operazione, procedi ad un ancoraggio supplementare e lascia libero il braccio di ruotare; 11) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Al termine del turno di lavoro, ritira il gancio in posizione di riposo, libera la gru al vento scollegandola elettricamente, ed evita di lasciare carichi sospesi; 2) Procedi ad un ancoraggio supplementare; 3) Inoltre accertati che periodicamente vengano effettuate le prescritte manutenzioni; 4) In particolare: controlla che sia stata effettuata la verifica trimestrale delle funi; 5) Accertati che la struttura non presenti aste deformate o ossidate e che i bulloni siano correttamente serrati; 6) Accertati dello stato di usura e funzionamento delle parti in movimento, dell'avvolgicavo, dei freni dei motori e di rotazione; 7) Verifica il livello dell'olio negli ingrassatori, accertandoti che pulegge, tamburo, ralla, ecc. siano ben ingrassati; 8) Verifica l'integrità dei conduttori di terra contro le scariche atmosferiche; 9) In caso di interventi di manutenzione al di fuori delle protezioni fisse, utilizza un'imbracatura di sicurezza con doppia fune di trattenuta; 10) Accertati della corretta taratura del limitatore di carico.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

- 2) DPI: operatore gru a torre;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute); e) attrezzatura anticaduta.

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Carriola;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Pala meccanica

La pala meccanica è una macchina utilizzata per lo scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico del materiale. La macchina è costituita da un corpo semovente, su cingoli o su ruote, munita di una benna, nella quale, mediante la spinta della macchina, avviene il caricamento del terreno. Lo scarico può avvenire mediante il rovesciamento della benna, frontalmente, lateralmente o posteriormente. I caricatori su ruote possono essere a telaio rigido o articolato intorno ad un asse verticale. Per particolari lavorazioni la macchina può essere equipaggiata anteriormente con benne speciali e, posteriormente, con attrezzi trainati o portati quali scarificatori, verricelli, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Investimento, ribaltamento;
- 4) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
- 5) Rumore per "Operatore pala meccanica";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione ($L_{ex} > 80 \text{ dB(A)}$) e minori o uguali ai valori superiori di azione ($L_{ex} \leq 85 \text{ dB(A)}$), su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell'udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell'udito:

1) Utilizzo pala (B446), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).

- 6) Scivolamenti, cadute a livello;
- 7) Vibrazioni per "Operatore pala meccanica";

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s^2 ".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche.

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s^2 e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a $1,5 \text{ m/s}^2$.

Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per $A(8) > 1 \text{ m/s}^2$.

Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.

Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi.

Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare su strade accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile.

Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale.

Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta.

Dispositivi di protezione individuale:

Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore).

Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Pala meccanica: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 5) Verifica la funzionalità del dispositivo di attacco del martello e le connessioni delle relative tubazioni dell'impianto oleodinamico; 6) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 7) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 9) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 10) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 11) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 12) Valuta, con il preposto e/o il datore di lavoro, la distanza cui collocarsi da strutture pericolanti o da demolire e/o da superfici aventi incerta portanza; 13) Provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 14) Provvedi a delimitare l'area esposta a livello di rumorosità elevata; 15) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.

Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore acustico; 2) Se il mezzo ne è dotato, estendi sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di demolizione; 3) Durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 4) Impedisci a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della benna; 5) Evita di traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Evita di caricare la benna, con materiale sfuso, oltre il suo bordo; 8) Durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal terreno tale da assicurare una buona visibilità e stabilità; 9) Durante le interruzioni momentanee del lavoro, abbassa a terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco dei comandi; 10) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di stazionamento ed inserito il blocco dei comandi; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore pala meccanica;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** copricapo; **c)** calzature di sicurezza; **d)** maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); **e)** ottoprotettori; **f)** guanti; **g)** indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

EMISSIONE SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008)

| ATTREZZATURA | Lavorazioni | Emissione Sonora dB(A) |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| Battipistarelle elettrico | protezione guaine coperture piane; Posa di pavimenti per interni; protezione guaine coperture piane; Posa di pavimenti per interni. | 93.7 |
| Betoniera a bicchiere | Realizzazione di compattature; Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali; Realizzazione di divisori interni; Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate; Realizzazione di compattature; Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali; Realizzazione di divisori interni; Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate. | 80.5 |
| Cannello a gas | Impermeabilizzazione di coperture; Impermeabilizzazione di coperture. | 86.3 |
| Impastatrice | Formazione di massetto per coperture; Formazione intonaci interni (tradizionali); Formazione di massetto per pavimenti interni; Formazione di massetto per coperture; Formazione intonaci interni (tradizionali); Formazione di massetto per pavimenti interni. | 79.8 |
| Intonacatrice | Formazione intonaci esterni (industrializzati); Formazione intonaci esterni (industrializzati). | 86.4 |
| Saldatrice elettrica | Realizzazione di impianto termico (autonomo); Posa di ringhiere e parapetti; Realizzazione di impianto termico (autonomo); Posa di ringhiere e parapetti. | 71.2 |
| Scanalatrice per muri ed intonaci | Realizzazione di impianto elettrico interno; Realizzazione di impianto radiotelevisivo; Realizzazione di impianto telefonico e citofonico; Realizzazione di impianto ascensore; Realizzazione di impianto elettrico interno; Realizzazione di impianto radiotelevisivo; Realizzazione di impianto telefonico e citofonico. | 98.0 |
| Sega circolare | Realizzazione di trattenne di delimitazione scavi; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Realizzazione di trattenne di delimitazione scavi; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato. | 89.9 |
| Smerigliatrice angolare (flessibile) | Posa di ringhiere e parapetti; Posa di ringhiere e parapetti. | 97.7 |
| Taglierina elettrica | Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali; Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate; protezione guaine coperture piane; Posa di rivestimenti interni; Posa di pavimenti per interni; Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali; Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate; protezione guaine coperture piane; Posa di rivestimenti interni; Posa di pavimenti per interni. | 95.1 |
| Trancia-piegaferri | Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato. | 79.2 |
| Trapano elettrico | Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di impianto termico (autonomo); Realizzazione di impianto elettrico interno; Realizzazione di impianto radiotelevisivo; Realizzazione di impianto telefonico e citofonico; Realizzazione di impianto ascensore; Posa di ringhiere e parapetti; Smobilizzo del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di impianto termico (autonomo); Realizzazione di impianto elettrico interno; Realizzazione di impianto radiotelevisivo; Realizzazione di impianto telefonico e citofonico; Posa di ringhiere e parapetti; Smobilizzo del cantiere. | 90.6 |
| Vibratore elettrico per calcestruzzo | Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione. | 81.0 |

| MACCHINA | Lavorazioni | Emissione Sonora dB(A) |
|-----------------|---|-------------------------------|
| Autobetoniera | Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. | 83.1 |

| MACCHINA | Lavorazioni | Emissione Sonora dB(A) |
|-------------------|--|------------------------|
| | in opera o prefabbricato. | |
| Autocarro | Realizzazione della viabilità del cantiere; Montaggio della gru a torre; Scavo di sbancamento; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; smontaggio della gru a torre; Smobilizzo del cantiere; Realizzazione della viabilità del cantiere; Montaggio della gru a torre; Scavo di sbancamento; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; smontaggio della gru a torre; Smobilizzo del cantiere. | 77.9 |
| Autogrù | Allestimento di servizi igienico del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Montaggio della gru a torre; smontaggio della gru a torre; Smobilizzo del cantiere; Allestimento di servizi igienico del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Montaggio della gru a torre; smontaggio della gru a torre; Smobilizzo del cantiere. | 81.6 |
| Autopompa per cls | Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato. | 82.6 |
| Dumper | Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione di transenne di delimitazione scavi; Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione di transenne di delimitazione scavi. | 86.0 |
| Escavatore | Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Scavo di sbancamento; Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Scavo di sbancamento. | 80.9 |
| Gru a torre | Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Realizzazione di compattature; Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali; Realizzazione di divisori interni; Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate; Formazione di massetto per coperture; Impermeabilizzazione di coperture; protezione guaine coperture piane; Realizzazione di opere di lattoneria; Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di impianto termico (autonomo); Realizzazione di impianto ascensore; Formazione intonaci esterni (industrializzati); Formazione intonaci interni (tradizionali); Posa di rivestimenti interni; Formazione di massetto per pavimenti interni; Posa di pavimenti per interni; Tinteggiatura di superfici esterne; Tinteggiatura di superfici interne; Posa di serramenti interni; Posa di serramenti esterni; Posa di ringhiere e parapetti; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Realizzazione di compattature; Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali; Realizzazione di divisori interni; Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate; Formazione di massetto per coperture; Impermeabilizzazione di coperture; protezione guaine coperture piane; Realizzazione di opere di lattoneria; Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di impianto termico (autonomo); Formazione intonaci esterni (industrializzati); Formazione intonaci interni (tradizionali); Posa di rivestimenti interni; Formazione di massetto per pavimenti interni; Posa di pavimenti per interni; Tinteggiatura di superfici esterne; Tinteggiatura di superfici interne; Posa di serramenti interni; Posa di serramenti esterni; Posa di ringhiere e parapetti. | 77.8 |
| Pala meccanica | Realizzazione della viabilità del cantiere; Scavo di sbancamento; Rinterro di scavo; Realizzazione della viabilità del cantiere; Scavo di sbancamento; Rinterro di scavo. | 84.6 |

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora "da coordinare".
Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti, che sono compatibili, senza bisogno di una prescrizione.



COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Locali di ricovero e di riposo

L'uso dei locali di ricovero e deposito viene concesso a cura dell'impresa principale alle altre imprese o lavoratori autonomi. Ad essa compete comunque il mantenimento in sicurezza e la pulizia dei servizi assistenziali.

Zone di carico e scarico

L'approntamento delle zone di carico e scarico viene eseguito dall'impresa principale, che ne concede l'uso alle altre imprese o lavoratori autonomi. All'impresa principale compete comunque il mantenimento in sicurezza.

Le zone di carico e scarico vanno utilizzate previo accordo tra i Responsabili del S.P.P. delle diverse imprese operanti, in accordo con quanto prescritto dalla segnaletica e dalle norme d'uso predisposte dall'impresa principale in accordo con il Coordinatore in Esecuzione.

Zone di deposito attrezzature e stoccaggio materiali

L'approntamento delle zone di deposito delle attrezzature e di stoccaggio dei materiali viene eseguito dall'impresa principale, che ne concede l'uso alle altre imprese o lavoratori autonomi. All'impresa principale compete comunque il mantenimento in sicurezza.

Le zone di deposito delle attrezzature e di stoccaggio dei materiali vanno utilizzate previo accordo tra i Responsabili del S.P.P. delle diverse imprese operanti, in accordo con quanto prescritto dalla segnaletica e dalle norme d'uso predisposte dall'impresa principale in accordo con il Coordinatore in Esecuzione.

Zone stoccaggio dei rifiuti

L'approntamento delle zone di stoccaggio dei rifiuti viene eseguito dall'impresa principale, che ne concede l'uso alle altre imprese o lavoratori autonomi. All'impresa principale compete comunque il mantenimento in sicurezza e lo smaltimento in discarica dei rifiuti prodotti, attuando procedure di raccolta differenziata.

Le zone di stoccaggio dei rifiuti vanno utilizzate previo accordo tra i Responsabili del S.P.P. delle diverse imprese operanti, in accordo con quanto prescritto dalla segnaletica e dalle norme d'uso predisposte dall'impresa principale in accordo con il Coordinatore in Esecuzione.

Impianto elettrico di cantiere

L'uso dell'impianto elettrico di cantiere potrà essere concesso a cura dell'impresa principale alle altre imprese o lavoratori autonomi. Ad essa compete comunque il mantenimento in sicurezza dell'impianto.

Durante la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente verrà dato preavviso a tutte le maestranze presenti in cantiere. Le parti dell'impianto sotto tensione verranno debitamente protette.

Ponteggi

I lavoratori autonomi e le imprese subappaltanti verranno rese edotte che non potranno rimuovere le opere provvisorie dell'impresa (esempio: non rimuovere le tavole del ponteggio per realizzare basamenti temporanei, non rimuovere le scale di accesso ai ponteggi ecc.).

Mezzi d'opera

Solo i lavoratori autorizzati manovreranno macchine di cantiere per il cui uso è necessaria la presenza del macchinista specializzato.

In presenza di operazioni di saldatura a fiamma, soprattutto se seguite da personale esterno, il personale addetto si accerterà che tale operazioni non comporti rischi di incendio a danno delle strutture adiacenti.

Betoniere

L'utilizzo della betoniera da parte degli operatori avverrà seguendo le fasi di lavoro già previste nel Gantt non vi saranno interferenze fra imprese.

Gru

La gru a torre, a servizio dell'intero cantiere, opererà tenendo conto delle singole richieste di intervento da parte degli operatori. Il responsabile dei lavori in cantiere provvederà, qualora necessario, ad informare gli operatori in transito sulla proiezione dei carichi sospesi. Si adotteranno quindi quelle misure di carattere generale ed individuale atte a ridurre al minimo i rischi durante la movimentazione.

Seghe circolari

L'utilizzo della sega circolare da parte degli operai avviene in tempi non interferenti. Laddove si verificasse la necessità di utilizzare la sega circolare nello stesso momento, si valuteranno le interferenze sopraggiunte, analizzeranno i rischi connessi le misure da adottare per eliminare o ridurre il rischio.

Viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici


sarà cura del responsabile della sicurezza in cantiere ogni qualvolta è prevista la presenza di un automezzo in movimento, dare preavviso al personale presente in cantiere. La opportuna segnaletica posta lungo il percorso sia per gli automezzi sia pedonale, indicherà le modalità di transito.

Zone di carico e scarico

La limitata estensione della zona di carico e scarico di cantiere, consente una completa visibilità dell'area interessata. Allo scopo comunque di prevenire danni, sono stati apposti appositi segnali di pericolo, avvertimento e obbligo.

Ponteggi

L'utilizzo dei ponteggi da parte degli operatori avverrà seguendo le fasi di lavoro già previste nel Gantt e comunque non sono previste sovrapposizioni di lavorazioni sulla stessa verticale nè vi saranno interferenze fra imprese.



MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Il programma dei lavori definisce la successione temporale delle fasi lavorative, così come si pensa che si svolgeranno successivamente all'inizio dei lavori.

Stante la tipologia di lavorazioni da eseguire, incluse in parte nella categoria di lavori edili e in parte nella categoria di lavori impiantistici, si prevede la presenza di un'impresa principale e di imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi di diversa estrazione. Ciò nonostante, la mancanza, in questa fase, di dati certi sulla capacità tecnologica, la dotazione di personale, ecc. dei suddetti esecutori, aspetti questi di non secondaria importanza per il cantiere in oggetto, non permette di stabilire a priori le eventuali lavorazioni interferenti e conseguentemente le condizioni di rischio indotte dalla contemporaneità delle azioni.

A seguito di quanto precede, prima dell'inizio di ciascuna attività di cantiere, la/le imprese appaltatrici dovranno consegnare al Coordinatore per l'esecuzione, un proprio programma dei lavori con l'indicazione della tempistica di svolgimento delle attività da eseguire (diagramma di Gantt), la valutazione dei rischi e la proposta delle misure di prevenzione e protezione che si intendono adottare per eliminare i rischi derivanti da eventuali interferenze di lavorazioni introdotte.

Da quanto precede si prescrive che, in caso di presenza in cantiere di più imprese e/o lavoratori autonomi, si dovrà fare riferimento ai Piani Operativi per la Sicurezza e la salute dei lavoratori forniti da ciascuna di esse.

Non appena l'Impresa Appaltatrice comunicherà i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici e/o dei lavoratori autonomi dei quali intende servirsi, si dovrà provvedere ad aggiornare il presente piano in funzione degli eventuali nuovi rischi possibili.

In linea generale, ad ognuna delle imprese subappaltatrici sarà assegnata un'area di lavoro dove svolgere la propria mansione e qualora si dovessero verificare interferenze tra le varie attività lavorative, il coordinatore in fase di esecuzione dovrà valutare gli eventuali rischi e adottare le misure di sicurezza necessarie. Egli dovrà inoltre:

- organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione e il coordinamento delle attività;
- organizzare riunioni in cui verrà illustrato il presente piano di sicurezza e i piani di sicurezza di ogni singola impresa presente in cantiere;
- comunicare ad ogni singola impresa eventuali variazioni del processo produttivo e quindi della eventuale necessità di revisioni dei piani di sicurezza.

I piani operativi di sicurezza, elaborati da ogni singola impresa subappaltatrice, per le proprie specifiche lavorazioni, saranno allegati al presente piano e ne faranno parte integrante. Di tutte le riunioni verrà redatto apposito verbale.

Oltre a dover rispettare il presente Piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le attività di ciascuna impresa/lavoratore autonomo, al fine di impedire il contemporaneo svolgimento di lavorazioni in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, in quanto fonte di pericolose interferenze che possono produrre rischi di infortunio o di malattia professionale.

Qualora ciò non sia consentito, le attività interferenti fra loro, saranno regolate, in linea di preventiva definizione e fatta salva ogni ulteriore valutazione, modifica e integrazione, secondo le seguenti modalità:

- preliminarmente verifica delle attività e programmi interferenti;
- verifica delle caratteristiche e modalità di realizzazione dei lavori;
- individuazione della forza lavoro impegnata nelle attività interferenti, dei macchinari, dei mezzi e delle attrezzature fisse o mobili presenti;
- predisposizione di un idoneo programma dei lavori che preveda l'esecuzione delle attività interferenti in tempi diversi, ovvero l'effettuazione di esse in contemporanea, secondo uno specifico piano antinfortunistico.

La predisposizione del suddetto programma, dovrà avvenire rispettando le seguenti linee guida:

- attuare uno sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive ed alla disponibilità di uomini e mezzi;
- adottare idonee misure di protezione che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle interferenze, mediante allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività e gli spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza, nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente.

Tali misure dovranno essere stabilite dall'impresa che determina il rischio e portate a conoscenza dell'altra o delle altre imprese, interessate al problema dell'interferenza.

Se le misure proposte verranno dal Coordinatore ritenute idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, le stesse verranno messe in atto dalle imprese e solo successivamente alla loro avvenuta adozione, il Coordinatore autorizzerà i lavori in contemporanea, ferme restando le responsabilità di ciascuna impresa.

Nel caso in cui specifiche attività richiedano deroga a qualunque titolo al Piano per la sicurezza, dovrà venire data comunicazione scritta al Coordinatore accompagnata dalle proposte sostitutive che l'impresa intende mettere in atto.

Solo

dopo accordo con il Coordinatore e le eventuali altre imprese interessate alla deroga, ferma restando la responsabilit  dell'impresa proponente, si potr  dar corso ai lavori in deroga.

Sar  cura dell'Impresa che dovesse provvedere alla rimozione di presidi antinfortunistici per effettuare i lavori in deroga,

di provvedere, a lavori avvenuti, al ripristino degli stessi o alla sostituzione con altri che assicurino in ogni condizione,

eguali prerogative antinfortunistiche.

L'impresa che, modificando o in deroga a precedenti programmi di esecuzione dei lavori, ritenga di operare in orari diversi

da quelli previsti, dovr  dare comunicazione preventiva al Coordinatore ed alle eventuali Imprese interessate, indicando il

programma dei lavori, il piano antinfortunistico specifico, il numero degli addetti presenti, i mezzi, macchinari, le attrezzature e quant'altro necessario, evidenziando gli eventuali rischi.

I piani operativi di sicurezza, elaborati da ogni singola impresa subappaltatrice, per le proprie specifiche lavorazioni, saranno allegati al presente Piano e ne faranno parte integrante.

La schematizzazione temporale dell'opera per attivit  lavorative, rappresentata dal diagramma di Gantt, e lo strumento di

analisi che consente di valutare i rischi relativi al coordinamento tra le fasi lavorative.

Come sopra evidenziato, la mancanza di dati certi relativi alla o alle imprese esecutrici, nonch  ai tempi di approvvigionamento dei materiali in cantiere, permette soltanto una stima dei tempi di esecuzione e del susseguirsi delle

varie attivit  lavorative. Qualora si renda necessario, il Coordinatore in fase di esecuzione proceder  all'eventuale aggiornamento del programma dei lavori e vigiler  con particolare attenzione sulle interferenze non programmate, ma comunque verificabili, in modo da non escludere ulteriori contemporaneit  preventivamente non considerate. Tali situazioni impreviste, derivanti da variazioni imprevedibili dell'attivit  tipica della vita di cantiere, risultano di fatto le maggiori cause di situazioni pericolose, soprattutto quando rispondono alla necessit  della tempistica per recuperi temporali, con conseguente diminuzione di attenzione rispetto alle misure di prevenzione.

Per la stesura del programma lavori si   fatto riferimento alle metodologie maggiormente diffuse in ambito civile,integrandole e differenziandole per meglio adattarle al particolare progetto posto in essere. In tale ottica si   sviluppata un'analisi basata sul diagramma di Gantt, in modo tale da poter evidenziare le criticit  presenti. Il diagramma in oggetto   riportato in allegato al presente capitolo



ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

CONSIDERAZIONI GENERALI

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implicino procedure specifiche di emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro. Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

I lavoratori incaricati per l'emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di protezione e degli strumenti idonei al pronto intervento e saranno addestrati in modo specifico in base al tipo di emergenza.

Presso l'ufficio di cantiere devono essere messi in evidenza i numeri telefonici che si riferiscono ai presidi sanitari e d'emergenza più vicini.

COMPITI E PROCEDURE GENERALI

1. Il capo cantiere e l'incaricato che dovrà dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.
2. Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi;
3. Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (normalmente ingresso cantiere);
4. Il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

PROCEDURE PER L'EMERGENZA ANTINCENDIO

L'impresa appaltatrice è tenuta a predisporre un piano di intervento con precise indicazioni operative sulle procedure da seguire in caso di incendio e alla designazione e formazione degli addetti al servizio antincendio.

Il piano e le procedure di emergenza di cantiere dovranno far parte del Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa.

Le procedure di emergenza dovranno essere esposte in corrispondenza dei baraccamenti ovvero in luogo di facile consultazione, mediante cartello ove dovranno essere riportati i numeri telefonici del più vicino Comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza. Nell'area di cantiere e indispensabile la presenza di un telefono o in alternativa di un cellulare per consentire la chiamata dei soccorsi esterni.

Prima dell'inizio dei lavori, il Responsabile di cantiere di ogni impresa appaltatrice, dovrà comunicare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, i nominativi delle persone addette alla gestione dell'emergenza incendio; contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste persone.

E' necessario comunque che in cantiere sia presente almeno un lavoratore adeguatamente formato per gli interventi di spegnimento incendi ed evacuazione del cantiere. Tutti gli operatori presenti dovranno essere preventivamente informati e formati. Al fine di evitare l'insorgere e il principio di incendio, devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei, in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati. Detti mezzi (estintori) devono essere di tipo approvato secondo il D.M. 20/12/1982 ed identificati da un'etichetta indicante le caratteristiche principali dell'apparecchio ai fini

dell'impiego e dell'identificazione. Su ogni estintore dovrà essere indicata la data della verifica semestrale. In caso di emergenza tutti i lavoratori devono:

- ☐ Interrompere tutti i lavori;
- ☐ Chiamare i Vigili del fuoco (115)
- ☐ Mettere in sicurezza le attrezzature;
- ☐ Portarsi al suolo, qualora in quota, scendendo ordinatamente dalle scale;
- ☐ Sgomberare immediatamente le strade;
- ☐ Tenersi lontano dalla zona interessata dall'emergenza e rimuovere i mezzi che possono intralciare le operazioni;
- ☐ Fermarsi o portarsi nei luoghi sicuri.

Le attività previste in intervento non presentano un rischio incendio specifico.

Per le sostanze infiammabili eventualmente presenti in cantiere, verranno adottate adeguate misure di prevenzione.

In particolare non verranno eseguiti lavori suscettibili di innescare incendi o esplosioni e gli addetti, nel maneggiare tali sostanze, indosseranno indumenti atti a impedire l'accumulo elettrostatico. Nel cantiere saranno installati idonei estintori, in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati. Detti mezzi (estintori) devono essere di tipo approvato secondo il D.M. 20/12/1982 ed identificati da un'etichetta indicante le caratteristiche principali dell'apparecchio ai fini

dell'impiego e dell'identificazione. Su ogni estintore dovrà essere indicata la data della verifica semestrale. Saranno inoltre installati cartelli avvisatori del pericolo.

I carburanti, i combustibili e liquidi che presentano in varia misura pericolo di incendio ed anche di esplosione a causa dei vapori infiammabili da essi emessi, i solventi e le vernici vanno conservati lontano dai locali di servizio e di lavoro e dai materiali combustibili. I depositi devono essere protetti contro gli agenti atmosferici mediante tettoia in materiale non combustibile e provvisti di idonea messa a terra. I depositi devono portare la chiara indicazione dei prodotti contenuti e del quantitativo massimo previsto. In tutti i casi e comunque indispensabile installare estintori in numero sufficiente ed

opportunamente dislocati di "tipo approvato" dal ministero dell'interno per classi A-B-C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica che dovranno essere posizionati in luoghi conosciuto da tutti e facilmente accessibile e dovranno essere segnalati conformemente a quanto previsto.

Nei depositi e durante il rifornimento non si devono avvicinare fiamme, ne fumare, ne tenere motori accesi, ne usare lampade portatili o apparecchi elettrici se non quelli appositamente predisposti, che possiedono i necessari dispositivi di sicurezza. Anche nel maneggio di piccole quantità di carburante e benzina (per esempio, nei travasi dai

fusti o latte ai piccoli recipienti per il trasporto a mano o da questi ai serbatoi delle macchine) e elevato il pericolo di esplosione o d'incendio per lo sviluppo inevitabile di vapori, pertanto deve essere rigorosamente osservato il divieto di fumare o usare fiamme libere. Gli stracci imbevuti di carburante o grassi possono incendiarsi da se, pertanto vanno raccolti in recipienti metallici chiusi.

Della scelta, della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si fara carico ciascuna impresa appaltatrice per le parti di sua competenza.

NORME GENERALI DI PRONTO SOCCORSO

Prima dell'inizio dei lavori il Responsabile di cantiere di ogni impresa appaltatrice/esecutrice, dovra comunicare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, i nominativi delle persone addette al primo soccorso e alla gestione delle emergenze; contestualmente dovra essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste persone.

In apposito allegato del Piano Operativo di Sicurezza (POS redatto dall'Impresa) dovra essere conservata la relativa documentazione comprovante che i lavoratori designati abbiano frequentato un apposito corso di formazione.

Per il primo soccorso, nel caso di modesti infortuni, il personale deve essere dotato della cassetta di pronto soccorso per la conservazione dei prodotti medicinali. (D.M. 28/5/58 e var.)

Questa sara collocata almeno presso le seguenti zone:

☐ Ufficio (che copre anche le altre zone logistiche del cantiere, quali: Spogliatoio; Locale adibito a Mensa; Area adibita alle lavorazioni fuori opera; ecc.);

☐ Aree impegnate progressivamente nei lavori, se distano eccessivamente dal cantiere logistico.

Al verificarsi di un infortunio sul lavoro, adottati i provvedimenti del caso, i lavoratori infortunati o gli altri lavoratori presenti, devono informare tempestivamente il Responsabile di Cantiere e effettuare la seguente procedura:

1. RAGGIUNGERE UN TELEFONO

2. COMUNICARE ALLA CENTRALE DI SOCCORSO SANITARIO:

☐ Cosa è successo (malore, incidente, infortunio, incendio.....)

☐ Dove è avvenuto l'evento

☐ Quanti sono i feriti

☐ Il numero telefonico da cui si chiama

Fermo restando l'obbligo dell'impresa esecutrice affinche ad ogni infortunato vengano prestati i dovuti soccorsi, questa dovra dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al Coordinatore in fase di esecuzione di ogni infortunio con prognosi superiore ad un giorno.

Per il suddetto adempimento nei confronti del Coordinatore in fase di esecuzione, l'impresa appaltatrice inviera una copia della denuncia infortuni (mod. INAIL).

Rimane comunque a carico dell'impresa l'espletamento delle formalita amministrative presso le autorità competenti nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Anche nel caso in cui si verifichino eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma solo a cose, ciascuna impresa deve dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO

Poiche nelle emergenze e essenziale non perdere tempo, e fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

1. garantire l'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici;
2. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente (indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento);
3. cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un'idea abbastanza chiara di quanto e accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti eventuali;
4. in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;
5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;
6. prepararsi a riferire con esattezza quanto e accaduto, e le attuali condizioni dei feriti;
7. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

INFINE SI RICORDA CHE NESSUNO E OBBLIGATO PER LEGGE A METTERE A REPENTAGLIO LA PROPRIA INCOLUMITA PER PORTARE SOCCORSO E NON SI DEVE AGGRAVARE LA SITUAZIONE CON MANOVRE O COMPORTAMENTI SCORRETTI.

PROCEDURE DI PRIMA ASSISTENZA INFORTUNI

1. Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;
2. evitare di diventare una seconda vittima : se attorno all'infortunato c'e pericolo (di scarica elettrica, esalazioni gassose, etc.) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;
3. spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c'e pericolo imminente o continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;
4. accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale, etc.), regione corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);
5. accertarsi delle cause : causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta, etc.), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione, etc.);
6. porre nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure;
7. rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia;
8. conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o di disagio che possono derivare da essi.

NUMERI UTILI DI EMERGENZA E PRONTO INTERVENTO

Per poter affrontare rapidamente situazioni di emergenza, dai luoghi di lavoro sono raggiungibili posti pubblici permanenti di pronto soccorso e intervento.

E' necessario pertanto disporre, in cantiere, di una serie di recapiti telefonici utili, che sono stati raccolti nella seguente tabella, la quale dovrà essere sarà ubicata in modo visibile presso l'ufficio di cantiere, per un loro tempestivo utilizzo in caso di necessità.

PER OGNI TIPO DI EMERGENZA Tel. 118

GUARDIA MEDICA - 07029 Tempio Pausania (OT) Via Grazia Deledda tel: 079 631477

EMERGENZA SICUREZZA

VIGILI DEL FUOCO - Soccorso Tel. 115

VIGILI DEL FUOCO- 07029 Tempio Pausania (OT) 11, Via De Nicola Enrico tel: 079 631283

CARABINIERI - Pronto Intervento Tel. 112

CARABINIERI-07014 07029 Tempio Pausania (OT) 37, Viale Sturzo Don tel: 079 631107, 079 631367

POLIZIA DI STATO - Soccorso Pubblico Tel. 113

POLIZIA DI STATO - 07029 Tempio Pausania (OT) 5, Via Demuro B. tel: 079 6725000

EMERGENZA AMBIENTALE

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE. 07014 07029 Tempio Pausania (OT) 18, Via S. Lorenzo tel: 079 671355

SEGNALAZIONE GUASTI

ABBANOVA - Gestore Servizio Idrico Uffici 07029 Tempio Pausania (OT) 8, V. Belluno tel: 0789 648080, 079 632179

ENEL DISTRIBUZIONE Tel. 800 900 800

SOGGETTI COINVOLTI

AREA - Direzione Generale, Via Cesare Battisti, 6 - CAGLIARI Servizio Edilizia Tel. 070.27.00.71

AREA - DISTRETTO DI SASSARI -Via A. Cervi 12 Tel. 079 221200

DIRETTORE DEI LAVORI E COORD. SICUR. IN FASE ESECUTIVA Tel.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Tel.

DIRETTORE OPERATIVO

IMPRESA ESECUTRICE Tel.

(Da fotocopiare, implementare ed appendere nei pressi del telefono di cantiere)

I suddetti numeri di telefono ed indirizzi saranno custoditi dai lavoratori e ove possibile esposti in modo visibile, presso il

luogo di lavoro, per un loro tempestivo utilizzo in caso di necessità.



CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:

Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi (Probabilità ed entità del danno, valutazione dell'esposizione al rumore e alle vibrazioni);

Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;

si allegano, altresì:

- Tavole esplicative di progetto;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi).

INDICE

| | | |
|---|------|--------------------|
| Lavoro | pag. | 3 |
| Committenti | pag. | 4 |
| Responsabili | pag. | 5 |
| Imprese e lavoratori autonomi | pag. | 6 |
| Documentazione | pag. | 7 |
| Descrizione del contesto in cui si trova l'area del cantiere..... | pag. | 9 |
| Descrizione sintetica dell'opera | pag. | 10 |
| Area del cantiere | pag. | 12 |
| Caratteristiche area del cantiere | pag. | 12 |
| Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere | pag. | 12 |
| Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante | pag. | 12 |
| Descrizione caratteristiche idrogeologiche | pag. | 14 |
| Organizzazione del cantiere..... | pag. | 19 |
| Segnaletica | pag. | 25 |
| Lavorazioni e loro interferenze | pag. | 26 |
| • 20 Alloggi via pertini tempio | pag. | 26 |
| • Edificio a | pag. | 28 |
| • Allestimento del cantiere..... | pag. | 28 |
| • Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | pag. | 28 |
| • Realizzazione della viabilità del cantiere | pag. | 29 |
| • Allestimento di servizi igienico del cantiere..... | pag. | 29 |
| • Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | pag. | 29 |
| • Realizzazione di impianto elettrico del cantiere | pag. | 30 |
| • Realizzazione di impianto idrico del cantiere | pag. | 31 |
| • Montaggio della gru a torre..... | pag. | 31 |
| • Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere | pag. | 32 |
| • Scavi e rinterri..... | pag. | 33 |
| • Scavo di sbancamento | pag. | 33 |
| • Realizzazione di transenne di delimitazione scavi..... | pag. | 33 |
| • Strutture di fondazioni in c.a. | pag. | 34 |
| • Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione | pag. | 34 |
| • Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione..... | pag. | 35 |
| • Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione..... | pag. | 36 |
| • Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato | pag. | 36 |
| • Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato | pag. | 37 |
| • Strutture in elevazione in c.a. | pag. | 38 |
| • Rinterro di scavo | pag. | 38 |
| • Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso..... | pag. | 38 |
| • Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione..... | pag. | 39 |
| • Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione | pag. | 40 |
| • Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione | pag. | 40 |
| • Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato | pag. | 41 |
| • Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato | pag. | 42 |
| • Chiusure e divisori | pag. | 42 |
| • Realizzazione di tompagnature | pag. | 42 |
| • Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali | pag. | 43 |
| • Realizzazione di divisori interni | pag. | 44 |
| • Coperture ,terrazzi ecc..... | pag. | 44 |
| • Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate..... | pag. | 44 |
| • Formazione di massetto per coperture | pag. | 45 |
| • Impermeabilizzazione di coperture | pag. | 46 |
| • Protezione guaine coperture piane | pag. | 46 |
| • Realizzazione di opere di lattoneria..... | pag. | 47 |
| • Impianti | pag. | 48 |
| • Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas..... | pag. | 48 |
| • Realizzazione di impianto termico (autonomo)..... | pag. | 49 |
| • Realizzazione di impianto elettrico interno..... | pag. | 49 |

| | |
|---|-------------------------|
| • Realizzazione di impianto radiotelevisivo | pag. 50 |
| • Realizzazione di impianto telefonico e citofonico | pag. 51 |
| • Realizzazione di impianto ascensore | pag. 51 |
| • Finiture esterne | pag. 52 |
| • Formazione intonaci esterni (industrializzati) | pag. 52 |
| • Finiture interne..... | pag. 53 |
| • Formazione intonaci interni (tradizionali)..... | pag. 53 |
| • Posa di rivestimenti interni | pag. 54 |
| • Pavimenti..... | pag. 54 |
| • Formazione di massetto per pavimenti interni | pag. 54 |
| • Posa di pavimenti per interni..... | pag. 55 |
| • Tinteggiature | pag. 56 |
| • Tinteggiatura di superfici esterne | pag. 56 |
| • Tinteggiatura di superfici interne | pag. 56 |
| • Posa in opera di serramenti e ringhiere..... | pag. 57 |
| • Posa di serramenti interni | pag. 57 |
| • Posa di serramenti esterni..... | pag. 58 |
| • Posa di ringhiere e parapetti | pag. 58 |
| • Fine cantiere | pag. 59 |
| • Smontaggio della gru a torre..... | pag. 59 |
| • Smobilizzo del cantiere | pag. 60 |
| • Edificio b..... | pag. 61 |
| • Allestimento del cantiere | pag. 61 |
| • Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | pag. 61 |
| • Realizzazione della viabilità del cantiere | pag. 62 |
| • Allestimento di servizi igienico del cantiere..... | pag. 62 |
| • Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | pag. 63 |
| • Realizzazione di impianto elettrico del cantiere..... | pag. 63 |
| • Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere | pag. 64 |
| • Montaggio della gru a torre..... | pag. 65 |
| • Realizzazione di impianto idrico del cantiere..... | pag. 65 |
| • Scavi e rinterri..... | pag. 66 |
| • Scavo di sbancamento | pag. 66 |
| • Realizzazione di transenne di delimitazione scavi..... | pag. 67 |
| • Strutture di fondazioni in c.a. | pag. 67 |
| • Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione | pag. 67 |
| • Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione..... | pag. 68 |
| • Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione..... | pag. 69 |
| • Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato | pag. 70 |
| • Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato..... | pag. 70 |
| • Strutture in elevazione in c.a. | pag. 71 |
| • Rinterro di scavo | pag. 71 |
| • Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso..... | pag. 71 |
| • Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione..... | pag. 72 |
| • Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione | pag. 73 |
| • Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione | pag. 74 |
| • Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato | pag. 74 |
| • Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato..... | pag. 75 |
| • Chiusure e divisorii | pag. 75 |
| • Realizzazione di tompagnature | pag. 75 |
| • Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali..... | pag. 76 |
| • Realizzazione di divisorii interni | pag. 77 |
| • Coperture ,terrazzi ecc..... | pag. 77 |
| • Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate..... | pag. 77 |
| • Formazione di massetto per coperture | pag. 78 |
| • Impermeabilizzazione di coperture | pag. 78 |
| • Protezione guaine coperture piane | pag. 79 |
| • Realizzazione di opere di lattoneria..... | pag. 79 |
| • Impianti | pag. 79 |
| • Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas | pag. 79 |

| | | |
|--|------|---------------------|
| • Realizzazione di impianto termico (autonomo)..... | pag. | 80 |
| • Realizzazione di impianto elettrico interno..... | pag. | 80 |
| • Realizzazione di impianto radiotelevisivo | pag. | 81 |
| • Realizzazione di impianto telefonico e citofonico | pag. | 81 |
| • Finiture esterne | pag. | 82 |
| • Formazione intonaci esterni (industrializzati) | pag. | 82 |
| • Finiture interne..... | pag. | 83 |
| • Formazione intonaci interni (tradizionali)..... | pag. | 83 |
| • Posa di rivestimenti interni | pag. | 83 |
| • Pavimenti..... | pag. | 84 |
| • Formazione di massetto per pavimenti interni | pag. | 84 |
| • Posa di pavimenti per interni..... | pag. | 84 |
| • Tinteggiature | pag. | 84 |
| • Tinteggiatura di superfici esterne | pag. | 84 |
| • Tinteggiatura di superfici interne | pag. | 85 |
| • Posa in opera di serramenti e ringhiere..... | pag. | 86 |
| • Posa di serramenti interni | pag. | 86 |
| • Posa di serramenti esterni..... | pag. | 86 |
| • Posa di ringhiere e parapetti | pag. | 87 |
| • Fine cantiere | pag. | 88 |
| • Smontaggio della gru a torre..... | pag. | 88 |
| • Smobilizzo del cantiere | pag. | 89 |
| Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive. | pag. | 90 |
| Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni | pag. | 109 |
| Macchine utilizzate nelle lavorazioni | pag. | 125 |
| Emissione sonora attrezzature e macchine | pag. | 140 |
| Coordinamento delle lavorazioni e fasi | pag. | 143 |
| Coordinamento utilizzo parti comuni | pag. | 144 |
| Modalità della cooperazione fra le imprese | pag. | 146 |
| Organizzazione emergenze..... | pag. | 148 |
| Conclusioni generali..... | pag. | 152 |

TEMPIO, marzo /2011

il Tecnico

ALLEGATO "B"

Comune di TEMPIO

Provincia di SS

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

**Probabilità ed entità del danno, valutazione
dell'esposizione al rumore e alle vibrazioni**

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: COSTRUZIONE DI N. 20 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI TEMPIO IN
LOC CUNCCHEDDA

COMMITTENTE: A.R.E.A. Azienda regionale Edilizia Abitativa - Distretto di Sassari

CANTIERE: VIA PERTINI, TEMPIO (SS)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Geometra Pazzola Giuliano)

IL COMMITTENTE

(PRESIDENTE _____)

Geometra Pazzola Giuliano
via A. Cervi 12 07100 Sassari (SS) 079 221200
giulio.pazzola@area.sardegna.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

Per ogni lavoratore vengono individuati i relativi pericoli connessi con le lavorazioni stesse, le attrezzature impiegate e le eventuali sostanze utilizzate.

I rischi sono stati analizzati in riferimento ai pericoli correlati alle diverse attività, alla gravità del danno, alla probabilità di accadimento ed alle norme di legge e di buona tecnica.

La stima del rischio, necessaria per definire le priorità negli interventi correttivi, è stata effettuata tenendo conto di:

1) Entità del danno [E], funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base a eventuali conoscenze statistiche o a previsioni ipotizzabili. Il valore numerico riportato nelle valutazioni è il seguente: [E1]=1 (lieve); [E2]=2 (serio); [E3]=3 (grave); [E4]=4 (gravissimo);

2) Probabilità di accadimento [P], funzione delle condizioni di sicurezza legate principalmente a valutazioni sullo stato di fatto tecnico. Il valore numerico riportato nelle valutazioni è il seguente: [P1]=1 (bassissima); [P2]=2 (bassa); [P3]=3 (media); [P4]=4 (alta).

Il valore numerico della valutazione del rischio riportato nelle valutazioni è dato dal prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] e può assumere valori compresi da 1 a 16.

ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Probabilità per entità del danno

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | - AREA DEL CANTIERE - | |
| | ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE | |
| | Recinzioni di cantiere | |
| O R R S R S O | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E1 * P1 = 1 |
| | Betoniere | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|--|---------------------------------|
| R R S R S R S R S O R R S R S R S O R R S R S R S O R R S R S R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Elettrocuzione | E1 * P1 = 1 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E1 * P1 = 1 |
| | Dislocazione delle zone di carico e scarico | |
| | Caduta di materiali dall'alto o a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E1 * P1 = 1 |
| | Gru | |
| | Caduta di materiali dall'alto o a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Elettrocuzione | E1 * P1 = 1 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E1 * P1 = 1 |
| | Viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici | |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Investimento, ribaltamento | E1 * P1 = 1 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Seppellimento, sprofondamento | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E1 * P1 = 1 |
| | - LAVORAZIONI E FASI - | |
| L F L F L F | 20 ALLOGGI VIA PERTINI TEMPIO | |
| | EDIFICIO A (fase) | |
| | Allestimento del cantiere (sottofase) | |
| L F | Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 6.75 uomini al giorno, per max. ore complessive 54.00) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [74.70 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [11.40 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [33.60 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [17.28 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [10.50 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [5.10 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S R S M A R S R S R S | Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (Max. ore 54.00) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Scala semplice | |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P3 = 6 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Dumper (Max. ore 54.00) | |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|---|---------------------------------|
| S R S R S R S R S V A T R S S R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Operatore dumper" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| | Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] | E2 * P3 = 6 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Realizzazione della viabilità del cantiere (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.50 uomini al giorno, per max. ore complessive 20.00) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [22.00 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [2.40 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [21.92 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [1.92 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [4.80 ore] | |
| L V R S R M A R S R S R S R S R S V M A R S R S R S R S V A T R S R S | Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere (Max. ore 20.00) | |
| | Rumore per "Operaio polivalente" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| | Autocarro (Max. ore 20.00) | |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Operatore autocarro" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| | Pala meccanica (Max. ore 20.00) | |
| | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Rumore per "Operatore pala meccanica" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| | Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] | E2 * P3 = 6 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Allestimento di servizi igienico del cantiere (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.81 uomini al giorno, per max. ore complessive 22.50) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [10.50 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [3.25 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [8.00 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [0.63 ore] | |
| L | Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (Max. ore 22.50) | |

[illegible]

[illegible]

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| R S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| R S S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R S | Rumore per "Operatore escavatore" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S V | Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] | E2 * P3 = 6 |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E1 * P1 = 1 |
| L F | Montaggio della gru a torre (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 32.00) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [50.40 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [2.80 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [2.40 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [36.92 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [9.00 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [22.80 ore] | |
| L V | Addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre (Max. ore 32.00) | |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S M | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| A | Autocarro (Max. ore 32.00) | |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R S | Incendi, esplosioni | E3 * P1 = 3 |
| R S | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R | Rumore per "Operatore autocarro" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S V | Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| M | Autogrù (Max. ore 32.00) | |
| R S | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R S | Incendi, esplosioni | E3 * P1 = 3 |
| R S | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| R S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S | Rumore per "Operatore autogrù" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S | Vibrazioni per "Operatore autogrù" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| V A | Attrezzi manuali | |
| T R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.88 uomini al giorno, per max. ore complessive 7.01) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [3.82 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [3.52 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [3.96 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [3.85 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [4.84 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [1.32 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [0.33 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [3.52 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [9.68 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [2.64 ore] | |
| L V | Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (Max. ore 7.01) | |
| A | Attrezzi manuali | |
| T R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A | Scala doppia | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A | Trapano elettrico | |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P3 = 9 |
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P3 = 9 |
| R S | Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| R S | Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non presente"] | E2 * P3 = 6 |
| V M | Escavatore (Max. ore 7.01) | |
| A | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R S | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |

[illegible]

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|--|---|------------------------------|
| R S M A R S R S R S R S R V A T R S S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Pala meccanica (Max. ore 32.34) | |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Rumore per "Operatore pala meccanica" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| | Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] | E2 * P3 = 6 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Realizzazione di transeene di delimitazione scavi (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.88 uomini al giorno, per max. ore complessive 7.00) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [5.90 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [7.45 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Basso = [3.00 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [0.48 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [1.40 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [0.85 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S R S R S R S R S R S R S L F | Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (Max. ore 7.00) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Sega circolare | |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| | Rumore per "Operaio polivalente" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| M A R S R S R S R S R S R S R S R S R S L F | Dumper (Max. ore 7.00) | |
| | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Operatore dumper" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| | Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] | E2 * P3 = 6 |
| | Strutture di fondazioni in c.a. (sottofase) | |
| L F | Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 5.77 uomini al giorno, per max. ore complessive 46.20) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [23.10 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [71.61 ore] | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| | Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [43.89 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [92.40 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [23.10 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [43.89 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [41.58 ore] | |
| L V | Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (Max. ore 46.20) | |
| A | Attrezzi manuali | |
| T | | |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R | | |
| A | Scala semplice | |
| T | | |
| R | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| S | | |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A | | |
| T | Sega circolare | |
| R | | |
| S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R | | |
| S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R | | |
| S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| R | | |
| S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R | | |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R | | |
| S | Rumore per "Carpentiere" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P3 = 9 |
| R | | |
| L | Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.85 uomini al giorno, per max. ore complessive 30.80) | |
| F | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [43.00 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [2.25 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [54.02 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [17.89 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [11.37 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [14.22 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [0.83 ore] | |
| L | Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (Max. ore 30.80) | |
| V | | |
| A | Attrezzi manuali | |
| T | | |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| S | | |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| A | | |
| T | Trancia-piegaferri | |
| R | | |
| S | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P2 = 4 |
| R | | |
| S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R | | |
| S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R | | |
| S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| R | | |
| S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R | | |
| S | Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R | | |
| M | | |
| A | Gru a torre (Max. ore 30.80) | |
| R | | |
| S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R | | |
| S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R | | |
| S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R | | |
| S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R | | |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|--|---|------------------------------|
| S R S R A T R S R S | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| L F | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.54 uomini al giorno, per max. ore complessive 12.32) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [9.16 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [7.29 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [4.54 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Basso = [7.70 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [19.49 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [6.47 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S A T R S R S M A R S R S R S V A T R S R S M A R S R S R S R | Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (Max. ore 12.32) | |
| | Andatoie e Passerelle | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Vibratore elettrico per calcestruzzo | |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Rumore per "Carpentiere" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P3 = 9 |
| | Autobetoniera (Max. ore 12.32) | |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Rumore per "Operatore autobetoniera" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| | Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Autopompa per cls (Max. ore 12.32) | |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Getti, schizzi | E1 * P1 = 1 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|--|--|------------------------------|
| R S V A T R S R S | Vibrazioni per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P2 = 4 |
| L F | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.84 uomini al giorno, per max. ore complessive 22.69) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [31.69 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [1.66 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Medio = [51.33 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [24.70 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Basso = [8.38 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [10.47 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Basso = [12.13 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Medio = [19.90 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S A T R S R S R S M A R S R S R S R S R S A T R S R S | Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (Max. ore 22.69) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Scala semplice | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Trancia-piegaferri | |
| | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P2 = 4 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| | Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Gru a torre (Max. ore 22.69) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 7.98 uomini al giorno, per max. ore complessive 63.83) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [67.98 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [127.18 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Medio = [43.80 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [59.57 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Basso = [108.72 ore] | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [50.48 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [131.86 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [41.50 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [43.80 ore] | |
| L V | Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (Max. ore 63.83) | |
| A | Attrezzi manuali | |
| T | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| S | Ponteggio metallico fisso | |
| S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| A | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| T | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R | Scala doppia | |
| S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| S | Sega circolare | |
| A | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| T | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R | Rumore per "Carpentiere" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P3 = 9 |
| M | Autobetoniera (Max. ore 63.83) | |
| A | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| S | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P2 = 4 |
| S | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R | Rumore per "Operatore autobetoniera" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| S | Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| V | Attrezzi manuali | |
| A | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| T | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R | Autopompa per cls (Max. ore 63.83) | |
| S | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|---|------------------------------|
| S R S R S R S R S R S R S R S R S V A T R S R S M A R S R S R S R S R A T R S R S L F | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Getti, schizzi | E1 * P1 = 1 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Vibrazioni per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P2 = 4 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Gru a torre (Max. ore 63.83) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Strutture in elevazione in c.a. (sottofase) | |
| L F | Rinterro di scavo (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 6.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 48.00) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [20.80 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [30.40 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [49.60 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [7.68 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [40.00 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [30.40 ore] | |
| L V A T R S R S R S M A R S R S R R | Addetto al rinterro di scavo (Max. ore 48.00) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| | Seppellimento, sprofondamento | E3 * P2 = 6 |
| | Pala meccanica (Max. ore 48.00) | |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Rumore per "Operatore pala meccanica" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| | Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e | E2 * P3 = 6 |

[illegible]

[illegible]

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R S | Rumore per "Carpentiere" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P3 = 9 |
| M A | Gru a torre (Max. ore 4.18) | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.43 uomini al giorno, per max. ore complessive 35.43) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [57.08 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [2.99 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [92.46 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [44.50 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [15.10 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [18.87 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [21.86 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [35.85 ore] | |
| L V | Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (Max. ore 35.43) | |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| A T | Scala semplice | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| A T | Trancia-piegaferri | |
| R S | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P2 = 4 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| R S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S | Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| M | Gru a torre (Max. ore 35.43) | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|--|---|------------------------------|
| A R S R S R S R S R S R A T R S R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.56 uomini al giorno, per max. ore complessive 4.47) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [9.81 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [15.51 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [7.60 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [4.78 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Basso = [15.94 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [26.90 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Basso = [22.80 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [7.20 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [7.60 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S A T R S R S R S A T R S R S M A R S R S R S | Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (Max. ore 4.47) | |
| | Andatoie e Passerelle | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Ponteggio metallico fisso | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Scala semplice | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Vibratore elettrico per calcestruzzo | |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| | Rumore per "Carpentiere" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P3 = 9 |
| | Autobetoniera (Max. ore 4.47) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R S R S | Rumore per "Operatore autobetoniera" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| R S V A T | Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| R S R | Attrezzi manuali | |
| R S R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S M A R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Autopompa per cls (Max. ore 4.47) | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S R | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S R S | Getti, schizzi | E1 * P1 = 1 |
| R S | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R S R R | Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S V A T | Vibrazioni per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P2 = 4 |
| R S | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.87 uomini al giorno, per max. ore complessive 14.97) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [26.40 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [1.38 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [42.77 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [20.59 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [6.98 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [8.73 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [10.11 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [16.58 ore] | |
| L V A T | Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (Max. ore 14.97) | |
| R S R | Attrezzi manuali | |
| R S A T | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S | Scala semplice | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| R S A T | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S | Trancia-piegaferri | |
| R S | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P2 = 4 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| R S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S | Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiole" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R M A | Gru a torre (Max. ore 14.97) | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R A T | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.55 uomini al giorno, per max. ore complessive 28.37) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [67.98 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [127.18 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [43.80 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [59.57 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [108.72 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [50.48 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [131.86 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [41.50 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [43.80 ore] | |
| L V | Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (Max. ore 28.37) | |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A T | Ponteggio metallico fisso | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| A T | Scala doppia | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A T | Sega circolare | |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|--|------------------------------|
| R | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R | Rumore per "Carpentiere" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P3 = 9 |
| M | Autobetoniera (Max. ore 28.37) | |
| A | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P2 = 4 |
| S | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| V | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| A | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| T | Rumore per "Operatore autobetoniera" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| R | Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| S | Attrezzi manuali | |
| V | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| A | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| T | Autopompa per cls (Max. ore 28.37) | |
| R | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R | Getti, schizzi | E1 * P1 = 1 |
| S | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| S | Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R | Vibrazioni per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P2 = 4 |
| S | Attrezzi manuali | |
| V | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| A | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| T | Gru a torre (Max. ore 28.37) | |
| R | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| S | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|---|---------------------------------|
| A T T R I B U T I V I | Attrezzi manuali | |
| R I S C H I O | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| S I G N A L I | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L E V E L L I | Chiusure e divisori (sottofase) Realizzazione di tompagnature (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 6.25 uomini al giorno, per max. ore complessive 50.02) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [17.66 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [72.00 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [53.12 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [15.93 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [53.12 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Alta = [41.32 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [5.21 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [222.86 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [4.72 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [56.07 ore] | |
| L I V E L L I | Addetto alla realizzazione di tompagnature (Max. ore 50.02) | |
| A T T R I B U T I V I | Attrezzi manuali | |
| R I S C H I O | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| S I G N A L I | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| L E V E L L I | Betoniera a bicchiere | |
| A T T R I B U T I V I | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| R I S C H I O | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| S I G N A L I | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| L E V E L L I | Getti, schizzi | E1 * P1 = 1 |
| A T T R I B U T I V I | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| R I S C H I O | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P2 = 2 |
| S I G N A L I | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P4 = 8 |
| L E V E L L I | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| A T T R I B U T I V I | Ponteggio metallico fisso | |
| R I S C H I O | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| S I G N A L I | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| L E V E L L I | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| A T T R I B U T I V I | Ponte su cavalletti | |
| R I S C H I O | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P3 = 3 |
| S I G N A L I | Scala semplice | |
| L E V E L L I | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| A T T R I B U T I V I | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P4 = 8 |
| R I S C H I O | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| S I G N A L I | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| L E V E L L I | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| A T T R I B U T I V I | Rumore per "Operaio comune (murature)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| R I S C H I O | Gru a torre (Max. ore 50.02) | |
| S I G N A L I | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| L E V E L L I | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| A T T R I B U T I V I | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|--|---------------------------------|
| S R S R S R A T R S R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.17 uomini al giorno, per max. ore complessive 9.36) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [5.18 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [19.60 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [16.43 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [4.09 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [16.43 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Alta = [3.65 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [1.19 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [42.15 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [1.46 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S R S R S A T R S R S A T R S A T R S R S R M A | Addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali (Max. ore 9.36) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| | Betoniera a bicchiere | |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| | Getti, schizzi | E1 * P1 = 1 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P4 = 8 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| | Ponteggio metallico fisso | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Ponte su cavalletti | |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P3 = 3 |
| | Scala semplice | |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| | Taglierina elettrica | |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P2 = 2 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| | Rumore per "Operaio comune (murature)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| | Gru a torre (Max. ore 9.36) | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| A T R S S | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Realizzazione di divisori interni (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 20.98 uomini al giorno, per max. ore complessive 167.85) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [70.71 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [7.15 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [204.72 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [52.64 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [204.72 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Alta = [159.23 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [9.03 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [90.99 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [18.20 ore] | |
| L V | Addetto alla realizzazione di divisori interni (Max. ore 167.85) | |
| A T R S S | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| A T R S S | Betoniera a bicchiere | |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| | Getti, schizzi | E1 * P1 = 1 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P4 = 8 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| A T R S A | Ponte su cavalletti | |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P3 = 3 |
| A T R S S | Scala semplice | |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P4 = 8 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| R S R M A | Rumore per "Operaio comune (murature)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| A T | Gru a torre (Max. ore 167.85) | |
| | Carriola | |
| R S R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E1 * P1 = 1 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|--|--|---------------------------------|
| S R S R A T R S R S L F | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Copertur ,terrazzi ecc. (sottofase) | |
| L F | Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.60 uomini al giorno, per max. ore complessive 12.83) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [5.04 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [4.43 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [16.11 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [3.24 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [10.74 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Alta = [8.35 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [1.67 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [16.42 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [11.34 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [0.95 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [5.37 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S R S R S R S R S R S A T R S R S R S A T R S R S R S | Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate (Max. ore 12.83) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| | Betoniera a bicchiere | |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| | Getti, schizzi | E1 * P1 = 1 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P2 = 2 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P4 = 8 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| | Ponteggio metallico fisso | |
| | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P3 = 3 |
| | Ponte su cavalletti | |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P3 = 3 |
| | Scala semplice | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P4 = 8 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| | Taglierina elettrica | |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P2 = 2 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|--|------------------------------|
| R S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R S R | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| R S M | Rumore per "Operaio comune (murature)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| A | Gru a torre (Max. ore 12.83) | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R A T | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Formazione di massetto per coperture (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.06 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.47) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [36.98 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [1.63 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [17.86 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [6.49 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Basso = [0.60 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [14.01 ore] | |
| L V | Addetto alla formazione di massetto per coperture (Max. ore 16.47) | |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| A T | Impastatrice | |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R S R M | Rumore per "Pavimentista preparatore fondo" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| A | Gru a torre (Max. ore 16.47) | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|---|---------------------------------|
| A T T R I B U T I | Attrezzi manuali | |
| R I S C H I O | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| S I G N A L I | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L E G G E | Impermeabilizzazione di coperture (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 10.86 uomini al giorno, per max. ore complessive 86.91) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [2.47 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [164.11 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [197.42 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [82.56 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [158.80 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [1.29 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [39.00 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [81.54 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [158.80 ore] | |
| L I V E L L I | Addetto all'impermeabilizzazione di coperture (Max. ore 86.91) | |
| A T T R I B U T I | Attrezzi manuali | |
| R I S C H I O | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| S I G N A L I | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| L E G G E | Cannello a gas | |
| A T T R I B U T I | Inalazione fumi, gas, vapori | E1 * P2 = 2 |
| R I S C H I O | Incendi, esplosioni | E3 * P3 = 9 |
| S I G N A L I | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P2 = 2 |
| L E G G E | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| A T T R I B U T I | Ustioni | E1 * P3 = 3 |
| R I S C H I O | Ponteggio metallico fisso | |
| S I G N A L I | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| L E G G E | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| A T T R I B U T I | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P3 = 3 |
| R I S C H I O | Scala semplice | |
| S I G N A L I | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| L E G G E | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| A T T R I B U T I | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| R I S C H I O | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| S I G N A L I | Rumore per "Impermeabilizzatore" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E2 * P3 = 6 |
| L E G G E | Gru a torre (Max. ore 86.91) | |
| A T T R I B U T I | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R I S C H I O | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| S I G N A L I | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| L E G G E | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| A T T R I B U T I | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R I S C H I O | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| S I G N A L I | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| L E G G E | Attrezzi manuali | |
| A T T R I B U T I | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R I S C H I O | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| S | protezione guaine coperture piane (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.29 uomini al giorno, per max. ore complessive 34.35) | |
| L F | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [105.66 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [37.72 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [19.09 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [23.37 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [1.69 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [20.90 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [0.17 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [66.06 ore] | |
| L V | Addetto alla posa di strato drenante su coperture piane (Max. ore 34.35) | |
| A | Attrezzi manuali | |
| T | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| S | Ponteggio metallico fisso | |
| S | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| A | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E1 * P1 = 1 |
| T | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| R | Battipiastrille elettrico | |
| S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P3 = 6 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A | Taglierina elettrica | |
| R | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P2 = 2 |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| S | Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P2 = 4 |
| R | Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti" [HAV "Inferiore a 2,5 m/s²", WBV "Non presente"] | E2 * P2 = 4 |
| S V M | Gru a torre (Max. ore 34.35) | |
| A | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| A | Attrezzi manuali | |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Realizzazione di opere di lattoneria (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.96 uomini al giorno, per max. ore complessive 23.64) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [28.79 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [1.13 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [36.69 ore] | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [1.13 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [24.46 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [1.43 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [12.65 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [50.28 ore] | |
| L V | Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria (Max. ore 23.64) | |
| A | Attrezzi manuali | |
| T | | |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| R | | |
| A | Ponteggio metallico fisso | |
| T | | |
| R | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| S | | |
| R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| S | | |
| R | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P3 = 3 |
| A | | |
| T | Scala semplice | |
| R | | |
| S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R | | |
| S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| R | | |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| R | | |
| S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R | | |
| S | Rumore per "Lattoniere (tetto)" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| M | | |
| A | Gru a torre (Max. ore 23.64) | |
| R | | |
| S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R | | |
| S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R | | |
| S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R | | |
| S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R | | |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R | | |
| S | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R | | |
| A | | |
| T | Attrezzi manuali | |
| R | | |
| S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R | | |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L | | |
| F | Impianti (sottofase) | |
| | Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.73 uomini al giorno, per max. ore complessive 13.83) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [50.56 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [37.99 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [17.17 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [0.79 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [44.35 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [18.17 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [10.31 ore] | |
| L V | Addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas (Max. ore 13.83) | |
| A | Attrezzi manuali | |
| T | | |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| S | | |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A | | |
| T | Scala semplice | |
| R | | |
| S | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| R | | |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|--|---------------------------------|
| S R S A T R S R S R S R S R M A R S R S R S R S R S R S R A T R S R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Trapano elettrico | |
| | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| | Rumore per "Idraulico" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Gru a torre (Max. ore 13.83) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Realizzazione di impianto termico (autonomo) (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.65 uomini al giorno, per max. ore complessive 37.21) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [168.64 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [180.91 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [50.06 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [76.94 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [146.33 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [73.17 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [82.79 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [152.99 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S R S R S A T R S R S R S A T R S R S A T R | Addetto alla realizzazione di impianto termico (autonomo) (Max. ore 37.21) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Saldatrice elettrica | |
| | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| | Inalazione fumi, gas, vapori | E1 * P2 = 2 |
| | Incendi, esplosioni | E3 * P2 = 6 |
| | Radiazioni non ionizzanti | E1 * P3 = 3 |
| | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| | Scala semplice | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P3 = 6 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Trapano elettrico | |
| | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|--|---|---------------------------------|
| S R S R S R S R M A R S R S R S R S R S R A T R S R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| | Rumore per "Impiantista termico" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| | Gru a torre (Max. ore 37.21) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Realizzazione di impianto elettrico interno (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 11.46 uomini al giorno, per max. ore complessive 91.71) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [44.15 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [279.65 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [132.46 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [139.82 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [161.90 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [17.66 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [139.82 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [44.15 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [44.15 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S A T R S R S R S R S A T R S R S R S A T | Addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno (Max. ore 91.71) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Ponte su cavalletti | |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Scala doppia | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Scanalatrice per muri ed intonaci | |
| | Elettrocuzione | E3 * P3 = 9 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| | Ustioni | E1 * P3 = 3 |
| | Trapano elettrico | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| R S | Elettrocuzione | E3 * P3 = 9 |
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R S R S V | Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| | Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non presente"] | E2 * P3 = 6 |
| L F | Realizzazione di impianto radiotelevisivo (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.70 uomini al giorno, per max. ore complessive 5.60) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [3.60 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [22.80 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [10.80 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [11.40 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [24.60 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [1.44 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [11.40 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [22.80 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [3.60 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [3.60 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [11.40 ore] | |
| L V | Addetto alla realizzazione di impianto radiotelevisivo (Max. ore 5.60) | |
| A T R S | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| A T R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Ponteggio mobile o trabattello | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A T R S | Scala doppia | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A T R S | Scanalatrice per muri ed intonaci | |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P3 = 9 |
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| R S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S | Ustioni | E1 * P3 = 3 |
| A T R S | Trapano elettrico | |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P3 = 9 |
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R | Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |

[illegible]

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| | Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [0.12 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [1.14 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [3.85 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [0.30 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [0.30 ore] | |
| L V | Addetto alla realizzazione di impianto ascensore (Max. ore 1.16) | |
| A | Attrezzi manuali | |
| T | | |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R | | |
| A | Ponte su cavalletti | |
| T | | |
| R | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| S | | |
| A | Ponteggio mobile o trabattello | |
| T | | |
| R | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| S | | |
| R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| S | | |
| R | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P2 = 2 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A | | |
| T | Scala doppia | |
| R | | |
| S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R | | |
| S | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R | | |
| S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P2 = 2 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| S | | |
| A | Scala semplice | |
| T | | |
| R | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| S | | |
| R | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P2 = 2 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A | | |
| T | Scanalatrice per muri ed intonaci | |
| R | | |
| S | Elettrocuzione | E3 * P3 = 9 |
| R | | |
| S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| R | | |
| S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| S | | |
| R | Ustioni | E1 * P3 = 3 |
| S | | |
| A | Trapano elettrico | |
| T | | |
| R | Elettrocuzione | E3 * P3 = 9 |
| S | | |
| R | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| S | | |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| S | | |
| R | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| S | | |
| R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| R | | |
| S | Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| R | | |
| S | Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non presente"] | E2 * P3 = 6 |
| V | | |
| M | Gru a torre (Max. ore 1.16) | |
| A | | |
| R | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| S | | |
| R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S L | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| F | Finiture esterne (sottofase) | |
| L F | Formazione intonaci esterni (industrializzati) (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.65 uomini al giorno, per max. ore complessive 29.24) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [17.23 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [68.08 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [31.94 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [22.51 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [29.52 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [53.31 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [26.40 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [26.40 ore] | |
| L V | Addetto alla formazione intonaci esterni (industrializzati) (Max. ore 29.24) | |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S A | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| T | Intonacatrice | |
| R S | Getti, schizzi | E1 * P2 = 2 |
| R S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P2 = 2 |
| R S A | Scoppio | E3 * P1 = 3 |
| T | Ponteggio metallico fisso | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P4 = 12 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| R S A | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| T | Scala semplice | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| R S R | Rumore per "Riquadratore (intonaci industrializzati)" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P2 = 4 |
| R S V | Vibrazioni per "Riquadratore" [HAV "Inferiore a 2,5 m/s²", WBV "Non presente"] | E2 * P2 = 4 |
| M | Gru a torre (Max. ore 29.24) | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|--|------------------------------|
| S R S R A T R S R S L F | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Finiture interne (sottofase) | |
| | Formazione intonaci interni (tradizionali) (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 5.34 uomini al giorno, per max. ore complessive 42.71) | |
| | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [106.39 ore] | |
| | Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [24.33 ore] | |
| | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [52.76 ore] | |
| | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [37.04 ore] | |
| | Entità del Danno Grave/Probabilità Basso = [0.74 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S R S R S A T R S R S M A R S R S R S A T R S R S L | Addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali) (Max. ore 42.71) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Impastatrice | |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Ponte su cavalletti | |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Scala semplice | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Riquadratore (intonaci tradizionali)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Gru a torre (Max. ore 42.71) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Posa di rivestimenti interni (sottofase) | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| F | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.40 uomini al giorno, per max. ore complessive 3.17) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [5.29 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [5.17 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [3.48 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [1.85 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [3.50 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [0.03 ore] | |
| L V | Addetto alla posa di rivestimenti interni (Max. ore 3.17) | |
| A | Attrezzi manuali | |
| T | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| S | Ponte su cavalletti | |
| R | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| A | Scala semplice | |
| T | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P2 = 2 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R | Taglierina elettrica | |
| A | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| T | Inalazione polveri, fibre | E1 * P2 = 2 |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R | Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P2 = 4 |
| M | Gru a torre (Max. ore 3.17) | |
| A | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| S | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| A | Attrezzi manuali | |
| T | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| S | | |
| L | Pavimenti (sottofase) | |
| F | Formazione di massetto per pavimenti interni (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.61 uomini al giorno, per max. ore complessive 12.85) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [28.85 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [1.27 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [13.93 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [5.06 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [0.47 ore] | |
| L | Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni (Max. ore 12.85) | |
| V | Attrezzi manuali | |
| A | | |
| T | | |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| S | | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|---|------------------------------|
| R S A T | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R S R S | Impastatrice | |
| R S R S R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S R S R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S R S R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R S R S R S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S R S R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| R S R S R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R S R M A | Rumore per "Pavimentista preparatore fondo" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S R S R S | Gru a torre (Max. ore 12.85) | |
| R S R S R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S R S R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S R S R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S R S R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S R S R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R S R A T | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S R S R S | Attrezzi manuali | |
| R S R S R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| L F | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Posa di pavimenti per interni (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.45 uomini al giorno, per max. ore complessive 35.61) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [39.42 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [39.03 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [19.98 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [23.90 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [1.73 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [21.96 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [0.34 ore] | |
| L V A T | Addetto alla posa di pavimenti per interni (Max. ore 35.61) | |
| R S R S R S | Attrezzi manuali | |
| R S R S R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S R S R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R S R S | Battipiastrille elettrico | |
| R S R S R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S R S R S | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P3 = 6 |
| R S R S R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R S R S R S | Taglierina elettrica | |
| R S R S R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S R S R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P2 = 2 |
| R S R S R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| R S R S R S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R S R S R S | Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P2 = 4 |
| R S R S R S | Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti" [HAV "Inferiore a 2,5 m/s²", WBV "Non presente"] | E2 * P2 = 4 |

[illegible]

[illegible]

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|---|---------------------------------|
| R A T T S R S L F | | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Posa in opera di serramenti e ringhiere (sottofase) | |
| L F | Posa di serramenti interni (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.05 uomini al giorno, per max. ore complessive 24.37) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [0.52 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [46.09 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [69.03 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [22.94 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [0.27 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [0.08 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [22.94 ore] | |
| L V | Addetto alla posa di serramenti interni (Max. ore 24.37) | |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| A T R S | Ponte su cavalletti | |
| R S A T | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S | Scala semplice | |
| R S R S | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P3 = 6 |
| R S R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R M | Rumore per "Serramentista" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| A R S | Gru a torre (Max. ore 24.37) | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R A T | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Posa di serramenti esterni (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.78 uomini al giorno, per max. ore complessive 22.28) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [0.48 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [42.13 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [63.10 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [20.97 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [0.25 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [42.00 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [41.93 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [20.97 ore] | |
| L V | Addetto alla posa di serramenti esterni (Max. ore 22.28) | |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|---|--|
| S R S A T R S R S R S A T R S R S R S R S R M A R S R S R S R S R S R S R S R S R A T R S R S | Urti, colpi, impatti, compressioni Ponteggio metallico fisso Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a livello Scivolamenti, cadute a livello Scala semplice Caduta dall'alto Movimentazione manuale dei carichi Urti, colpi, impatti, compressioni Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a livello Rumore per "Serramentista" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] Gru a torre (Max. ore 22.28) Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a livello Elettrocuzione Irritazioni cutanee, reazioni allergiche Scivolamenti, cadute a livello Urti, colpi, impatti, compressioni Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] Attrezzi manuali Punture, tagli, abrasioni Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 E3 * P3 = 9 E3 * P2 = 6 E1 * P2 = 2 E3 * P3 = 9 E2 * P3 = 6 E2 * P1 = 2 E4 * P3 = 12 E3 * P2 = 6 E2 * P1 = 2 E3 * P2 = 6 E3 * P1 = 3 E3 * P1 = 3 E1 * P1 = 1 E1 * P2 = 2 E2 * P1 = 2 E1 * P1 = 1 E1 * P1 = 1 E2 * P1 = 2 |
| L F | Posa di ringhiere e parapetti (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.95 uomini al giorno, per max. ore complessive 39.57) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [199.72 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [128.72 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Medio = [30.38 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [7.21 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Basso = [60.75 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Medio = [30.38 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [39.49 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Basso = [124.16 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Medio = [121.50 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alto = [30.38 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S R S A T R | Addetto alla posa di ringhiere e parapetti (Max. ore 39.57) Attrezzi manuali Punture, tagli, abrasioni Urti, colpi, impatti, compressioni Ponteggio metallico fisso Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a livello Scivolamenti, cadute a livello Saldatrice elettrica Elettrocuzione | E1 * P2 = 2 E2 * P2 = 4 E3 * P3 = 9 E3 * P2 = 6 E1 * P2 = 2 E3 * P2 = 6 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|--|---|------------------------------|
| S R S R S R S A T R S R S R S A T R S R S R S R S A T R S R S R S R S M A R S R S R S R S R S R A T R S R S L F | Inalazione fumi, gas, vapori | E1 * P1 = 1 |
| | Incendi, esplosioni | E3 * P1 = 3 |
| | Radiazioni non ionizzanti | E1 * P3 = 3 |
| | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| | Scala semplice | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P3 = 6 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Smerigliatrice angolare (flessibile) | |
| | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| | Trapano elettrico | |
| | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P3 = 9 |
| | Rumore per "Fabbro" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| | Gru a torre (Max. ore 39.57) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | FINE CANTIERE (sottofase) | |
| L V A | smontaggio della gru a torre (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 8.00) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [12.60 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [0.70 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Medio = [0.60 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [9.23 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [2.25 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Basso = [5.70 ore] | |
| | Addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre (Max. ore 8.00) | |
| | Attrezzi manuali | |

[illegible]

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [1.15 ore] | |
| | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [3.47 ore] | |
| | Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [1.73 ore] | |
| L V | Addetto allo smobilizzo del cantiere (Max. ore 3.67) | |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A T | Ponteggio metallico fisso | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| A T | Scala doppia | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| R S | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P3 = 6 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A T | Trapano elettrico | |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| R S | Rumore per "Operaio polivalente" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| M A | Autocarro (Max. ore 3.67) | |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R S | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S | Rumore per "Operatore autocarro" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S | Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| V A T | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| M A | Autogrù (Max. ore 3.67) | |
| R S | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| R S | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R S R | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| R S R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S R | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R R | Rumore per "Operatore autogrù" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S V | Vibrazioni per "Operatore autogrù" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| A | Attrezzi manuali | |
| T | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | EDIFICIO B (fase) | |
| L F | Allestimento del cantiere (sottofase) | |
| | Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 6.75 uomini al giorno, per max. ore complessive 54.00) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [74.70 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [11.40 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [33.60 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [17.28 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [10.50 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [5.10 ore] | |
| L V | Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (Max. ore 54.00) | |
| A | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A | Scala semplice | |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P3 = 6 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| M | Dumper (Max. ore 54.00) | |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S | Rumore per "Operatore dumper" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| R S | Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] | E2 * P3 = 6 |
| V | Attrezzi manuali | |
| A | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Realizzazione della viabilità del cantiere (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.75 uomini al giorno, per max. ore complessive 30.00) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [33.00 ore] | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [3.60 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [32.88 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [2.88 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [7.20 ore] | |
| L V | Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere (Max. ore 30.00) | |
| R S R M A | Rumore per "Operaio polivalente" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| R S R S | Autocarro (Max. ore 30.00) | |
| R S R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R S R S | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R S R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| R S R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| R S R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R S | Rumore per "Operatore autocarro" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S V M A R S | Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| R S R S | Pala meccanica (Max. ore 30.00) | |
| R S R S | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R S R S | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R S R S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| R S R S | Rumore per "Operatore pala meccanica" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| R S V A T | Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] | E2 * P3 = 6 |
| R S R S | Attrezzi manuali | |
| R S R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | All'estensione di servizi igienico del cantiere (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.81 uomini al giorno, per max. ore complessive 22.50) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [10.50 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [3.25 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [8.00 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [0.63 ore] | |
| L V A T | Addetto all'all'estensione di servizi igienico-assistenziali del cantiere (Max. ore 22.50) | |
| R S R S | Attrezzi manuali | |
| R S M A R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S M A R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R S R S | Autogrù (Max. ore 22.50) | |
| R S R S | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R S R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R S | Rumore per "Operatore autogrù" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S V L F | Vibrazioni per "Operatore autogrù" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| | All'estensione di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (sottofase) | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.50 uomini al giorno, per max. ore complessive 20.00) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [18.80 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [2.80 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [26.00 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [11.20 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [4.80 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [2.60 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [15.20 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [4.80 ore] | |
| L V | Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (Max. ore 20.00) | |
| A | Attrezzi manuali | |
| T | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| S | Scala doppia | |
| A | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| T | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P3 = 6 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R | Trapano elettrico | |
| A | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| T | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| S | Rumore per "Operaio polivalente" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| R | Autogrù (Max. ore 20.00) | |
| M | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| A | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| S | Rumore per "Operatore autogrù" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R | Vibrazioni per "Operatore autogrù" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| S | Attrezzi manuali | |
| V | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| A | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| T | Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.75 uomini al giorno, per max. ore complessive 6.00) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [0.90 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [2.40 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [2.70 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [2.40 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [3.30 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [0.72 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [2.40 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [6.60 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [1.80 ore] | |
| R | Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere (Max. ore 6.00) | |
| S | | |

[illegible]

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|--|---------------------------------|
| S V M A R S R S R S R S R S R S V A T R S R S | "Non presente"] | |
| | Escavatore (Max. ore 11.00) | |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Operatore escavatore" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] | E2 * P3 = 6 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| L F | Urti, colpi, impatti, compressioni | E1 * P1 = 1 |
| | Montaggio della gru a torre (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 32.00) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [50.40 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [2.80 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [2.40 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [36.92 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [9.00 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [22.80 ore] | |
| | Adetto al montaggio e smontaggio della gru a torre (Max. ore 32.00) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Autocarro (Max. ore 32.00) | |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S R S R S R S R S R S R S R S R S V A T R S R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Incendi, esplosioni | E3 * P1 = 3 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Operatore autocarro" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| | Attrezzi manuali | |
| Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 | |
| M A R S R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Autogrù (Max. ore 32.00) | |
| | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R S S | Incendi, esplosioni | E3 * P1 = 3 |
| R S S | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R S S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| R S S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R | Rumore per "Operatore autogrù" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S V | Vibrazioni per "Operatore autogrù" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.01 uomini al giorno, per max. ore complessive 8.10) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [8.49 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [7.60 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [0.12 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [7.60 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [0.05 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [0.06 ore] | |
| L V A T | Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere (Max. ore 8.10) | |
| R S | Attrezzi manuali | |
| R S R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| R S R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R S M | Rumore per "Idraulico" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| A R S | Escavatore (Max. ore 8.10) | |
| R S | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R S R | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S R | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| R S R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R | Rumore per "Operatore escavatore" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S V | Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] | E2 * P3 = 6 |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E1 * P1 = 1 |
| L F | SCAVI E RINTERRI (sottofase) | |
| L F | Scavo di sbancamento (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.04 uomini al giorno, per max. ore complessive 32.34) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [52.81 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [16.01 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [34.16 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [6.07 ore] | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|---|---------------------------------|
| L V A T R S R S R S M A R S R S R S R S R S R S V A T R S R S M A R S R S R S V A T R S R S M A R S R S V A T R S | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [26.30 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [11.37 ore] | |
| | Addetto allo scavo di sbancamento (Max. ore 32.34) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| | Seppellimento, sprofondamento | E3 * P2 = 6 |
| | Autocarro (Max. ore 32.34) | |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Operatore autocarro" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Escavatore (Max. ore 32.34) | |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Operatore escavatore" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] | E2 * P3 = 6 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Pala meccanica (Max. ore 32.34) | |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Rumore per "Operatore pala meccanica" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| | Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] | E2 * P3 = 6 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---------------------------------|---|---------------------------------|
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Realizzazione di transenne di delimitazione scavi (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.88 uomini al giorno, per max. ore complessive 7.00) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [5.90 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [7.45 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [3.00 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [0.48 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [1.40 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [0.85 ore] | |
| L V A T | Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (Max. ore 7.00) | |
| R S | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S A T | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R S | Sega circolare | |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R S R M A R S | Rumore per "Operaio polivalente" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| R S | Dumper (Max. ore 7.00) | |
| R S | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R S V L F | Rumore per "Operatore dumper" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| | Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] | E2 * P3 = 6 |
| L F | Strutture di fondazioni in c.a. (sottofase) Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 5.77 uomini al giorno, per max. ore complessive 46.20) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [23.10 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [71.61 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [43.89 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [92.40 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [23.10 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [43.89 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [41.58 ore] | |
| L V A T | Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (Max. ore 46.20) | |
| R S | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| R S A T | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R S | Scala semplice | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|--|---|---|
| S A T R S R S R S R S R S R | Sega circolare | |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Rumore per "Carpentiere" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P3 = 9 |
| L F | Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.85 uomini al giorno, per max. ore complessive 30.80) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [43.00 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [2.25 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [54.02 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [17.89 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [11.37 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [14.22 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [0.83 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S R S R S R S R S R M A R S R S R S R S R S R A T R S R S | Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (Max. ore 30.80) Attrezzi manuali Punture, tagli, abrasioni Urti, colpi, impatti, compressioni Trancia-piegaferri Cesoiamenti, stritolamenti Elettrocuzione Punture, tagli, abrasioni Scivolamenti, cadute a livello Punture, tagli, abrasioni Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] Gru a torre (Max. ore 30.80) Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a livello Elettrocuzione Scivolamenti, cadute a livello Urti, colpi, impatti, compressioni Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] Attrezzi manuali Punture, tagli, abrasioni Urti, colpi, impatti, compressioni | E1 * P3 = 3 E2 * P1 = 2 E2 * P2 = 4 E3 * P1 = 3 E1 * P3 = 3 E1 * P1 = 1 E1 * P3 = 3 E1 * P1 = 1 E3 * P2 = 6 E3 * P1 = 3 E3 * P1 = 3 E1 * P2 = 2 E2 * P1 = 2 E1 * P1 = 1 E2 * P1 = 2 |
| L F | Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.54 uomini al giorno, per max. ore complessive 12.32) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [9.16 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [7.29 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [4.54 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [7.70 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [19.49 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [6.47 ore] | |
| L V | Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (Max. ore 12.32) | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|--|---------------------------------|
| A T T R I B U T I V I | Andatoie e Passerelle | |
| R I S C I T O | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| R I S C I T O | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| A T T R I B U T I V I | Attrezzi manuali | |
| R I S C I T O | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| R I S C I T O | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A T T R I B U T I V I | Vibratore elettrico per calcestruzzo | |
| R I S C I T O | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R I S C I T O | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R I S C I T O | Rumore per "Carpentiere" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P3 = 9 |
| M A S S I M O | Autobetoniera (Max. ore 12.32) | |
| R I S C I T O | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R I S C I T O | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R I S C I T O | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R I S C I T O | Rumore per "Operatore autobetoniera" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| R I S C I T O | Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| V A L O R I | Attrezzi manuali | |
| R I S C I T O | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R I S C I T O | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| M A S S I M O | Autopompa per cls (Max. ore 12.32) | |
| R I S C I T O | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R I S C I T O | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R I S C I T O | Getti, schizzi | E1 * P1 = 1 |
| R I S C I T O | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R I S C I T O | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| R I S C I T O | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R I S C I T O | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R I S C I T O | Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R I S C I T O | Vibrazioni per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P2 = 4 |
| V A L O R I | Attrezzi manuali | |
| R I S C I T O | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R I S C I T O | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L E V E | Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.84 uomini al giorno, per max. ore complessive 22.69) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [31.69 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [1.66 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [51.33 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [24.70 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [8.38 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [10.47 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [12.13 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [19.90 ore] | |
| L E V E | Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (Max. ore | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|--|---|---|
| V A T R S R S A T R S R S R S A T R S R S R S R S M A R S R S R S R A T R S R S | 22.69) Attrezzi manuali Punture, tagli, abrasioni Urti, colpi, impatti, compressioni Scala semplice Caduta dall'alto Movimentazione manuale dei carichi Urti, colpi, impatti, compressioni Trancia-piegaferri Cesoamenti, stritolamenti Elettrocuzione Punture, tagli, abrasioni Scivolamenti, cadute a livello Caduta dall'alto Punture, tagli, abrasioni Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiole" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] Gru a torre (Max. ore 22.69) Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a livello Elettrocuzione Scivolamenti, cadute a livello Urti, colpi, impatti, compressioni Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] Attrezzi manuali Punture, tagli, abrasioni Urti, colpi, impatti, compressioni | E1 * P3 = 3 E2 * P1 = 2 E3 * P2 = 6 E1 * P3 = 3 E2 * P1 = 2 E2 * P2 = 4 E3 * P1 = 3 E1 * P3 = 3 E1 * P1 = 1 E4 * P3 = 12 E1 * P3 = 3 E1 * P1 = 1 E3 * P2 = 6 E3 * P1 = 3 E3 * P1 = 3 E1 * P2 = 2 E2 * P1 = 2 E1 * P1 = 1 E1 * P1 = 1 E2 * P1 = 2 |
| L F | Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 7.98 uomini al giorno, per max. ore complessive 63.83) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [67.98 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [127.18 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [43.80 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [59.57 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Basso = [108.72 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [50.48 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Basso = [131.86 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [41.50 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [43.80 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S R S | Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (Max. ore 63.83) Attrezzi manuali Punture, tagli, abrasioni Urti, colpi, impatti, compressioni Ponteggio metallico fisso Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a livello Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 E2 * P2 = 4 E3 * P2 = 6 E3 * P2 = 6 E1 * P2 = 2 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|--|---------------------------------|
| A T T R I B U T I V I | Scala doppia | |
| R I S C I O | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R I S C I O | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R I S C I O | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| R I S C I O | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A T T R I B U T I V I | Sega circolare | |
| R I S C I O | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R I S C I O | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R I S C I O | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| R I S C I O | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R I S C I O | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R I S C I O | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R I S C I O | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R I S C I O | Rumore per "Carpentiere" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P3 = 9 |
| M A S S I V I | Autobetoniera (Max. ore 63.83) | |
| R I S C I O | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| R I S C I O | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R I S C I O | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P2 = 4 |
| R I S C I O | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R I S C I O | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R I S C I O | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R I S C I O | Rumore per "Operatore autobetoniera" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| R I S C I O | Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| A T T R I B U T I V I | Attrezzi manuali | |
| R I S C I O | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R I S C I O | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| M A S S I V I | Autopompa per cls (Max. ore 63.83) | |
| R I S C I O | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| R I S C I O | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R I S C I O | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R I S C I O | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R I S C I O | Getti, schizzi | E1 * P1 = 1 |
| R I S C I O | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R I S C I O | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| R I S C I O | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R I S C I O | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R I S C I O | Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R I S C I O | Vibrazioni per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P2 = 4 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|---|---------------------------------|
| A T R S R S M A R S R S R S R S R A T R S R S L F | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Gru a torre (Max. ore 63.83) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Strutture in elevazione in c.a. (sottofase) | |
| L F | Rinterro di scavo (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 6.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 48.00) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [20.80 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [30.40 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [49.60 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [7.68 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [40.00 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [30.40 ore] | |
| L V A T R S R S R S M A R S R S R S V A T R S R S | Addetto al rinterro di scavo (Max. ore 48.00) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| | Seppellimento, sprofondamento | E3 * P2 = 6 |
| | Pala meccanica (Max. ore 48.00) | |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Rumore per "Operatore pala meccanica" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| | Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] | E2 * P3 = 6 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.01 uomini al giorno, per max. ore complessive 0.04) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [0.17 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [0.03 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [0.01 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [0.01 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [0.06 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Alta = [0.06 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [0.07 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [0.00 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [0.10 ore] | |
| L | Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso (Max. ore 0.04) | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|---|------------------------------|
| V A T R S R S A T R S R S R S A T R S R S R S A T R S R S R S R S M A R S R S R S R S R S R S V A T R S R S M A R S R S R | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| | Ponteggio metallico fisso | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P3 = 9 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Scala semplice | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P4 = 8 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| | Trapano elettrico | |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P4 = 8 |
| | Rumore per "Ponteggiatore" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Autocarro (Max. ore 0.04) | |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Incendi, esplosioni | E3 * P1 = 3 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Operatore autocarro" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Gru a torre (Max. ore 0.04) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|--|---|------------------------------|
| S R S R S R A T R S R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| L F | Urti, colpi, impatti, compressioni | E1 * P1 = 1 |
| | Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.44 uomini al giorno, per max. ore complessive 3.51) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [10.66 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [25.72 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Medio = [9.64 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [0.36 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Basso = [20.29 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Medio = [24.80 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alto = [29.04 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Molto Alto = [9.13 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Medio = [9.64 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S A T R S R S R S M A R S R S | Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione (Max. ore 3.51) | |
| | Andatoie e Passerelle | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Ponteggio metallico fisso | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Scala semplice | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Sega circolare | |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| | Rumore per "Carpentiere" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P3 = 9 |
| | Gru a torre (Max. ore 3.51) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R A T | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S S | Attrezzi manuali | |
| R S S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.70 uomini al giorno, per max. ore complessive 13.63) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [57.08 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [2.99 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [92.46 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [44.50 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [15.10 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [18.87 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [21.86 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [35.85 ore] | |
| L V A T | Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (Max. ore 13.63) | |
| R S | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S A T | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S | Scala semplice | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| R S A T | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S | Trancia-piegaferri | |
| R S | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P2 = 4 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| R S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S R M A | Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S | Gru a torre (Max. ore 13.63) | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R A T | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L | Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase) | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|--|------------------------------|
| F | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.56 uomini al giorno, per max. ore complessive 4.47) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [9.81 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [15.51 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [7.60 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [4.78 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [15.94 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [26.90 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [22.80 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [7.20 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [7.60 ore] | |
| L V A T R S S A T R S R S A T R S R S R S A T R S R S R S M A R S R S R S R S R S V A T R S R S M A R S R | Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (Max. ore 4.47) | |
| | Andatoie e Passerelle | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Ponteggio metallico fisso | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Scala semplice | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Vibratore elettrico per calcestruzzo | |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| | Rumore per "Carpentiere" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P3 = 9 |
| | Autobetoniera (Max. ore 4.47) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Rumore per "Operatore autobetoniera" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| | Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Autopompa per cls (Max. ore 4.47) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|--|--|------------------------------|
| S R S R S R S R S R S R S R S V A T R S R S | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Getti, schizzi | E1 * P1 = 1 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Vibrazioni per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P2 = 4 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.79 uomini al giorno, per max. ore complessive 6.30) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [26.40 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [1.38 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Medio = [42.77 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [20.59 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Basso = [6.98 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [8.73 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Basso = [10.11 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Medio = [16.58 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S A T R S R S M A R S R S R S | Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (Max. ore 6.30) Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Scala semplice | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Trancia-piegaferri | |
| | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P2 = 4 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| | Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Gru a torre (Max. ore 6.30) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|--|------------------------------|
| R S R S R A T R S R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.66 uomini al giorno, per max. ore complessive 21.28) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [67.98 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [127.18 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Medio = [43.80 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [59.57 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Basso = [108.72 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [50.48 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Basso = [131.86 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Medio = [41.50 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Medio = [43.80 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S R S R S A T R S R S R S R S R S R S R S R S R S M A R S R S R S R S R | Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (Max. ore 21.28) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Ponteggio metallico fisso | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Scala doppia | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Sega circolare | |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| | Rumore per "Carpentiere" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P3 = 9 |
| | Autobetoniera (Max. ore 21.28) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P2 = 4 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| L V | Addetto alla realizzazione di tompagnature (Max. ore 19.06) | |
| A | Attrezzi manuali | |
| T | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| S | Betoniera a bicchiere | |
| S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| A | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| T | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| R | Getti, schizzi | E1 * P1 = 1 |
| S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P2 = 2 |
| R | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P4 = 8 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| R | Ponteggio metallico fisso | |
| A | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| T | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| R | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| S | Ponte su cavalletti | |
| A | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P3 = 3 |
| T | Scala semplice | |
| R | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| S | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P4 = 8 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| S | Rumore per "Operaio comune (murature)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| M | Gru a torre (Max. ore 19.06) | |
| A | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| S | Attrezzi manuali | |
| A | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| T | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R | Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.78 uomini al giorno, per max. ore complessive 6.24) | |
| L | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima | = [5.18 ore] |
| F | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa | = [19.60 ore] |
| | Entità del Danno Lieve/Probabilità Media | = [16.43 ore] |
| | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima | = [4.09 ore] |
| | Entità del Danno Serio/Probabilità Media | = [16.43 ore] |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|--|---------------------------------|
| L V A T R S R S A T R S R S R S R S R S A T R S A T R S R S R S R S M A R S R S R S R A T R S R S L F | Entità del Danno Serio/Probabilità Alta = [3.65 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [1.19 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [42.15 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [1.46 ore] | |
| | Addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali (Max. ore 6.24) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| | Betoniera a bicchiere | |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| | Getti, schizzi | E1 * P1 = 1 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P4 = 8 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| | Ponteggio metallico fisso | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Ponte su cavalletti | |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P3 = 3 |
| | Scala semplice | |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| | Taglierina elettrica | |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P2 = 2 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| | Rumore per "Operaio comune (murature)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| | Gru a torre (Max. ore 6.24) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Realizzazione di divisori interni (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 8.90 uomini al giorno, per max. ore complessive 71.21) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [64.28 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [6.50 ore] | |

| S i g l a | | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|--|--|------------------------------|
| | | Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [186.11 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [47.86 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [186.11 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Alta = [144.75 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [8.21 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [82.72 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [16.54 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S R S R S R S M A T R S R S R S R A T R S R L F | | Addetto alla realizzazione di divisori interni (Max. ore 71.21) | |
| | | Attrezzi manuali | |
| | | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| | | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| | | Betoniera a bicchiere | |
| | | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| | | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| | | Getti, schizzi | E1 * P1 = 1 |
| | | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| | | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P4 = 8 |
| | | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| | | Ponte su cavalletti | |
| | | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P3 = 3 |
| | | Scala semplice | |
| | | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P4 = 8 |
| | | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| | | Rumore per "Operaio comune (murature)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| | | Gru a torre (Max. ore 71.21) | |
| | | Carriola | |
| | | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | | Urti, colpi, impatti, compressioni | E1 * P1 = 1 |
| | | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | | Attrezzi manuali | |
| | | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | | Copertur ,terrazzi ecc. (sottofase) Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.60 uomini al giorno, per max. ore complessive 12.83) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [5.04 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [4.43 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [16.11 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [3.24 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [10.74 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Alta = [8.35 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [1.67 ore] | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [16.42 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [11.34 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [0.95 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [5.37 ore] | |
| L V | Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate (Max. ore 12.83) | |
| A | Attrezzi manuali | |
| T | | |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| S | | |
| A | Betoniera a bicchiere | |
| T | | |
| R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| S | | |
| R | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| S | | |
| R | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| S | | |
| R | Getti, schizzi | E1 * P1 = 1 |
| S | | |
| R | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| S | | |
| R | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P2 = 2 |
| S | | |
| R | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P4 = 8 |
| S | | |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| S | | |
| A | Ponteggio metallico fisso | |
| T | | |
| R | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| S | | |
| R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| S | | |
| R | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P3 = 3 |
| S | | |
| A | Ponte su cavalletti | |
| T | | |
| R | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P3 = 3 |
| S | | |
| A | Scala semplice | |
| T | | |
| R | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| S | | |
| R | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P4 = 8 |
| S | | |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| S | | |
| A | Taglierina elettrica | |
| T | | |
| R | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| S | | |
| R | Inalazione polveri, fibre | E1 * P2 = 2 |
| S | | |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| S | | |
| R | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| S | | |
| R | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| S | | |
| R | Rumore per "Operaio comune (murature)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| S | | |
| R | | |
| M | Gru a torre (Max. ore 12.83) | |
| A | | |
| R | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| S | | |
| R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| S | | |
| R | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| S | | |
| R | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| S | | |
| R | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| S | | |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| S | | |
| R | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|--|---|------------------------------|
| S R A T R S R S | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Formazione di massetto per coperture (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.06 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.47) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [36.98 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [1.63 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [17.86 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [6.49 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Basso = [0.60 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [14.01 ore] | |
| L V A T | Addetto alla formazione di massetto per coperture (Max. ore 16.47) | |
| R S R S A T R S R S R S R S R S M A R S R S R S R S A T R S R S | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Impastatrice | |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| | Rumore per "Pavimentista preparatore fondo" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Gru a torre (Max. ore 16.47) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Impermeabilizzazione di coperture (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 10.86 uomini al giorno, per max. ore complessive 86.91) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [2.47 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [164.11 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Medio = [197.42 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [82.56 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Medio = [158.80 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [1.29 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Basso = [39.00 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Medio = [81.54 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Medio = [158.80 ore] | |
| L V A T | Addetto all'impermeabilizzazione di coperture (Max. ore 86.91) | |
| | Attrezzi manuali | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| A T | Cannello a gas | |
| R S | Inalazione fumi, gas, vapori | E1 * P2 = 2 |
| R S | Incendi, esplosioni | E3 * P3 = 9 |
| R S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S | Ustioni | E1 * P3 = 3 |
| A T | Ponteggio metallico fisso | |
| R S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P3 = 3 |
| A T | Scala semplice | |
| R S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| R S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R S | Rumore per "Impermeabilizzatore" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E2 * P3 = 6 |
| M A | Gru a torre (Max. ore 86.91) | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | protezione guaine coperture piane (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.29 uomini al giorno, per max. ore complessive 34.35) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [105.66 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [37.72 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [19.09 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [23.37 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [1.69 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [20.90 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [0.17 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [66.06 ore] | |
| L V | Addetto alla posa di strato drenante su coperture piane (Max. ore 34.35) | |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| A T | Ponteggio metallico fisso | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| R S R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E1 * P1 = 1 |
| R S R | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| A T R S | Battipiastrille elettrico | |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P3 = 6 |
| R S A | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| T R S | Taglierina elettrica | |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P2 = 2 |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| R S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R S R | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| R S R | Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P2 = 4 |
| R S V | Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti" [HAV "Inferiore a 2,5 m/s²", WBV "Non presente"] | E2 * P2 = 4 |
| M | Gru a torre (Max. ore 34.35) | |
| A R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| A T R S | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Realizzazione di opere di lattoneria (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.48 uomini al giorno, per max. ore complessive 11.82) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [23.99 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [0.94 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [30.58 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [0.94 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [20.39 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [1.19 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [10.54 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [41.90 ore] | |
| L V | Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria (Max. ore 11.82) | |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| A T R S | Ponteggio metallico fisso | |
| R S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P3 = 3 |
| A | Scala semplice | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|--|---|------------------------------|
| T R S S R S R S R M A R S R S R S R S R S R S R A T R S R S L F | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| | Rumore per "Lattoniere (tetto)" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Gru a torre (Max. ore 11.82) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Impianti (sottofase) | |
| L F | Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.46 uomini al giorno, per max. ore complessive 11.71) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [55.30 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [41.55 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Medio = [18.78 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [0.87 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Basso = [48.50 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [19.87 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Basso = [11.27 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S R S R S R S R M A R S R S R | Addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas (Max. ore 11.71) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Scala semplice | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Trapano elettrico | |
| | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| | Rumore per "Idraulico" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Gru a torre (Max. ore 11.71) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|--|------------------------------|
| S R S R S R S R A T R S R S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Realizzazione di impianto termico (autonomo) (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.54 uomini al giorno, per max. ore complessive 28.35) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [168.64 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [180.91 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [50.06 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [76.94 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Basso = [146.33 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [73.17 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [82.79 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Basso = [152.99 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S R S R S A T R S R S R S M A R S R S R S R | Addetto alla realizzazione di impianto termico (autonomo) (Max. ore 28.35) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Saldatrice elettrica | |
| | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| | Inalazione fumi, gas, vapori | E1 * P2 = 2 |
| | Incendi, esplosioni | E3 * P2 = 6 |
| | Radiazioni non ionizzanti | E1 * P3 = 3 |
| | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| | Scala semplice | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P3 = 6 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Trapano elettrico | |
| | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| | Rumore per "Impiantista termico" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| | Gru a torre (Max. ore 28.35) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |

[illegible]

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [22.80 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [3.60 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [3.60 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [11.40 ore] | |
| L V | Addetto alla realizzazione di impianto radiotelevisivo (Max. ore 4.00) | |
| A | Attrezzi manuali | |
| T | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| S | Ponteggio mobile o trabattello | |
| S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| A | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| T | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P2 = 2 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| S | Scala doppia | |
| S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P2 = 2 |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A | Scanalatrice per muri ed intonaci | |
| T | Elettrocuzione | E3 * P3 = 9 |
| R | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R | Ustioni | E1 * P3 = 3 |
| S | Trapano elettrico | |
| A | Elettrocuzione | E3 * P3 = 9 |
| T | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| S | Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| R | Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non presente"] | E2 * P3 = 6 |
| S | | |
| | Realizzazione di impianto telefonico e citofonico (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 8.00) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [7.20 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [45.60 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [21.60 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [22.80 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [49.20 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [2.88 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [22.80 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [45.60 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [7.20 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [7.20 ore] | |
| L V | Addetto alla realizzazione di impianto telefonico e citofonico (Max. ore 8.00) | |
| A | Attrezzi manuali | |
| T | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R | | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|--|--|---------------------------------|
| R S A T | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R S R S R S A T | Ponteggio mobile o trabattello | |
| R S R S R S R S A T | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S R S R S R S A T | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S R S R S R S A T | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P2 = 2 |
| R S R S R S R S A T | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R S R S R S R S A T | Scala doppia | |
| R S R S R S R S A T | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S R S R S R S A T | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S R S R S R S A T | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P2 = 2 |
| R S R S R S R S A T | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| R S R S R S R S A T | Scanalatrice per muri ed intonaci | |
| R S R S R S R S A T | Elettrocuzione | E3 * P3 = 9 |
| R S R S R S R S A T | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| R S R S R S R S A T | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S R S R S R S A T | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S R S R S R S A T | Ustioni | E1 * P3 = 3 |
| R S R S R S R S A T | Trapano elettrico | |
| R S R S R S R S A T | Elettrocuzione | E3 * P3 = 9 |
| R S R S R S R S A T | Inalazione polveri, fibre | E1 * P3 = 3 |
| R S R S R S R S A T | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S R S R S R S A T | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R S R S R S R S A T | Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| R S R S R S R S A T | Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non presente"] | E2 * P3 = 6 |
| L V A T | Finiture esterne (sottofase) | |
| L V A T | Formazione intonaci esterni (industrializzati) (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.65 uomini al giorno, per max. ore complessive 29.24) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [17.23 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [68.08 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [31.94 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [22.51 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [29.52 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [53.31 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [26.40 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [26.40 ore] | |
| L V A T | Addetto alla formazione intonaci esterni (industrializzati) (Max. ore 29.24) | |
| L V A T | Attrezzi manuali | |
| L V A T | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| L V A T | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L V A T | Intonacatrice | |
| L V A T | Getti, schizzi | E1 * P2 = 2 |
| L V A T | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P2 = 2 |
| L V A T | Scoppio | E3 * P1 = 3 |
| L V A T | Ponteggio metallico fisso | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| R | Caduta dall'alto | E3 * P4 = 12 |
| S | | |
| R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| S | | |
| R | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| S | | |
| A | Scala semplice | |
| T | | |
| R | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| S | | |
| R | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P2 = 2 |
| S | | |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| S | | |
| R | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| S | | |
| S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| R | | |
| S | Rumore per "Riquadratore (intonaci industrializzati)" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P2 = 4 |
| R | | |
| S | Vibrazioni per "Riquadratore" [HAV "Inferiore a 2,5 m/s²", WBV "Non presente"] | E2 * P2 = 4 |
| V | | |
| M | Gru a torre (Max. ore 29.24) | |
| A | | |
| R | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| S | | |
| S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R | | |
| S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R | | |
| S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R | | |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R | | |
| S | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R | | |
| A | Attrezzi manuali | |
| T | | |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| S | | |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| S | | |
| L | | |
| F | Finiture interne (sottofase) | |
| | Formazione intonaci interni (tradizionali) (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 5.34 uomini al giorno, per max. ore complessive 42.71) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [106.39 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [24.33 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [52.76 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [37.04 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [0.74 ore] | |
| L | | |
| V | Addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali) (Max. ore 42.71) | |
| A | | |
| T | Attrezzi manuali | |
| R | | |
| S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R | | |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| A | | |
| T | Impastatrice | |
| R | | |
| S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R | | |
| S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R | | |
| S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R | | |
| S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R | | |
| S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| R | | |
| S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| A | | |
| T | Ponte su cavalletti | |
| R | | |
| S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|---|---------------------------------|
| A T T R I B U T I V I T À | Scala semplice | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Riquadratore (intonaci tradizionali)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Gru a torre (Max. ore 42.71) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L I M I T I V I T À | Posa di rivestimenti interni (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.40 uomini al giorno, per max. ore complessive 3.17) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [5.29 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [5.17 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [3.48 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [1.85 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [3.50 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [0.03 ore] | |
| L I M I T I V I T À | Addetto alla posa di rivestimenti interni (Max. ore 3.17) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Ponte su cavalletti | |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Scala semplice | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P1 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Taglierina elettrica | |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P2 = 2 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| | Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P2 = 4 |
| | Gru a torre (Max. ore 3.17) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità | |
|--|---|---------------------------------|--|
| S R S R S R S R A T R S R S L F | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 | |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 | |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 | |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 | |
| | Attrezzi manuali | | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 | |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 | |
| L F | Pavimenti (sottofase) | | |
| | Formazione di massetto per pavimenti interni (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.61 uomini al giorno, per max. ore complessive 12.85) | | |
| | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima | = [28.85 ore] | |
| | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa | = [1.27 ore] | |
| | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima | = [13.93 ore] | |
| | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima | = [5.06 ore] | |
| | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa | = [0.47 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S R S R S R S R M A R S R S R S R A T R S R S | Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni (Max. ore 12.85) | | |
| | Attrezzi manuali | | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 | |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 | |
| | Impastatrice | | |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 | |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 | |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 | |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 | |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 | |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 | |
| | Rumore per "Pavimentista preparatore fondo" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 | |
| | Gru a torre (Max. ore 12.85) | | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 | |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 | |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 | |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 | |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 | |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 | |
| L F | Attrezzi manuali | | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 | |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 | |
| | Posa di pavimenti per interni (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.45 uomini al giorno, per max. ore complessive 35.61) | | |
| | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima | = [39.42 ore] | |
| | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa | = [39.03 ore] | |
| | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima | = [19.98 ore] | |
| | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa | = [23.90 ore] | |
| | Entità del Danno Serio/Probabilità Media | = [1.73 ore] | |
| | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima | = [21.96 ore] | |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [0.34 ore] | |
| L V | Addetto alla posa di pavimenti per interni (Max. ore 35.61) | |
| A | Attrezzi manuali | |
| T | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| S | Battipiastrille elettrico | |
| R | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| S | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P3 = 6 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| S | Taglierina elettrica | |
| A | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| T | Inalazione polveri, fibre | E1 * P2 = 2 |
| R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R | Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P2 = 4 |
| S | Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti" [HAV "Inferiore a 2,5 m/s²", WBV "Non presente"] | E2 * P2 = 4 |
| V | Gru a torre (Max. ore 35.61) | |
| M | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| A | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| S | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R | Attrezzi manuali | |
| A | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| T | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R | | |
| S | Tinteggiature (sottofase) | |
| L | Tinteggiatura di superfici esterne (sottofase) | |
| F | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.25 uomini al giorno, per max. ore complessive 25.99) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [27.22 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [0.89 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [56.37 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [12.17 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [45.10 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [1.13 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [46.68 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [11.27 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [57.63 ore] | |
| L | Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne (Max. ore 25.99) | |
| V | Attrezzi manuali | |
| A | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| T | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| R | Ponteggio metallico fisso | |
| S | Caduta dall'alto | E3 * P4 = 12 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| R S S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P3 = 3 |
| A T | Ponteggio mobile o trabattello | |
| R S S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R S S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| R S S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| R S A | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| T R S | Scala doppia | |
| R S S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R S S | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| R S A | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| T R S | Scala semplice | |
| R S S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R S S | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| R S S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| R S S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R S S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| R S R | Rumore per "Decoratore" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| M A R | Gru a torre (Max. ore 25.99) | |
| R S S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Tinteggiatura di superfici interne (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.73 uomini al giorno, per max. ore complessive 21.84) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [43.92 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [0.75 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [18.95 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [10.22 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [18.95 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [0.95 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [0.28 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [9.47 ore] | |
| L V | Addetto alla tinteggiatura di superfici interne (Max. ore 21.84) | |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P3 = 3 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|--|---|---------------------------------|
| A T R S A T R S R S R S R M A R S R S R S R S R A T R S R S L F | Ponte su cavalletti | |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Scala doppia | |
| | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P3 = 6 |
| | Rumore per "Decoratore" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Gru a torre (Max. ore 21.84) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Posa in opera di serramenti e ringhiere (sottofase) | |
| L F | Posa di serramenti interni (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.05 uomini al giorno, per max. ore complessive 24.37) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [0.52 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [46.09 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [69.03 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [22.94 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [0.27 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [0.08 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [22.94 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S A T R S R S R M A R S R S | Addetto alla posa di serramenti interni (Max. ore 24.37) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Ponte su cavalletti | |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Scala semplice | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P3 = 6 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Serramentista" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| | Gru a torre (Max. ore 24.37) | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Posa di serramenti esterni (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.78 uomini al giorno, per max. ore complessive 22.28) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [0.48 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [42.13 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [63.10 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [20.97 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [0.25 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [42.00 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [41.93 ore] Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [20.97 ore] | |
| L V | Addetto alla posa di serramenti esterni (Max. ore 22.28) | |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| R S A | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| T | Ponteggio metallico fisso | |
| R S S | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| R S S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| R S A | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| T | Scala semplice | |
| R S S | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| R S S | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P3 = 6 |
| R S S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S S | Caduta dall'alto | E4 * P3 = 12 |
| R S R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| R M | Rumore per "Serramentista" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| A | Gru a torre (Max. ore 22.28) | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| S | Posa di ringhiere e parapetti (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.95 uomini al giorno, per max. ore complessive 39.57) | |
| L F | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [199.72 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [128.72 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [30.38 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [7.21 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [60.75 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [30.38 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [39.49 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [124.16 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [121.50 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [30.38 ore] | |
| L V | Addetto alla posa di ringhiere e parapetti (Max. ore 39.57) | |
| A T | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A T | Ponteggio metallico fisso | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| R S | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| A T | Saldatrice elettrica | |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| R S | Inalazione fumi, gas, vapori | E1 * P1 = 1 |
| R S | Incendi, esplosioni | E3 * P1 = 3 |
| R S | Radiazioni non ionizzanti | E1 * P3 = 3 |
| R S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| A T | Scala semplice | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| R S | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P3 = 6 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| A T | Smerigliatrice angolare (flessibile) | |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| R S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| A T | Trapano elettrico | |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P2 = 6 |
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P2 = 2 |
| R S | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P3 = 9 |
| R S | Rumore per "Fabbro" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] | E3 * P4 = 12 |
| M A | Gru a torre (Max. ore 39.57) | |
| R S | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |

| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| R S | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S R | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S R | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S R | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| R S R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R A T | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S R | Attrezzi manuali | |
| R S R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S L F | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | FINE CANTIERE (sottofase) smontaggio della gru a torre (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.80 uomini al giorno, per max. ore complessive 6.40) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [10.08 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [0.56 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [0.48 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [7.38 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [1.80 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [4.56 ore] | |
| L V A T | Addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre (Max. ore 6.40) | |
| R S | Attrezzi manuali | |
| R S R | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S M A | Caduta dall'alto | E3 * P2 = 6 |
| R S | Autocarro (Max. ore 6.40) | |
| R S R | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |
| R S R | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S R | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R S R | Incendi, esplosioni | E3 * P1 = 3 |
| R S R | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| R S R | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| R S R | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| R S R | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| R S R | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| R S R | Rumore per "Operatore autocarro" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| R S V A | Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| R S | Attrezzi manuali | |
| R S | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| R S | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| M A | Autogrù (Max. ore 6.40) | |
| R S | Cesoiamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| R S | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| R S | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| R | Incendi, esplosioni | E3 * P1 = 3 |


| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|---|------------------------------|
| S R S R S R S R S R S R S R S V A T R S R S | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche | E1 * P1 = 1 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Operatore autogrù" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Vibrazioni per "Operatore autogrù" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| L F | Smobilizzo del cantiere (sottofase) <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.55 uomini al giorno, per max. ore complessive 4.40) Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [6.52 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Basso = [0.28 ore] Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [0.48 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [6.02 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Basso = [2.24 ore] Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [0.96 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [1.38 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Basso = [4.16 ore] Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [2.08 ore] | |
| L V A T R S R S A T R S R S A T R S R S A T R S R S M A R | Addetto allo smobilizzo del cantiere (Max. ore 4.40) | |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Ponteggio metallico fisso | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Scala doppia | |
| | Caduta dall'alto | E3 * P3 = 9 |
| | Cesoimenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E2 * P3 = 6 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P2 = 4 |
| | Trapano elettrico | |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Ustioni | E1 * P1 = 1 |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P2 = 6 |
| | Rumore per "Operaio polivalente" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] | E2 * P1 = 2 |
| | Autocarro (Max. ore 4.40) | |
| | Caduta di materiale dall'alto o a livello | E3 * P1 = 3 |


| S i g l a | Attività | Entità del Danno Probabilità |
|---|---|---------------------------------|
| S R S R S R S R S R S R S R S V A T R S R S M A R S R S R S R S R S R S R S R S V A T R S R S | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P3 = 3 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Operatore autocarro" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Autogrù (Max. ore 4.40) | |
| | Cesoamenti, stritolamenti | E2 * P1 = 2 |
| | Elettrocuzione | E3 * P1 = 3 |
| | Inalazione polveri, fibre | E1 * P1 = 1 |
| | Investimento, ribaltamento | E3 * P1 = 3 |
| | Movimentazione manuale dei carichi | E1 * P1 = 1 |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Scivolamenti, cadute a livello | E1 * P2 = 2 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |
| | Rumore per "Operatore autogrù" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] | E1 * P1 = 1 |
| | Vibrazioni per "Operatore autogrù" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E2 * P1 = 2 |
| | Attrezzi manuali | |
| | Punture, tagli, abrasioni | E1 * P1 = 1 |
| | Urti, colpi, impatti, compressioni | E2 * P1 = 2 |


LEGENDA:
 [CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] = Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RSR] = Rischio Rumore; [RSV] = Rischio Vibrazione; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] = Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;
 [E1] = Entità Danno Lieve; [E2] = Entità Danno Serio; [E3] = Entità Danno Grave; [E4] = Entità Danno Gravissimo;
 [P1] = Probabilità Bassissima; [P2] = Probabilità Basso; [P3] = Probabilità Media; [P4] = Probabilità Alta.


GRAFICI probabilità/entità del danno


Periodo: 01/09/2011 - 31/10/2011

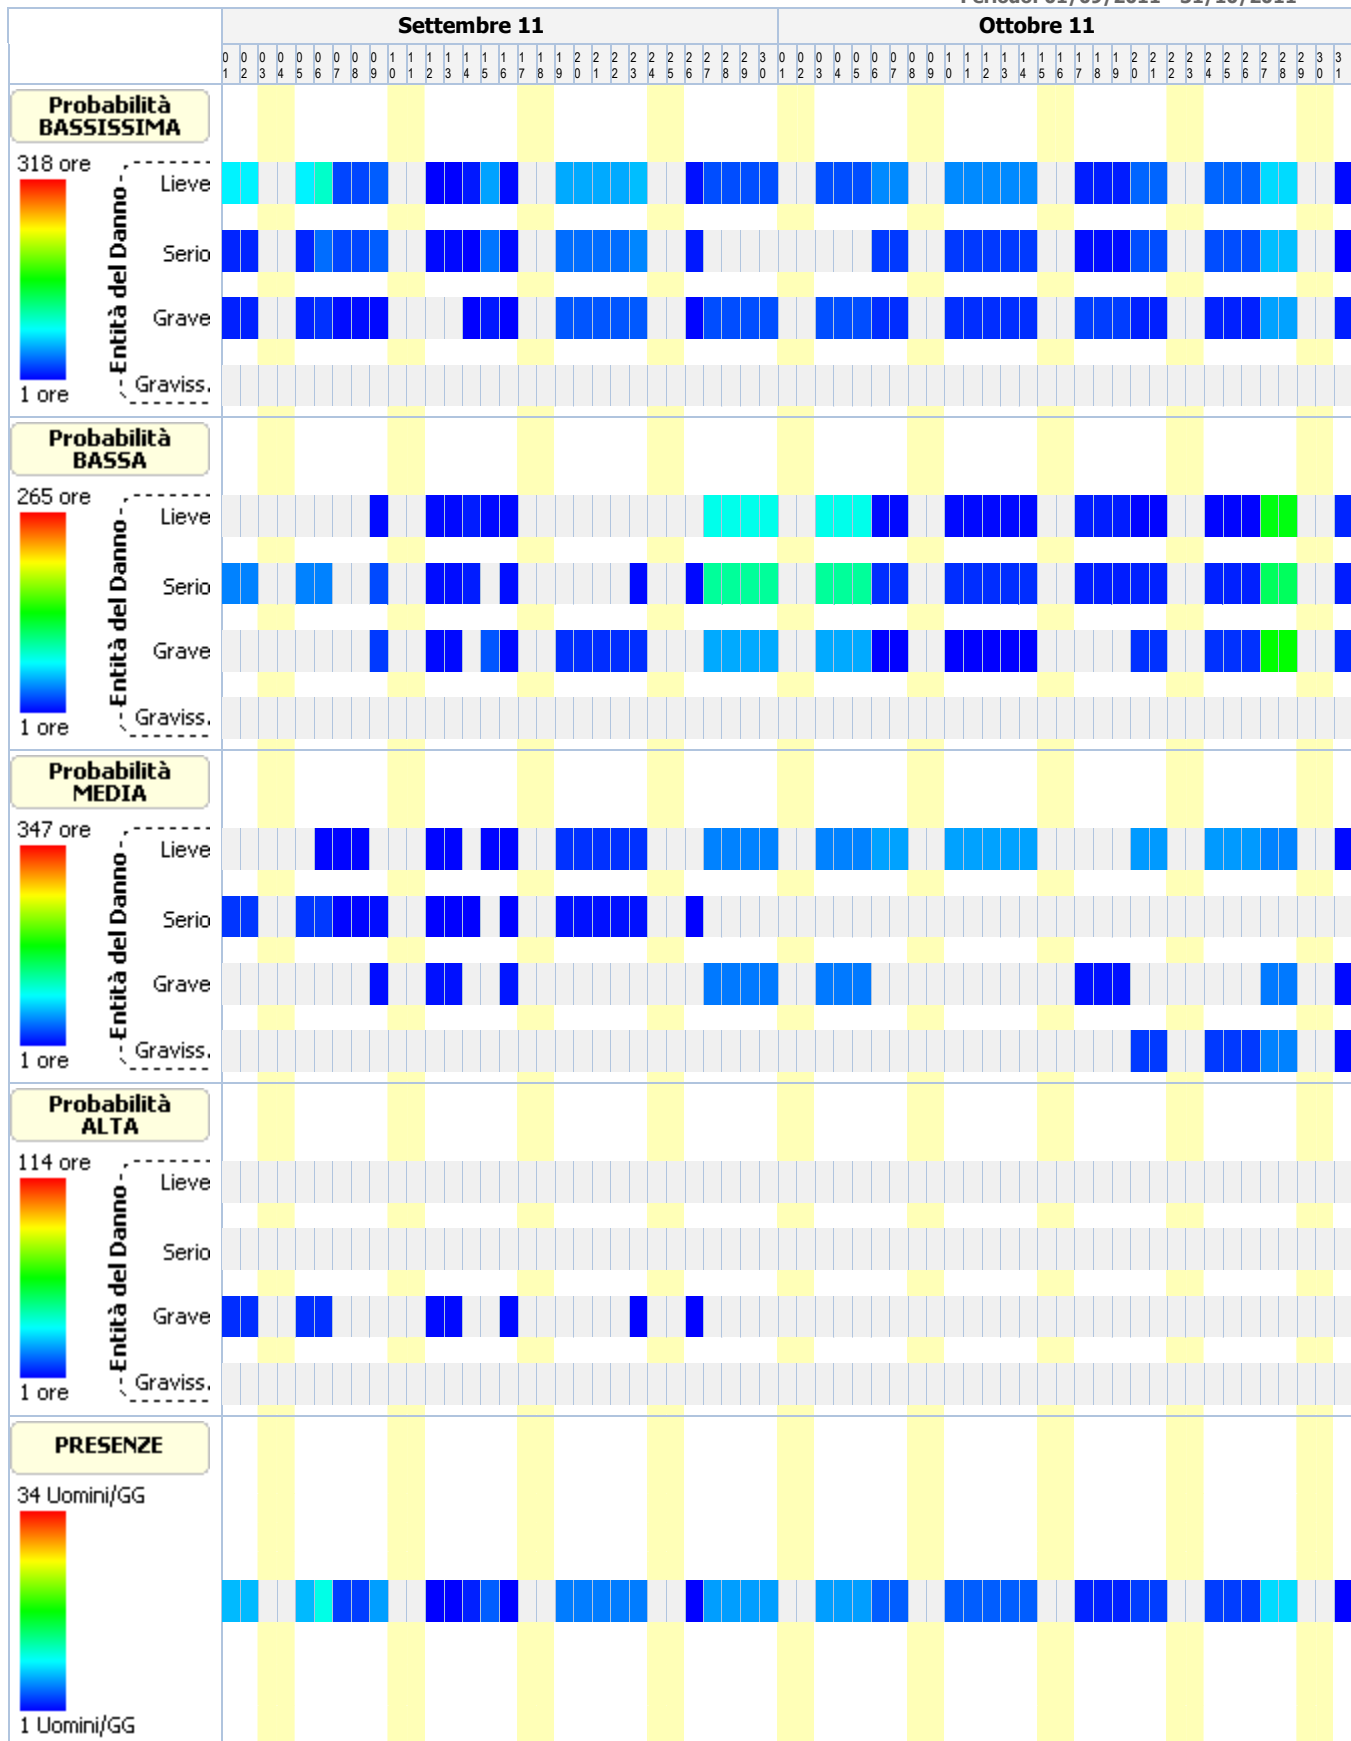

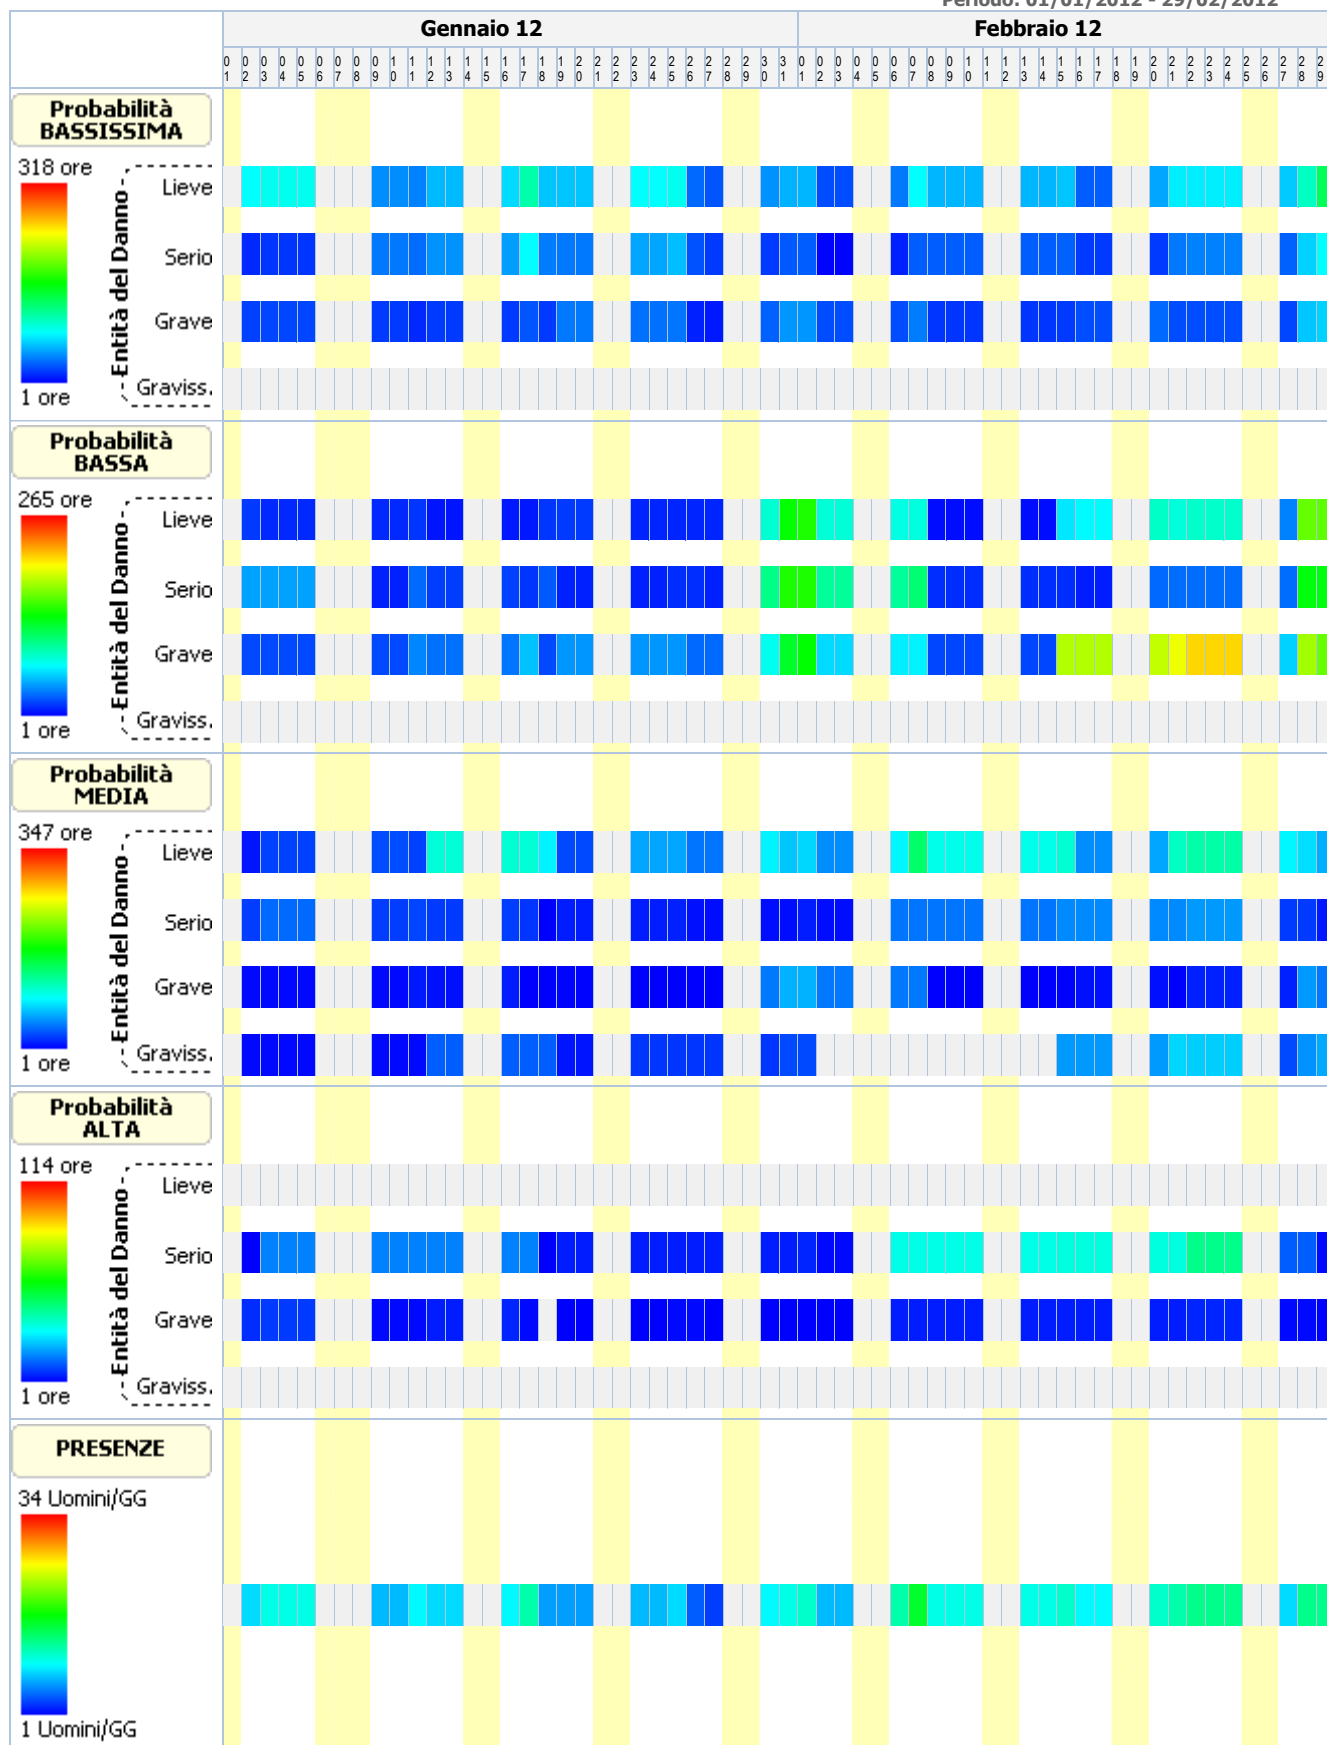

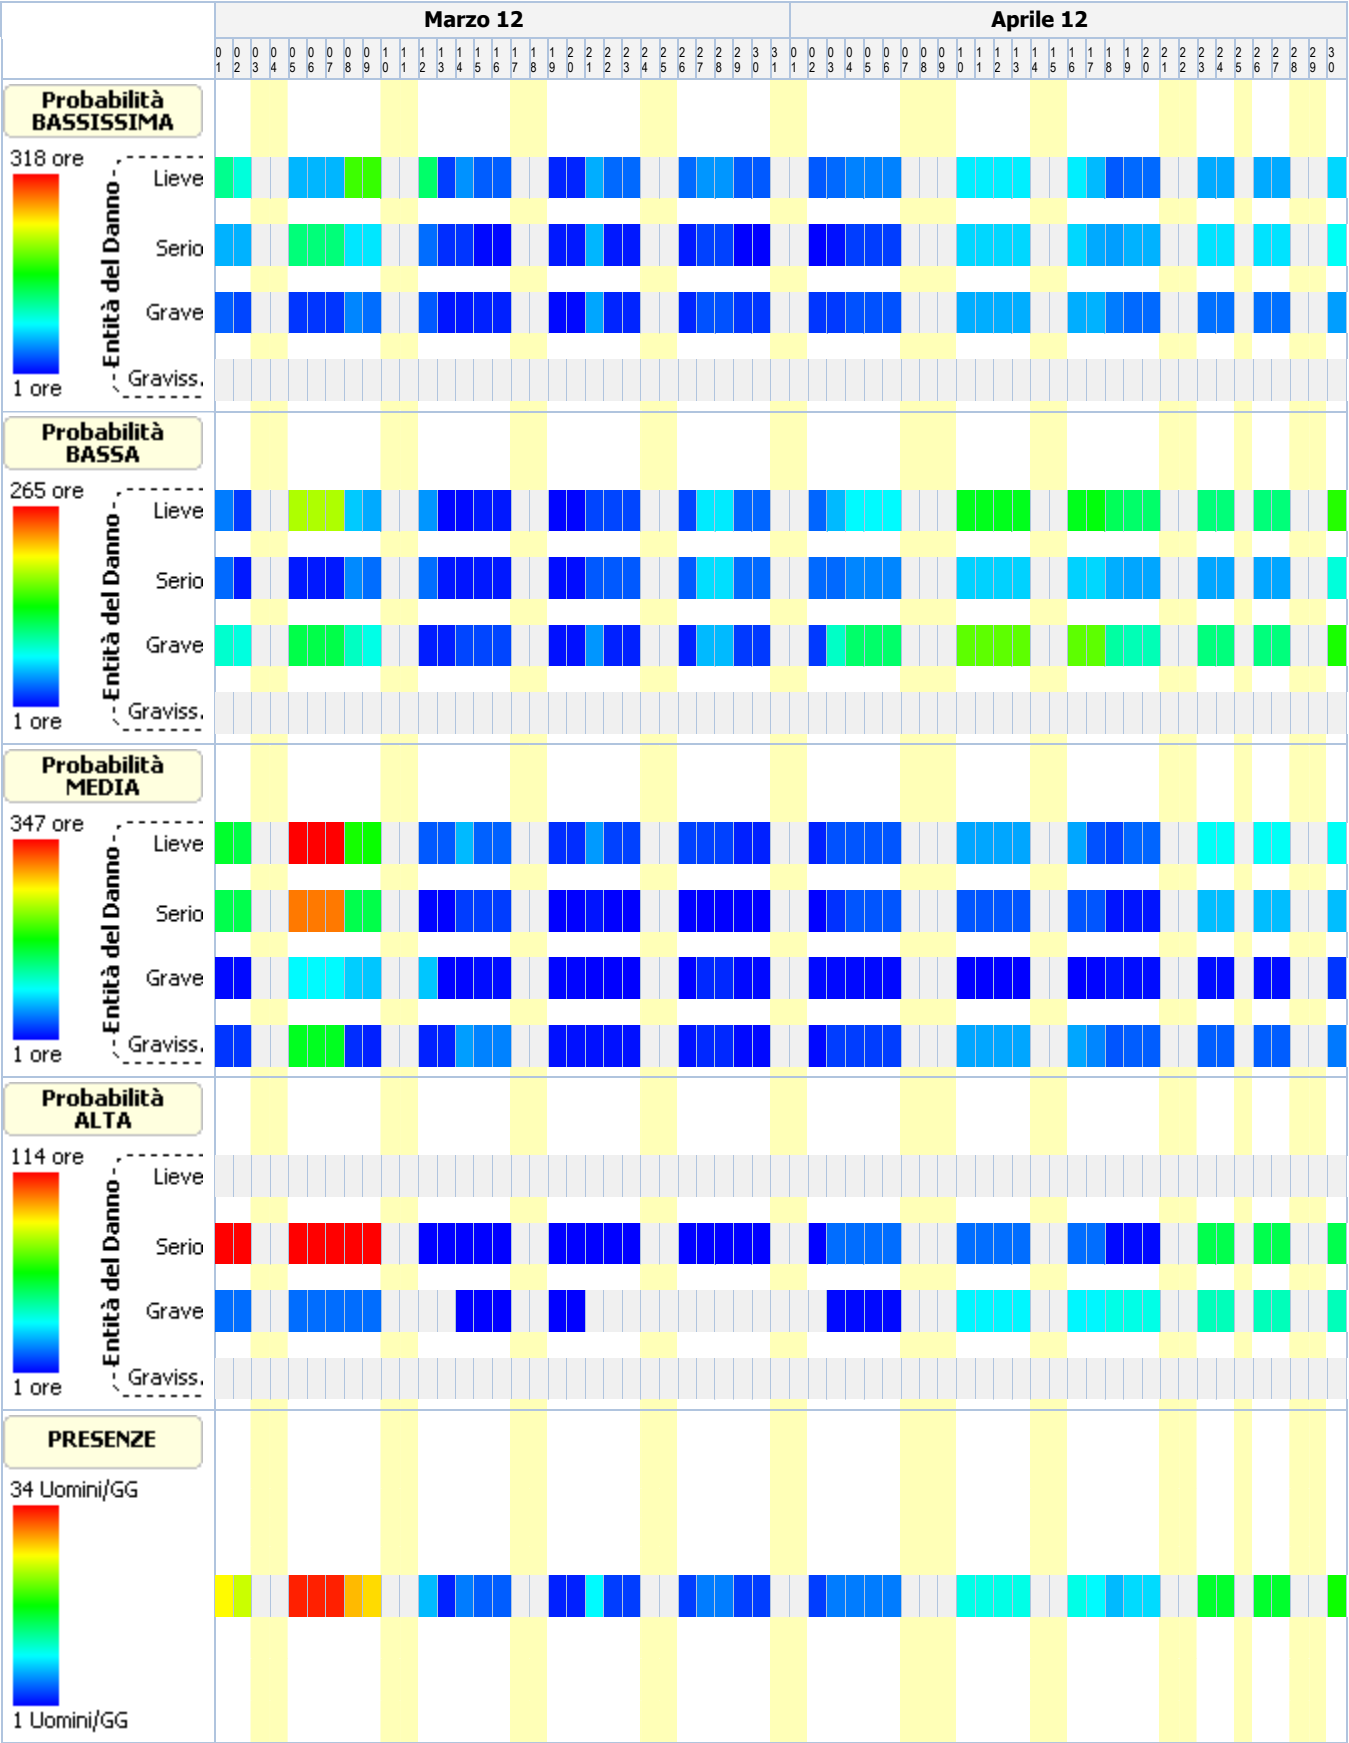

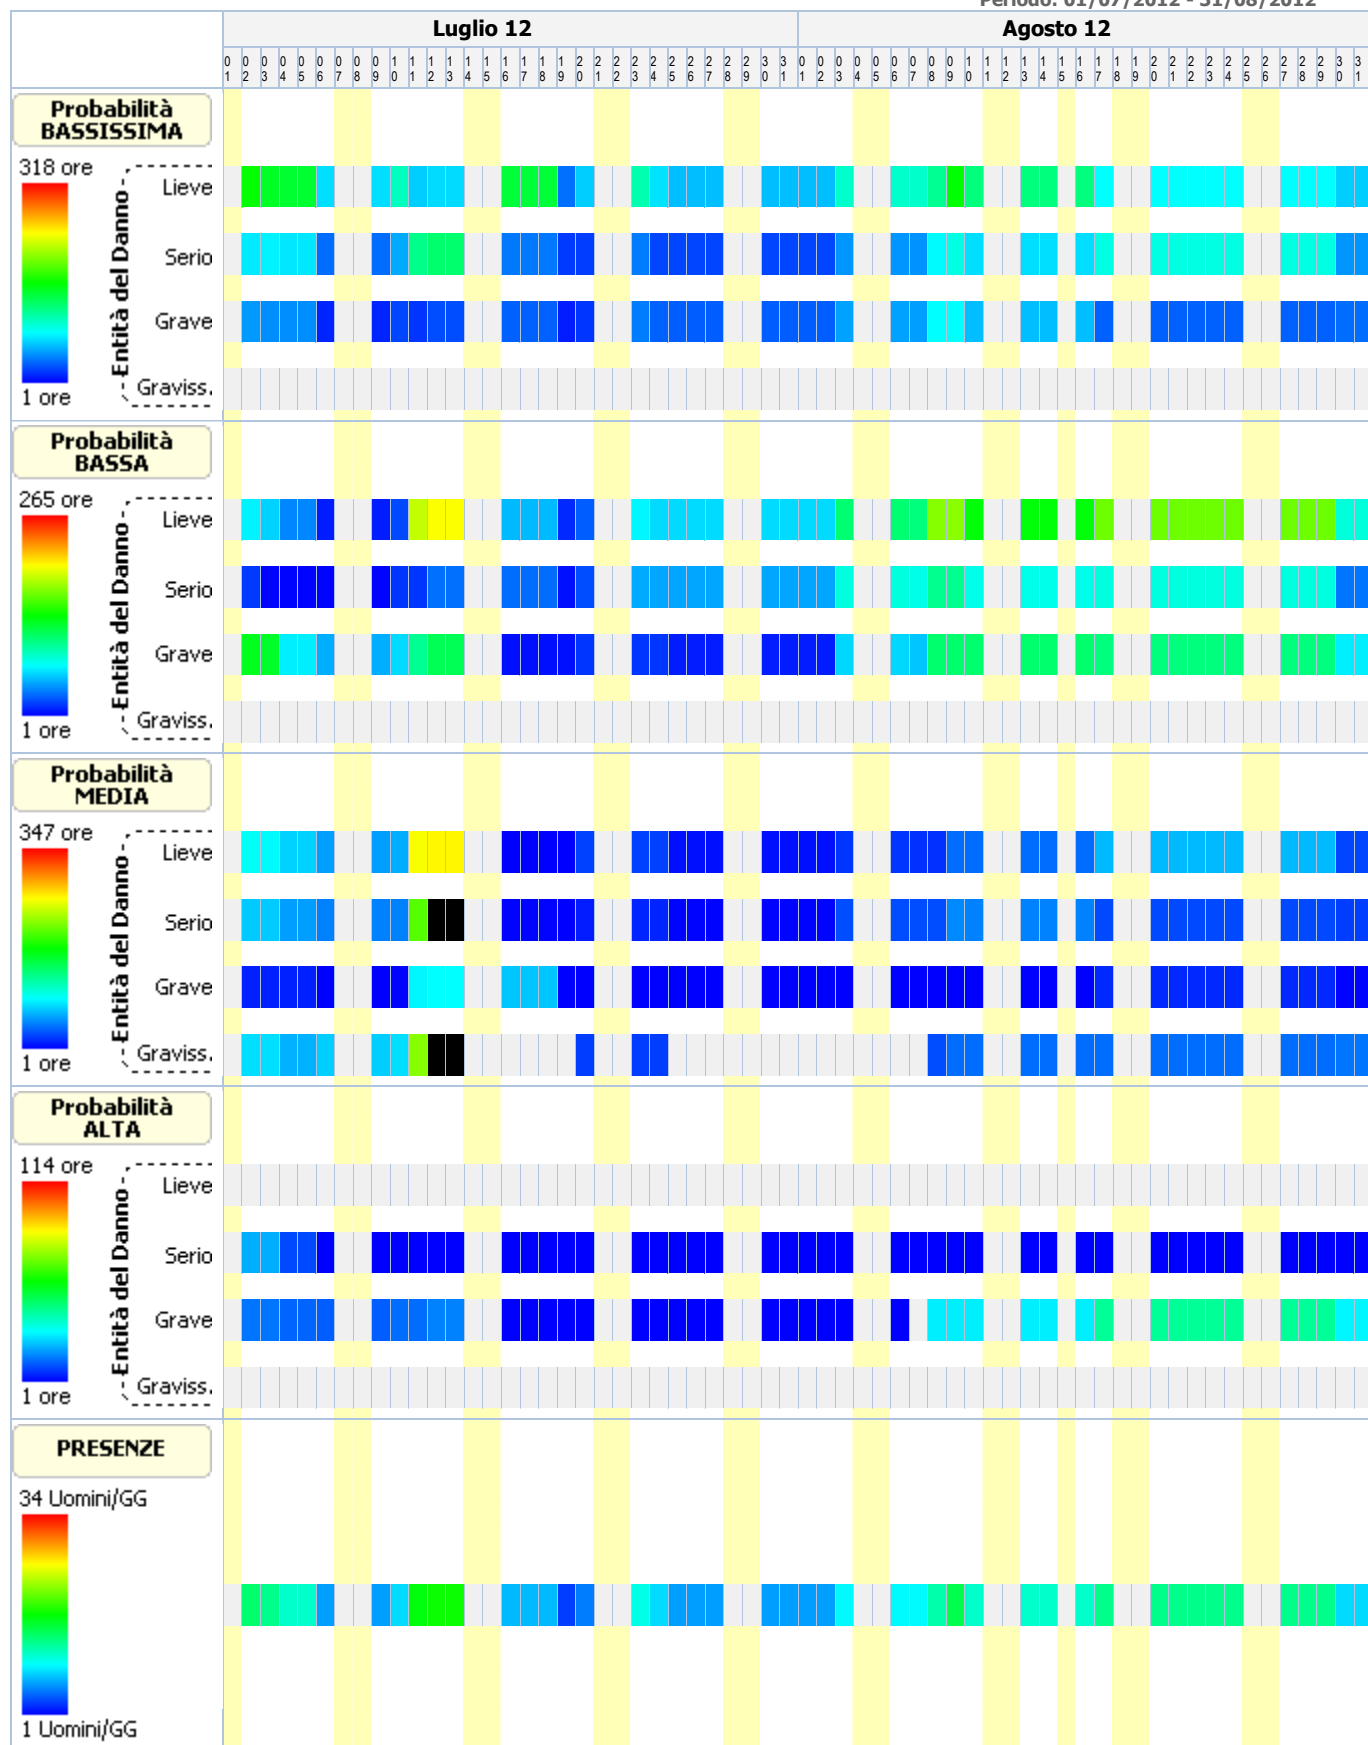

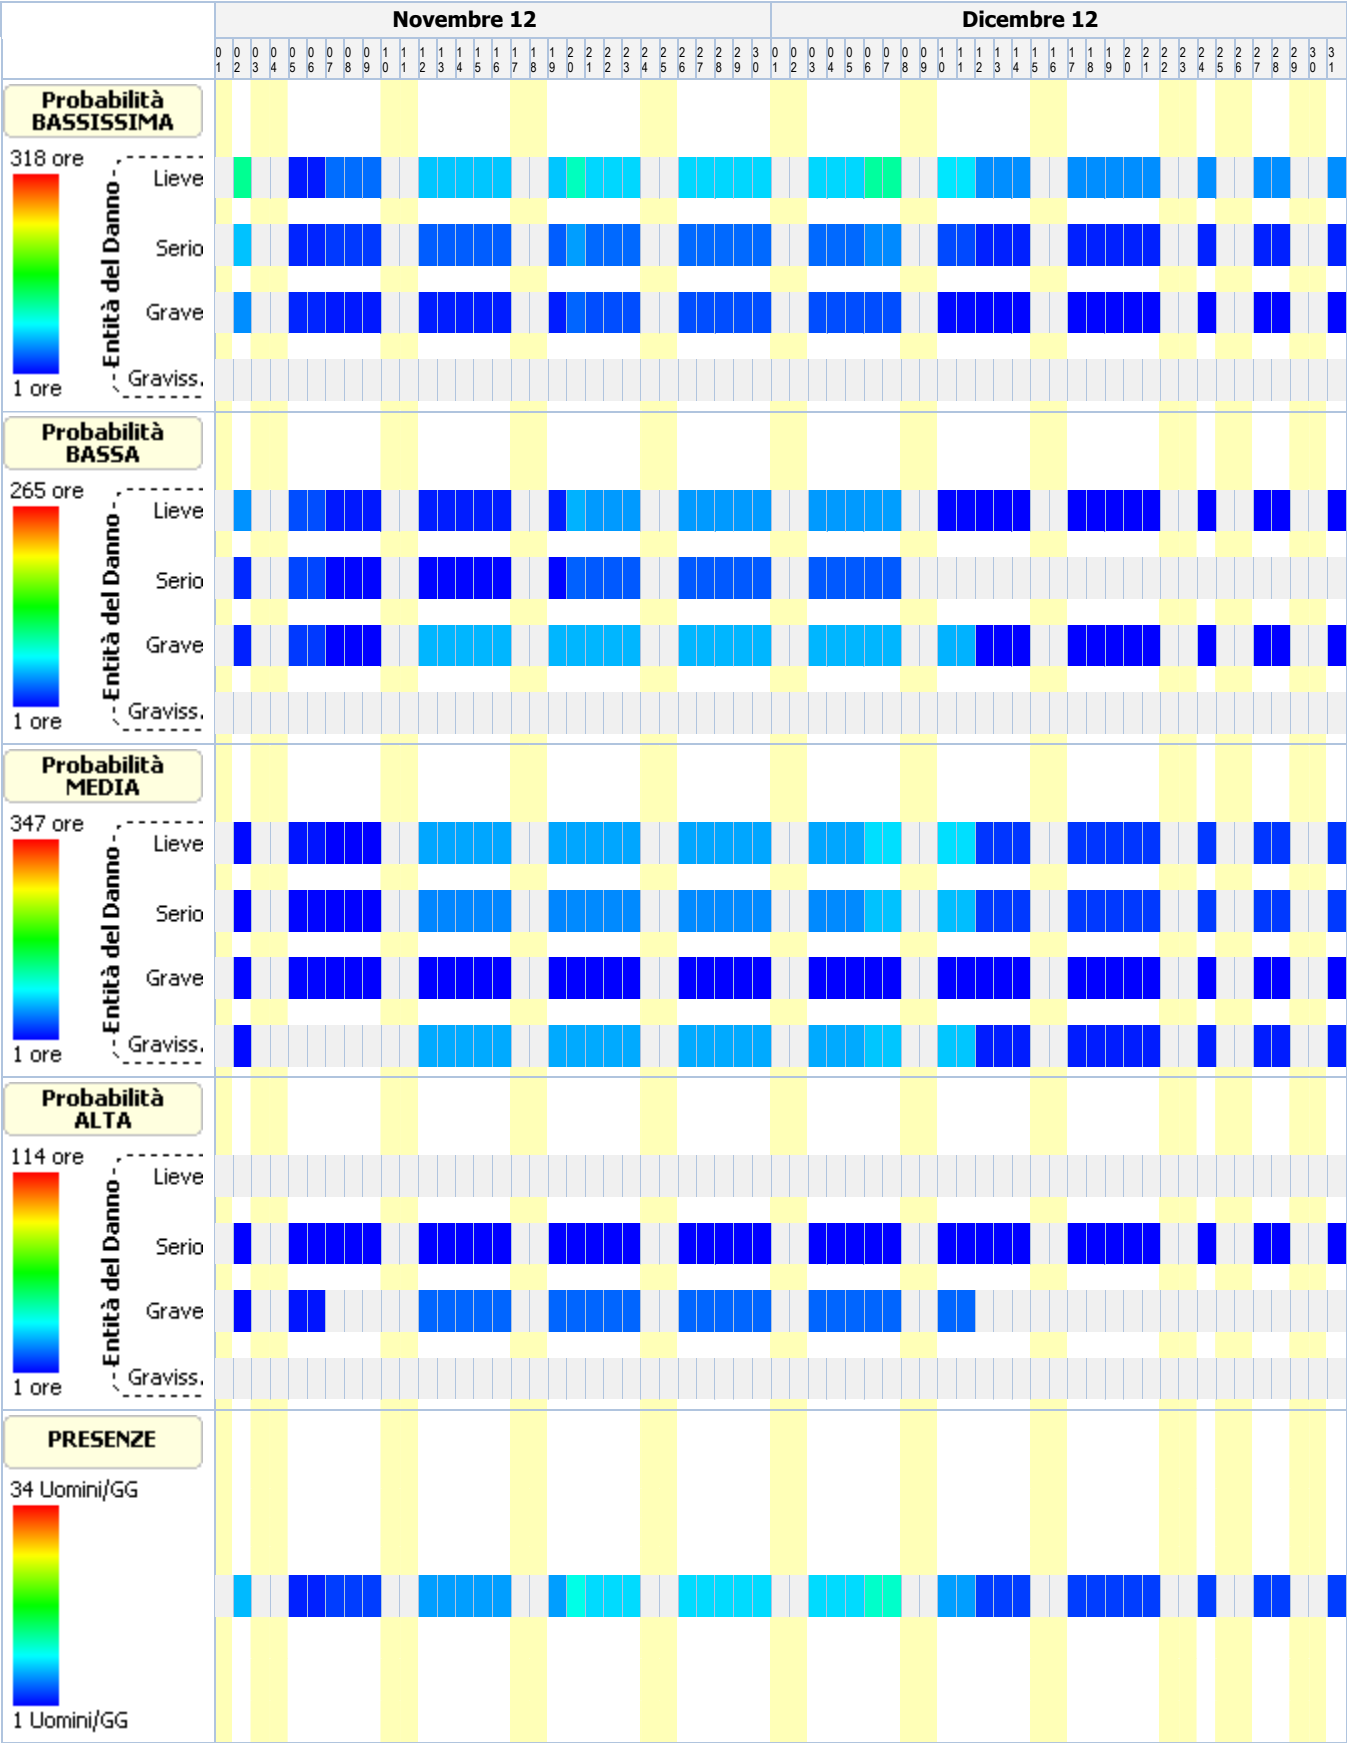

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

Indicazioni dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione del rischio rumore è stata effettuata, relativamente al cantiere sito in TEMPIO (SS) alla VIA PERTINI, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività di costruzioni, sulla scorta di dati derivanti da una serie di rilevazioni condotte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia in numerosi cantieri, uffici, magazzini e officine variamente ubicati a seguito di specifiche ricerche sulla valutazione del rumore durante il lavoro nelle attività edili, realizzate negli anni 1991-1993 ed aggiornate negli anni 1999-2000.

La ricerca condotta dal CPT, ha preso a riferimento, tra gli altri, i seguenti elementi:

- 1) le disposizioni legislative in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- 2) norme di buona tecnica nazionali ed internazionali;

e ha portato alla mappatura della rumorosità nel settore delle costruzioni attraverso una serie di rilevazioni strumentali specifiche in ottemperanza alle norme di buona tecnica.

In tutti i casi i metodi e le apparecchiature utilizzate sono state adattate alle condizioni prevalenti, con particolare riferimento alle seguenti situazioni:

- 1) caratteristiche del rumore misurato;
- 2) durata dell'esposizione a rumore;
- 3) presenza dei fattori ambientali;
- 4) caratteristiche proprie degli apparecchi di misurazione.

La valutazione del rumore riportata di seguito è stata eseguita prendendo in considerazione in particolare:

- 1) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi compresa l'eventuale esposizione a rumore impulsivo;
- 2) i valori limite di esposizione ed i valori, superiori ed inferiori, di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;
- 3) gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore e quelli derivanti da eventuali interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e tra rumore e vibrazioni;
- 4) gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- 5) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori di attrezzature e macchinari in conformità alle vigenti disposizioni in materia e l'eventuale esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- 6) l'eventuale prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre all'orario di lavoro normale;
- 7) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
- 8) la disponibilità di DPI con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Ai fini del calcolo, preventivo, del livello di esposizione personale al rumore dei lavoratori si è proceduto come segue:

- 1) suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere esposti al rischio rumore secondo le mansioni espletate;
- 2) individuazione, per ogni mansione, delle attività svolte e per ognuna di esse del livello di esposizione media equivalente L_{eq} in dB(A) e delle percentuali di tempo dedicato alle attività relative all'esposizione massima settimanale e all'intera durata del cantiere, questi dati sono direttamente deducibili sulla scorta di quelli derivanti dalle rilevazioni condotte dal CPT di Torino ed in particolare dalle schede di valutazione del rumore per gruppi omogenei di lavoratori elaborate dal CPT di Torino;
- 3) calcolo per ciascuna mansione, dei livelli di esposizione personale $L_{EX,8h}$ e $L_{EX,8h (effettivo)}$ in dB(A) riferiti all'attività svolta per la settimana di massima esposizione (art. 188 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81) e all'attività svolta per l'intera durata del cantiere, stima dell'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito scelti.

L'attività di prevenzione e protezione è sempre riferita all'esposizione massima settimanale, a tal fine in base risultati ottenuti dal calcolo del livello di esposizione personale si è individuata per ogni mansione una fascia di appartenenza riferita ai livelli di azione inferiore e superiore. Tutte le disposizioni derivanti dall'attività di prevenzione e protezione sono riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui il presente documento è un allegato.

Rilievi fonometrici: condizioni di misura, punti e metodi di misura, posizionamento del microfono e tempi di misura

Condizioni di misura - I rilievi fonometri sono stati effettuati nelle seguenti condizioni operative:

- 1) reparto a normale regime di funzionamento;
- 2) la macchina in esame in condizioni operative di massima emissione sonora;

Punti e metodi di misura - I rilievi fonometri sono stati effettuati secondo la seguente metodologia:

- 1) fasi di lavoro che prevedono la presenza continuativa degli addetti: le misure sono state effettuate in punti fissi ubicati in corrispondenza della postazione di lavoro occupata dal lavoratore nello svolgimento della propria mansione;
- 2) fasi di lavoro che comportano lo spostamento degli addetti lungo le diverse fonti di rumorosità: le misure sono state effettuate seguendo i movimenti dell'operatore e sono state protratte per un tempo sufficiente a descrivere la variabilità dei livelli sonori.

Posizionamento del microfono:

- 1) fasi di lavoro che non richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono è stato posizionato in corrispondenza della posizione occupata dalla testa del lavoratore;
- 2) fasi di lavoro che richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono è stato posizionato a circa 0,1 metri di fronte all'orecchio esposto al livello più alto di rumore.

Tempi di misura - Per ogni singolo rilievo è stato scelto un tempo di misura congruo al fine di valutare l'esposizione al rumore dei lavoratori. In particolare si considera soddisfatta la condizione suddetta, quando il livello equivalente di pressione sonora si stabilizza entro 0,2 dB(A).

Strumentazione utilizzata

Per le misurazioni e le analisi dei dati rilevati di cui alla presente relazione (anni 1991-1993) sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- 1) analizzatore Real Time Bruel & Kjaer mod. 2143 (analisi in frequenza delle registrazioni su nastro magnetico);

- 2) registratore Marantz CP 230;
- 3) n. 1 fonometro integratore Bruel & Kjaer mod. 2230 matricola 1624440;
- 4) n. 2 fonometri integratori Bruel & Kjaer mod. 2221 matricola 1644549 e matricola 1644550;
- 5) n. 3 microfoni omnidirezionali Bruel & Kjaer:
 - a) mod. 4155 matricola 1643684 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 92011M);
 - b) mod. 4155 matricola 1640487 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 92012M);
 - c) mod. 4155 matricola 1640486 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 92015M);
- 6) n. 1 calibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1234383 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 4.3.1992 (certificato n. 92024C).

Per l’aggiornamento delle misure (anni 1999-2000) sono stati utilizzati:

- 1) n. 1 fonometro integratore Bruel & Kjaer modello 2231 matricola 1674527 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 6.7.1999 (certificato 99/264/F);
- 2) n. 1 microfono omnidirezionale Bruel & Kjaer modello 4155 matricola 1675521 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 6.7.1999 (certificato 99/264/F);
- 3) n. 1 calibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1670857 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 7.7.1999 (certificato 99/265/C);

Il funzionamento degli strumenti è stato controllato prima e dopo ogni ciclo di misura con il calibratore Bruel & Kjaer tipo 4230 citato in precedenza.

La strumentazione utilizzata per l’effettuazione delle misure è stata controllata dal laboratorio I.E.C. di taratura autorizzato con il n. 54/E dal SIT (Servizio di Taratura in Italia) che ha rilasciato i certificati di taratura sopra riportati.

Metodo di calcolo del livello di esposizione personale e del livello di esposizione personale effettivo, stima dell’efficacia dei DPI

Seguendo le indicazioni del CPT di Torino, per il calcolo dell’esposizione personale al rumore è stata utilizzata la seguente espressione che impegna le percentuali di tempo dedicato alle attività, anziché il tempo espresso in ore/minuti:

$$L_{EX,8h} = 10 \log \sum_{i=1}^n \frac{p_i}{100} 10^{0,1L_{eq,i}}$$

dove:

- $L_{EX,8h}$ è il livello di esposizione personale in dB(A) riferiti all’attività svolta per la settimana di massima esposizione o all’attività svolta per l’intera durata del cantiere;
- $L_{eq,i}$ è il livello di esposizione media equivalente L_{eq} in dB(A) prodotto dall’i-esima attività;
- P_i è la percentuale di tempo dedicata all’attività i-esima relativa all’esposizione massima settimanale o all’intera durata del cantiere.

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell’esposizione personale effettiva al rumore l’espressione utilizzata è analoga alla precedente dove, però, nei casi in cui la protezione dell’udito sia obbligatoria si è utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell’attenuazione del DPI scelto. Il metodo di valutazione del livello di pressione acustica ponderata A effettiva a livello dell’orecchio quando si indossa il protettore auricolare utilizzato è il “Metodo controllo HML” definito dalla norma tecnica UNI EN 458 (1995) riportata nell’allegato 1 del D.M. 2/5/2001 – “Individuazione ed uso dei dispositivi di protezione individuale”. A scopo cautelativo, si è utilizzato il valore di attenuazione alle basse frequenze **L** che, notoriamente, è inferiore rispetto al valore **M** e **H**. L’espressione utilizzata per sottrarre l’attenuazione del DPI dai livelli equivalenti è la seguente:

$$L'_{eq\,i} = L_{eq\,i} - L$$

dove:

- $L'_{eq, i}$ è il livello equivalente effettivo, quando si indossa il DPI dell’udito;
- $L_{eq, i}$ è il livello equivalente della rumorosità;
- L** è l’attenuazione del DPI alle basse frequenze, desumibile dai valori H-M-L forniti dal produttore dei DPI.

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN 458, è stata fatta confrontando il livello di esposizione equivalente $L'_{eq\,i}$ con quelli desumibili dalla seguente tabella.

| Livello effettivo all’orecchio in dB(A) | Stima della protezione |
|---|------------------------------|
| Maggiore di Lact | Insufficiente |
| Tra Lact e Lact - 5 | Accettabile |
| Tra Lact - 5 e Lact - 10 | Buona |
| Tra Lact - 10 e Lact - 15 | Accettabile |
| Minore di Lact - 15 | Troppo alta (iperprotezione) |

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’è l’obbligo di utilizzo dei DPI dell’udito. Il livello di azione Lact è stato posto pari a 85 dB(A), esso infatti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81, è il livello oltre il quale il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che siano indossati i DPI.

ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RUMORE



Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa
Distretto di SASSARI



PROGRAMMA DI INTERVENTO DI COSTRUZIONE ALLOGGI E.R.P.
Delibera G.R. n.71/32 del 16/12/2008

PROGETTO

COSTRUZIONE DI N.20 ALLOGGI A TEMPIO loc. Poi e Mantelli

Tav. n°

M

CONTENIMENTO CONSUMO ENERGETICO

Data: Marzo 2011

Il Progettista
(Ing. Gianpaolo Sanna)

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuliano Pazzola)

Il Direttore Generale
(Ing. Sebastiano Bitti)

Comune di TEMPIO PAUSANIA
Provincia di OLBIA TEMPIO

RELAZIONE TECNICA

Rispondenza alle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energetico

Decreto Legislativo 19 agosto 2005 N.192
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 N.311
Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 N.59
(*Recepimento della Direttiva della Comunità Europea 2002/91*)
Decreto Legislativo 30 maggio 2008 N.115
(*Recepimento della Direttiva della Comunità Europea 2006/32*)

OGGETTO: Costruzione n. 20 alloggi di E.R.P.
Finanziamento: Delibera G.R. n. 71/32 del 16/12/2008

PERMESSO DI COSTRUIRE: del / /
D.I.A.: del / /

COMMITTENTE: AREA Distretto di Sassari

marzo 2011

Il Tecnico

| | |
|--|---|
| <p>La presente relazione ed i relativi allegati sono redatti secondo l'Allegato E del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (come modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311) e il D.P.R. 2 aprile 2009 n.59</p> | <p>SPAZIO RISERVATO ALL'U.T.C.</p> <p>Per convalida di avvenuto deposito: Protocollo N..... del</p> <p>TIMBRO E FIRMA</p> |
|--|---|

RELAZIONE TECNICA

OPERE RELATIVE A EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE

*(art.3 comma 1, DD.LLgs.192/2005 e 311/2006
D.Lgs. 115/2008 - D.P.R. 59/2009)*

OGGETTO: Relazione Tecnica ex All.to E DD.LLgs.192/05 e 311/06 - D.Lgs. 115/08 - D.P.R. 59/09: Rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico.

1. INFORMAZIONI GENERALI

- Comune di TEMPIO PAUSANIA.
- Provincia di OLBIA TEMPIO.
- Progetto per la Costruzione n. 20 alloggi di E.R.P.
- Finanziamento: Delibera G.R. n. 71/32 del 16/12/2008 sito in Tempio "Poi-Mantelli" .
- Permesso di Costruire o D.I.A. n. del / / .
- Intervento relativo a: "Edificio di nuova costruzione con relativo impianto".
- L'edificio è costituito in totale da n. 20 unità immobiliari.
- Committente: AREA Distretto di Sassari.
- Progettista dell'isolamento termico dell'edificio: Ufficio Tecnico Distretto di Sassari.
- Direttore dei Lavori dell'isolamento termico dell'edificio: Ufficio Tecnico Distretto di Sassari.
- Progettista degli impianti termici dell'edificio: .
- Direttore dei Lavori degli impianti termici dell'edificio: .

2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:

- N. 3 piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali.
- N. 3 prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi di protezione solare.
- N. elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari.

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ

- I gradi giorno del Comune dell'intervento sono 2 034 GG, determinati in base al D.P.R. 412 del 26/08/93 e successive modifiche ed integrazioni.
- La Zona climatica in cui ricade l'opera in oggetto è "D", pertanto il periodo di riscaldamento previsto per legge è di giorni 166 e precisamente dal 1/11 al 15/4.
- La temperatura minima di progetto dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti è di 1.30 °C.
- Le temperature medie mensili determinate in base alla norma UNI 10349 sono le seguenti:

| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 6.90 | 7.30 | 9.50 | 12.20 | 15.00 | 19.60 | 22.20 | 22.70 | 20.30 | 15.70 | 11.70 | 8.10 |

- Le irradiazioni medie mensili (esprese in MJ/giorno) relative al periodo di riscaldamento determinate in base alla norma UNI 10349 sono le seguenti:

| | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Oriz. |
|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gen | 2.10 | 2.30 | 4.60 | 8.40 | 10.80 | 8.40 | 4.60 | 2.30 | 6.80 |
| Feb | 3.00 | 3.60 | 6.60 | 10.20 | 12.30 | 10.20 | 6.60 | 3.60 | 9.80 |
| Mar | 4.30 | 5.50 | 8.60 | 11.30 | 12.50 | 11.30 | 8.60 | 5.50 | 14.20 |
| Apr | 5.70 | 8.20 | 11.30 | 12.40 | 11.70 | 12.40 | 11.30 | 8.20 | 19.00 |
| Mag | 8.20 | 11.50 | 14.30 | 13.50 | 11.00 | 13.50 | 14.30 | 11.50 | 24.10 |
| Giu | 9.30 | 12.70 | 15.30 | 13.50 | 10.40 | 13.50 | 15.30 | 12.70 | 26.60 |
| Lug | 9.20 | 13.30 | 16.50 | 14.80 | 11.30 | 14.80 | 16.50 | 13.30 | 28.10 |
| Ago | 6.40 | 10.00 | 13.90 | 14.60 | 12.80 | 14.60 | 13.90 | 10.00 | 24.00 |
| Set | 4.90 | 7.50 | 11.90 | 14.50 | 14.70 | 14.50 | 11.90 | 7.50 | 18.60 |
| Ott | 3.60 | 4.60 | 8.30 | 12.30 | 14.40 | 12.30 | 8.30 | 4.60 | 12.60 |
| Nov | 2.30 | 2.50 | 4.90 | 8.70 | 11.10 | 8.70 | 4.90 | 2.50 | 7.50 |
| Dic | 1.90 | 2.00 | 4.00 | 7.60 | 9.80 | 7.60 | 4.00 | 2.00 | 5.80 |

- Le Umidità Relative medie mensili esterne determinate in base alla norma UNI 10349 sono le seguenti:

| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 81.50 | 96.10 | 79.40 | 77.20 | 80.70 | 67.00 | 69.00 | 67.10 | 70.10 | 83.00 | 87.20 | 95.40 |

- La velocità media del vento è 2.00 m/s.

4. DATI TECNICO COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE STRUTTURE

Le principali caratteristiche della costruzione oggetto dell'intervento sono riportate dettagliatamente nel seguito:

EDIFICIO OGGETTO DI CALCOLO: "**Nuovo EOdC.Appartamento PT**"

- L'edificio oggetto del calcolo rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, ai fini dell'art.5, comma 15, del D.P.R. 412 del 26/08/93 e successive modifiche ed integrazioni (utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell'Allegato I, comma 14 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
- Il volume (V) delle parti di edificio abitabili o agibili climatizzate è di 365.50 m³, al lordo delle strutture che li delimitano.
- La superficie (S) esterna che delimita il suddetto volume è di 176.50 m².
- Rapporto S/V è pari a 0.48 m⁻¹.
- La superficie utile dell'edificio (Su) è pari a 88.63 m².
- La classe di permeabilità all'aria dei serramenti esterni è .
- La durata del periodo di raffrescamento è di giorni 112, e precisamente dal 30 Mag al 18 Set
- Il presente "Edificio Oggetto di Calcolo" è composto da n. 1 Zone con le seguenti caratteristiche:
Zona "Civile abitazione AT"
 - Classificazione: E1 (1).
 - Volume netto 239.31 m³.
 - Superficie netta 94,67 m².
 - Valore di progetto della Temperatura interna invernale 20.00 °C.
 - Valore di progetto della Temperatura interna estiva 26.00 °C.

EDIFICIO OGGETTO DI CALCOLO: "**Nuovo EOdC.Appartamento A**"

- L'edificio oggetto del calcolo non rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, ai fini dell'art.5, comma 15, del D.P.R. 412 del 26/08/93 e successive modifiche ed integrazioni (utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell'Allegato I, comma 14 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
- Il volume (V) delle parti di edificio abitabili o agibili climatizzate è di 204.44 m³, al lordo delle strutture che li delimitano.
- La superficie (S) esterna che delimita il suddetto volume è di 107.31 m².

- Rapporto S/V è pari a 0.52 m^{-1} .
- La superficie utile dell'edificio (S_u) è pari a 55.63 m^2 .
- La classe di permeabilità all'aria dei serramenti esterni è .
- La durata del periodo di raffrescamento è di giorni 140, e precisamente dal 14 Mag al 30 Set
- Il presente "Edificio Oggetto di Calcolo" è composto da n. 1 Zone con le seguenti caratteristiche:

Zona "Civile abitazione AP"

- Classificazione: E1 (1).
- Volume netto 150.21 m^3 .
- Superficie netta 56.69 m^2 .
- Valore di progetto della Temperatura interna invernale $20.00 \text{ }^\circ\text{C}$.
- Valore di progetto della Temperatura interna estiva $26.00 \text{ }^\circ\text{C}$.

5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI TERMICI

5.1 Impianti Termici

Le principali caratteristiche degli impianti termici presenti sono elencate dettagliatamente nel seguito:

| |
|--|
| EDIFICIO OGGETTO DI CALCOLO: "Nuovo EOdC.Appartamento PT" |
|--|

Descrizione impianto

- tipologia: ;
- tipo di conduzione prevista: ;
- sistema di generazione: ;
- sistema di termoregolazione: ;
- sistema di contabilizzazione dell'energia termica: ;
- sistema di distribuzione del vettore termico: ;
- sistema di ventilazione forzata: ;
- sistema di accumulo termico: ;
- sistema di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria: ;
- .

Specifiche del generatore di energia "Generatore" a servizio dell'EOdC "Nuovo EOdC.Appartamento PT" in oggetto:

- Tipologia del generatore: condensazione;
- Fluido termovettore: Acqua;
- Valore nominale della potenza termica utile: 24.00 kW;
- % di impegno del generatore per l'EOdC in oggetto: 100.00
- Combustibile utilizzato: Metano ($PCI = 34.54 \text{ MJ/Nm}^3$);
- Rendimento termico utile al 100 % della potenza nominale: valore di progetto 98.70%, valore LIMITE 92.38%;
- Rendimento termico utile al 30 % della potenza nominale: valore di progetto 101.70%, valore LIMITE 98.38%.

Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico:

- Sistema di telegestione dell'impianto termico: ;
- Sistema di regolazione climatica in centrale termica (*(\$?????) solo per impianti centralizzati*): ;
 - Centralina climatica: ;
I numeri dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 h sono: 0;
 - Organi di attuazione: .
- Le zone appartenenti all'EOdC in oggetto , hanno i seguenti sistemi di regolazione e terminali di erogazione:

Zona "Civile abitazione AT"

Regolatori climatici

- Funzionamento continuo;
- Sistema di regolazione:
 - Tipo di regolazione: Manuale (termostato di caldaia);
 - Caratteristiche della regolazione:
- Numero di apparecchi installati: 1;
- Descrizione sintetica delle funzioni: Termostato unità immobiliare (zona);
- Numero dei livelli di programmazione nelle 24 ore: 2;

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente

- Numero di apparecchi installati: 0;
- Descrizione sintetica dei dispositivi: nessun dispositivo installato;

Terminali di erogazione dell'energia termica:

- Numero di apparecchi installati: 5;
- Tipo terminale: Radiatori su parete esterna isolata;
- Potenza termica nominale (W): 0.00.

Apporti interni:

- Apporti Interni 3.91 W/m2 (dati da prospetto 12 UNI/TS 11300-1).;

Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari:

- numero di apparecchi installati: 0;
- nessun dispositivo installato.

Condotti di evacuazione dei prodotti di combustione

Descrizione e caratteristiche principali: .

Sistemi di trattamento dell'acqua:

Tipo di trattamento: .

Specifiche dell'isolamento termico della rete di distribuzione

.

Specifiche della/e pompa/e di circolazione

.

Impianti solari termici

.

Schemi funzionali dell'impianto termico:

Per quanto riguarda lo schema funzionale dell'impianto con dimensionamento delle reti di distribuzione dei fluidi termovettori e delle apparecchiature e con evidenziazione dei dispositivi di regolazione e contabilizzazione, nonché tabella riassuntiva delle apparecchiature con le loro caratteristiche funzionali e di tutti i componenti rilevanti ai fini energetici con i loro dati descrittivi e prestazionali, si rimanda agli elaborati grafici allegati alla presente relazione ed in seguito elencati.

| |
|---|
| EDIFICIO OGGETTO DI CALCOLO: "Nuovo EOdC.Appartamento A" |
|---|

Descrizione impianto

- tipologia: ;
- tipo di conduzione prevista: ;
- sistema di generazione: ;
- sistema di termoregolazione: ;
- sistema di contabilizzazione dell'energia termica: ;
- sistema di distribuzione del vettore termico: ;
- sistema di ventilazione forzata: ;
- sistema di accumulo termico: ;
- sistema di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria: ;
- .

Specifiche del generatore di energia "Generatore" a servizio dell'EOdC "Nuovo EOdC.Appartamento A" in oggetto:

- Tipologia del generatore: condensazione;
- Fluido termovettore: Acqua;
- Valore nominale della potenza termica utile: 24.00 kW;
- % di impegno del generatore per l'EOdC in oggetto: 100.00
- Combustibile utilizzato: Metano ($PCI = 34.54 \text{ MJ/Nm}^3$);
- Rendimento termico utile al 100 % della potenza nominale: valore di progetto 98.70%, valore LIMITE 92.38%;
- Rendimento termico utile al 30 % della potenza nominale: valore di progetto 101.70%, valore LIMITE 98.38%.

Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico:

- Sistema di telegestione dell'impianto termico: ;
- Sistema di regolazione climatica in centrale termica ;
 - Centralina climatica: ;
I numeri dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 h sono: 0;
- Organi di attuazione: .

- Le zone appartenenti all'EODC in oggetto , hanno i seguenti sistemi di regolazione e terminali di erogazione:

Zona "Civile abitazione AP"

Regolatori climatici

- Funzionamento continuo;
- Sistema di regolazione:
 - Tipo di regolazione: Manuale (termostato di caldaia);
 - Caratteristiche della regolazione:
- Numero di apparecchi installati: 1;
- Descrizione sintetica delle funzioni: Termostato unità immobiliare (zona);
- Numero dei livelli di programmazione nelle 24 ore: 2;

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente

- Numero di apparecchi installati: 0;
- Descrizione sintetica dei dispositivi: nessun dispositivo installato;

Terminali di erogazione dell'energia termica:

- Numero di apparecchi installati: 5;
- Tipo terminale: Radiatori su parete esterna isolata;
- Potenza termica nominale (W): 0.00.

Apporti interni:

- Apporti Interni 4.43 W/m2 (dati da prospetto 12 UNI/TS 11300-1).;

Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari:

- numero di apparecchi installati: 0;
- nessun dispositivo installato.

Condotti di evacuazione dei prodotti di combustione

Descrizione e caratteristiche principali: .

Sistemi di trattamento dell'acqua:

Tipo di trattamento: .

Specifiche dell'isolamento termico della rete di distribuzione

.

Specifiche della/e pompa/e di circolazione

.

Impianti solari termici

.

Schemi funzionali dell'impianto termico:

Per quanto riguarda lo schema funzionale dell'impianto con dimensionamento delle reti di distribuzione dei fluidi termovettori e delle apparecchiature e con evidenziazione dei dispositivi di regolazione e contabilizzazione, nonché tabella riassuntiva delle apparecchiature con le loro caratteristiche funzionali e di tutti i componenti rilevanti ai fini energetici con i loro dati descrittivi e prestazionali, si rimanda agli elaborati grafici allegati alla presente relazione ed in seguito elencati.

5.2 Impianti Fotovoltaici**5.3 Altri Impianti**

\$

6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

I principali risultati dei calcoli della costruzione oggetto dell'intervento sono riportati di seguito dettagliatamente:

EDIFICIO OGGETTO DI CALCOLO: **"Nuovo EOdC.Appartamento PT"**

Involucro edilizio e ricambi d'aria

Nelle schede in allegato alla presente relazione, sono riportate le caratteristiche di tutte le strutture relative all'intervento oggetto della presente verifica, corredate dai confronti con i relativi valori limite prescritti dalla normativa vigente. In particolare, sono fornite:

- Le caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale dei componenti opachi dell'involucro edilizio;
- Le caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio;
- Le caratteristiche dei ponti termici presenti;
- Le caratteristiche termiche dei componenti opachi divisori tra edifici o unità immobiliari confinanti.

Per i dati relativi ai ricambi d'aria, si rimanda ai risultati di calcolo delle Zone.

Risultati di calcolo relativi alle Zone:

Zona "Civile abitazione AT"

Ventilazione:

- Naturale - Numeri di ricambi d'aria [1/h]: 0.30
- Meccanica: Assente

Valore dei Rendimenti stagionali di progetto:

- Rendimento di Emissione (**EtaEh**): 92.00%.
- Rendimento di Regolazione (**EtaRh**):

| | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EtaRh | 51.61 | 64.61 | 65.92 | 60.88 | 50.35 | 39.13 |
| EtaRh = Rendimento Regolazione espresso in percentuale. | | | | | | |

Risultati di calcolo relativi all'EOdC "Nuovo EOdC.Appartamento PT", oggetto del calcolo:

Valore dei Rendimenti medi stagionali di progetto

- Rendimento Globale (**EtaGh**)

Valore di progetto 49.53%;
 Valore LIMITE 0.00%;

- Rendimento di Produzione (**EtaPh**): 92.01%;
- Rendimento di Emissione (**EtaEh**): *vedi i valori riportati per le singole ZONE;*
- Rendimento di Regolazione (**EtaRh**): *vedi i valori riportati per le singole ZONE;*
- Rendimento di Distribuzione (**EtaDh**):

| | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| etaDh | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
| etaDh = Rendimento Distribuzione espresso in percentuale. | | | | | | |

Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPI)

- Metodo di calcolo utilizzato: Il calcolo è stato eseguito secondo quanto prescritto nel D.Lgs.192/2005 (in particolare negli Allegati C, E, ed I) come modificato dal D.Lgs.311/2006, dal D.Lgs.115/2008 e dal D.P.R.59/2009, e secondo le più recenti norme tecniche vigenti in materia (le cui principali sono: UNI/TS 11300-1, UNI/TS 11300-2, UNI EN ISO 13790; UNI EN ISO 6946, UNI EN ISO 13789, UNI EN ISO 10077, UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 13370, UNI 8852, UNI 10339, UNI EN ISO 13788, UNI EN ISO 13786, UNI 10349)
- Valore di progetto (EPI): 35.08 kWh/m²anno
- Valore LIMITE (EPI_Limite): 48.91 kWh/m²anno
- Fabbisogno di combustibile: 308.95 Nm³
- Fabbisogno di energia elettrica da rete: 65.32 kWh
- Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale: 0.00 kWh

Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale

- Valore di progetto: 15.06 [kJ/m³GG]

Indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva dell'involucro edilizio (EPE,invol)

- Metodo di calcolo utilizzato: Il calcolo è stato eseguito secondo quanto prescritto nel D.Lgs. 192/2005 (in particolare negli Allegati C, E, ed I) come modificato dal D.Lgs.311/2006, dal D.Lgs.115/2008 e dal D.P.R.59/2009, e secondo le più recenti norme tecniche vigenti in materia, precedentemente indicate.
- Valore di progetto (EPE, invol): 9.322 kWh/m²anno
- Valore LIMITE (EPE, invol_Limite): 30.000 kWh/m²anno

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria

- | | |
|---|------------------------|
| • Tipo di combustibile: | Metano |
| • Fabbisogno di combustibile: | 195.81 Nm ³ |
| • Fabbisogno di energia elettrica da rete: | 230.67 kWh |
| • Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale: | 15.00 kWh |

Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria

.

Impianti fotovoltaici

.

EDIFICIO OGGETTO DI CALCOLO: "**Nuovo EOdC.Appartamento A**"

Involucro edilizio e ricambi d'aria

Nelle schede in allegato alla presente relazione, sono riportate le caratteristiche di tutte le strutture relative all'intervento oggetto della presente verifica, corredate dai confronti con i relativi valori limite prescritti dalla normativa vigente. In particolare, sono fornite:

- Le caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale dei componenti opachi dell'involucro edilizio;
- Le caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio;
- Le caratteristiche dei ponti termici presenti;
- Le caratteristiche termiche dei componenti opachi divisori tra edifici o unità immobiliari confinanti.

Per i dati relativi ai ricambi d'aria, si rimanda ai risultati di calcolo delle Zone.

Risultati di calcolo relativi alle Zone:

Zona "Civile abitazione AP"

Ventilazione:

- Naturale - Numeri di ricambi d'aria [1/h]: 0.30
- Meccanica: Assente

Valore dei Rendimenti stagionali di progetto:

- Rendimento di Emissione (**EtaEh**): 98.00%.

- Rendimento di Regolazione (**EtaRh**):

| | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EtaRh | 55.63 | 67.44 | 68.85 | 64.57 | 54.48 | 41.87 |
| EtaRh = Rendimento Regolazione espresso in percentuale. | | | | | | |

Risultati di calcolo relativi all'EODC "Nuovo EODC.Appartamento A", oggetto del calcolo:

Valore dei Rendimenti medi stagionali di progetto

- Rendimento Globale (**EtaGh**)
Valore di progetto 48.58%;
Valore LIMITE 0.00%;
- Rendimento di Produzione (**EtaPh**): 89.87%;
- Rendimento di Emissione (**EtaEh**): *vedi i valori riportati per le singole ZONE;*
- Rendimento di Regolazione (**EtaRh**): *vedi i valori riportati per le singole ZONE;*
- Rendimento di Distribuzione (**EtaDh**):

| | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| etaDh | 88.18 | 93.30 | 93.99 | 93.38 | 90.04 | 73.74 |
| etaDh = Rendimento Distribuzione espresso in percentuale. | | | | | | |

Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPI)

- Metodo di calcolo utilizzato: Il calcolo è stato eseguito secondo quanto prescritto nel D.Lgs.192/2005 (in particolare negli Allegati C, E, ed I) come modificato dal D.Lgs.311/2006, dal D.Lgs.115/2008 e dal D.P.R.59/2009, e secondo le più recenti norme tecniche vigenti in materia (le cui principali sono: UNI/TS 11300-1, UNI/TS 11300-2, UNI EN ISO 13790; UNI EN ISO 6946, UNI EN ISO 13789, UNI EN ISO 10077, UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 13370, UNI 8852, UNI 10339, UNI EN ISO 13788, UNI EN ISO 13786, UNI 10349)
- Valore di progetto (EPI): 44.64 kWh/m²anno
- Valore LIMITE (EPI_Limite): 57.54 kWh/m²anno
- Fabbisogno di combustibile: 236.76 Nm³
- Fabbisogno di energia elettrica da rete: 95.67 kWh
- Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale: 15.00 kWh

Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale

- Valore di progetto: 21.50 [kJ/m³GG]

Indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva dell'involucro edificio (E_{Pe,invol})

- Metodo di calcolo utilizzato: Il calcolo è stato eseguito secondo quanto prescritto nel D.Lgs. 192/2005 (in particolare negli Allegati C, E, ed I) come modificato dal D.Lgs.311/2006, dal D.Lgs.115/2008 e dal D.P.R.59/2009, e secondo le più recenti norme tecniche vigenti in materia, precedentemente indicate.
- Valore di progetto (E_{Pe, invol}): 18.092 kWh/m²anno
- Valore LIMITE (E_{Pe, invol_Limite}): 30.000 kWh/m²anno

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria

- Tipo di combustibile: Metano
- Fabbisogno di combustibile: 168.98 Nm³
- Fabbisogno di energia elettrica da rete: 97.67 kWh
- Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale: 15.00 kWh

Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria

.

Impianti fotovoltaici

.

**7. SPECIFICI ELEMENTI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE
A NORME FISSATE DAL REGOLAMENTO**

8. VALUTAZIONI SPECIFICHE PER L'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

9. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (\$?????\$ *Elenco indicativo*)

- N. 3 piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali.
- N. 3 prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare.(\$?????\$ *Completi di documentazione relativa alla marcatura CE*)
- N. elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari.
- N. 1 fascicolo schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analogia voce del paragrafo"Dati relativi agli impianti".
- N. 1 fascicolo schede con indicazione delle caratteristiche termiche, igrometriche e massa efficace dei componenti opachi dell'involucro edilizio.
- N. 1 fascicolo schede con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio.

10. DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA

Il sottoscritto Geom Sebastiano Monti , funzionari dell'ufficio Tecnico Distretto di Sassari, essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192 come modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 (di recepimento della Direttiva 2002/91/CE),

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che:

- a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192 come modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 (recepimento della Direttiva 2002/91/CE), al Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.115 e al D.P.R. 2 aprile 2009 n.59;
- b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.

marzo 2011

Il progettista


(timbro e firma)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: MR.01.021

Descrizione Struttura: Struttura verticale in blocco-cassero in conglomerato di legno e cemento e cls e isolante termo-acustico in EPS e grafite da cm 6, inserito nel blocco.

| N. | DESCRIZIONE STRATO (dall'interno all'esterno) | s [mm] | lambda [W/mK] | C [W/m²K] | M.S. [kg/m²] | P<50*10 ¹² [kg/msPa] | C.S. [J/kgK] | R [m²K/W] |
|---|---|--|------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Adduttanza Interna | 0 | | 7.700 | | | 0 | 0.130 |
| 2 | Intonaco di calce e gesso. | 15 | 0.700 | 46.667 | 21.00 | 18.000 | 1000 | 0.021 |
| 3 | Abete (flusso perpendicolare alle fibre). | 40 | 0.120 | 3.000 | 18.00 | 0.300 | 1700 | 0.333 |
| 4 | CLS di aggregati naturali - a struttura chiusa - pareti protette - mv.2400. | 150 | 1.909 | 12.727 | 360.00 | 1.300 | 1000 | 0.079 |
| 5 | Polistirene espanso e grafite - mv.70 | 70 | 0.028 | 0.400 | 4.90 | 1.560 | 1200 | 2.500 |
| 6 | Abete (flusso perpendicolare alle fibre). | 40 | 0.120 | 3.000 | 18.00 | 0.300 | 1700 | 0.333 |
| 7 | Malta di calce o di calce e cemento. | 15 | 0.900 | 60.000 | 27.00 | 8.500 | 1000 | 0.017 |
| 8 | Adduttanza Esterna | 0 | | 25.000 | | | 0 | 0.040 |
| RESISTENZA = 3.453 m²K/W | | | | | | TRASMITTANZA = 0.290 W/m²K | | |
| SPESSORE = 330 mm | | CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 36.531 kJ/m²K | | | | MASSA SUPERFICIALE = 401 kg/m² | | |
| TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.02 W/m²K | | FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.07 | | | | SFASAMENTO = 11.22 h | | |
| s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10 ¹² = Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmissione = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i.. | | | | | | | | |

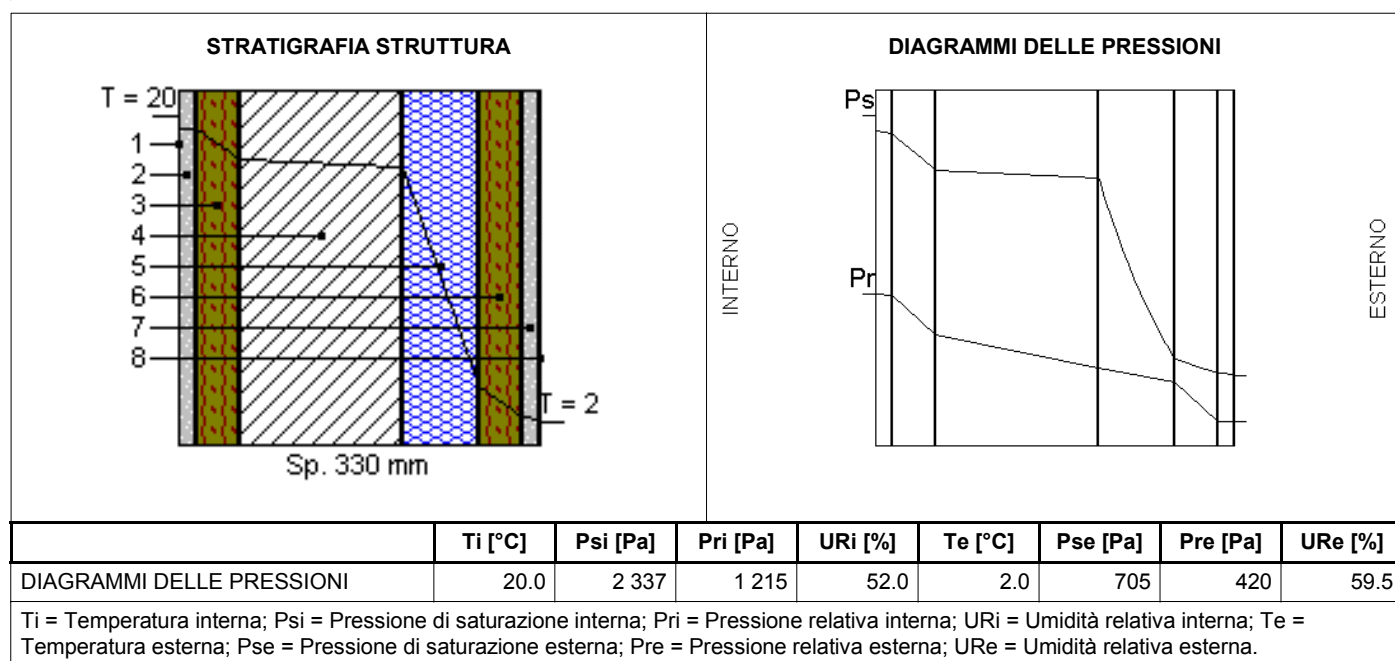


CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: MR.01.001

Descrizione Struttura: Tamponatura con camera d' aria, realizzata con entrambi i paramenti costituiti da mattoni forati .

| N. | DESCRIZIONE STRATO (dall'interno all'esterno) | s [mm] | lambda [W/mK] | C [W/m²K] | M.S. [kg/m²] | P<50*10 ¹² [kg/msPa] | C.S. [J/kgK] | R [m²K/W] |
|---|---|--|------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Adduttanza Interna | 0 | | 7.700 | | | 0 | 0.130 |
| 2 | Intonaco di calce e gesso. | 10 | 0.700 | 70.000 | 14.00 | 18.000 | 1000 | 0.014 |
| 3 | Mattone forato di laterizio (250*80*250) spessore 80 | 80 | | 5.000 | 62.00 | 20.570 | 840 | 0.200 |
| 4 | Polistirene espanso in lastre stampate - mv.30 | 40 | 0.039 | 0.962 | 1.20 | 3.150 | 1200 | 1.039 |
| 5 | Malta di calce o di calce e cemento. | 5 | 0.900 | 180.000 | 9.00 | 8.500 | 1000 | 0.006 |
| 6 | Mattone semipieno di laterizio (250*120*50) spessore 120 | 120 | | 5.263 | 181.00 | 20.570 | 840 | 0.190 |
| 7 | Malta di calce o di calce e cemento. | 15 | 0.900 | 60.000 | 27.00 | 8.500 | 1000 | 0.017 |
| 8 | Adduttanza Esterna | 0 | | 25.000 | | | 0 | 0.040 |
| RESISTENZA = 1.635 m²K/W | | | | | | TRASMITTANZA = 0.611 W/m²K | | |
| SPESSORE = 270 mm | | CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 48.789 kJ/m²K | | | | MASSA SUPERFICIALE = 253 kg/m² | | |
| TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.28 W/m²K | | FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.46 | | | | SFASAMENTO = 8.05 h | | |

s = Spessore dello strato; λ = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; $P < 50 \cdot 10^{-12}$ = Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmissione = Valori di resistenza e trasmissanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i.

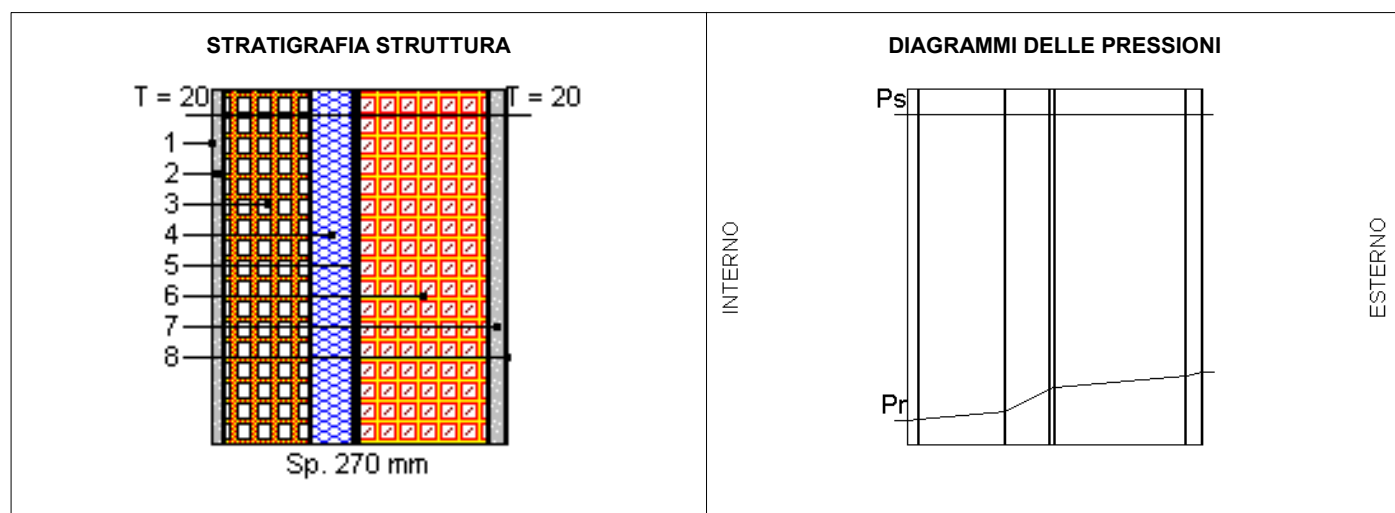

| | Ti [°C] | Psi [Pa] | Pri [Pa] | URi [%] | Te [°C] | Pse [Pa] | Pre [Pa] | URe [%] |
|---------------------------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI | 20.0 | 2 337 | 1 215 | 52.0 | 20.0 | 2 337 | 1 390 | 59.5 |

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: MR.01.018

Descrizione Struttura: Parete per divisori interni realizzata con tavella in laterizio a due fori

| N. | DESCRIZIONE STRATO (dall'interno all'esterno) | s [mm] | lambda [W/mK] | C [W/m²K] | M.S. [kg/m²] | P<50*10 ¹² [kg/msPa] | C.S. [J/kgK] | R [m²K/W] |
|----|---|-----------|------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Adduttanza Interna | 0 | | 7.700 | | | 0 | 0.130 |
| 2 | Intonaco di calce e gesso. | 10 | 0.700 | 70.000 | 14.00 | 18.000 | 1000 | 0.014 |
| 3 | Mattone forato di laterizio (250*80*250) spessore 80 | 80 | | 5.000 | 62.00 | 20.570 | 840 | 0.200 |
| 4 | Intonaco di calce e gesso. | 10 | 0.700 | 70.000 | 14.00 | 18.000 | 1000 | 0.014 |
| 5 | Adduttanza Esterna | 0 | | 25.000 | | | 0 | 0.040 |

RESISTENZA = 0.398 m²K/W

SPESSORE = 100 mm

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 2.39 W/m²K

CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 29.623 kJ/m²K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.95


TRASMITTANZA = 2.510 W/m²K

MASSA SUPERFICIALE = 62 kg/m²


SFASAMENTO = 1.72 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmissione = Valori di resistenza e trasmissione reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA

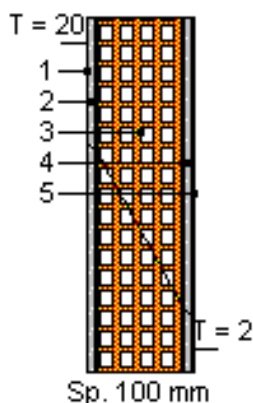

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

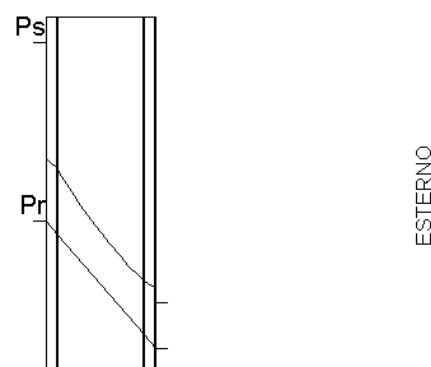

| | Ti [°C] | Psi [Pa] | Pri [Pa] | URi [%] | Te [°C] | Pse [Pa] | Pre [Pa] | URe [%] |
|---------------------------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI | 20.0 | 2 337 | 1 215 | 52.0 | 2.0 | 705 | 420 | 59.5 |

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: SL.01.001
Descrizione Struttura: Solaio interpiano - non isolato

| N. | DESCRIZIONE STRATO (da superiore a inferiore) | s [mm] | lambda [W/mK] | C [W/m²K] | M.S. [kg/m²] | P<50*10 ¹² [kg/msPa] | C.S. [J/kgK] | R [m²K/W] |
|----|--|-----------|------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Adduttanza Superiore | 0 | | 7.700 | | | 0 | 0.130 |
| 2 | Piastrelle. | 10 | 1.000 | 100.000 | 23.00 | 0.940 | 840 | 0.010 |
| 3 | Malta di cemento. | 90 | 1.400 | 15.556 | 180.00 | 8.500 | 1000 | 0.064 |
| 4 | Blocco da solaio di laterizio (495*160*250) spessore 180 | 180 | | 3.333 | 171.00 | 19.000 | 840 | 0.300 |
| 5 | Intonaco di calce e gesso. | 20 | 0.700 | 35.000 | 28.00 | 18.000 | 1000 | 0.029 |
| 6 | Adduttanza Inferiore | 0 | | 25.000 | | | 0 | 0.040 |

RESISTENZA = 0.573 m²K/W

CAPACITA' TERMICA AREICA (sup) = 82.275 kJ/m²K

TRASMITTANZA = 1.746 W/m²K

SPESSORE = 300 mm

CAPACITA' TERMICA AREICA (inf) = 83.034 kJ/m²K

MASSA SUPERFICIALE = 374 kg/m²


TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.66 W/m²K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.38


SFASAMENTO = 7.82 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA

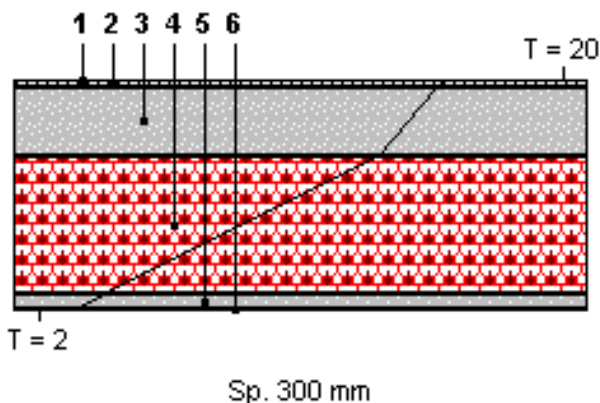

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

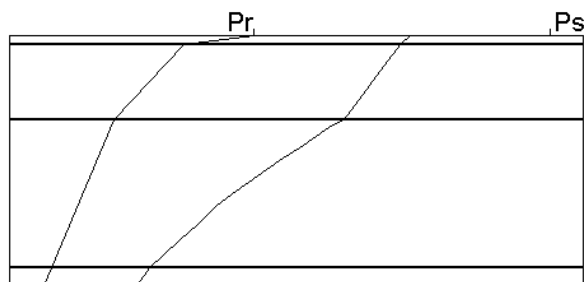

| | Ts [°C] | Pss [Pa] | Prs [Pa] | URs [%] | Ti [°C] | Psi [Pa] | Pri [Pa] | URi [%] |
|---------------------------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI | 20.0 | 2 337 | 1 215 | 52.0 | 2.0 | 705 | 420 | 59.5 |


Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidità superiore; Ti = Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidità inferiore.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: SL.02.001
Descrizione Struttura: Solaio di calpestio, isolato all'intradosso.

| N. | DESCRIZIONE STRATO (da superiore a inferiore) | s [mm] | lambda [W/mK] | C [W/m²K] | M.S. [kg/m²] | P<50*10 ¹² [kg/msPa] | C.S. [J/kgK] | R [m²K/W] |
|---|--|--|------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Adduttanza Superiore | 0 | | 7.700 | | | 0 | 0.130 |
| 2 | Piastrelle. | 10 | 1.000 | 100.000 | 23.00 | 0.940 | 840 | 0.010 |
| 3 | Malta di cemento. | 80 | 1.400 | 17.500 | 160.00 | 8.500 | 1000 | 0.057 |
| 4 | Blocco da solaio di laterizio (495*160*250) spessore 180 | 180 | | 3.333 | 171.00 | 19.000 | 840 | 0.300 |
| 5 | Polistirene espanso in lastre stampate - mv.30 | 60 | 0.039 | 0.642 | 1.80 | 3.150 | 1200 | 1.558 |
| 6 | Intonaco di calce e gesso. | 20 | 0.700 | 35.000 | 28.00 | 18.000 | 1000 | 0.029 |
| 7 | Adduttanza Inferiore | 0 | | 25.000 | | | 0 | 0.040 |
| RESISTENZA = 2.124 m²K/W | | CAPACITA' TERMICA AREICA (sup) = 76.414 kJ/m²K | | | | TRASMITTANZA = 0.471 W/m²K | | |
| SPESSORE = 350 mm | | CAPACITA' TERMICA AREICA (inf) = 30.359 kJ/m²K | | | | MASSA SUPERFICIALE = 356 kg/m² | | |
| TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.09 W/m²K | | FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.20 | | | | SFASAMENTO = 9.62 h | | |

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

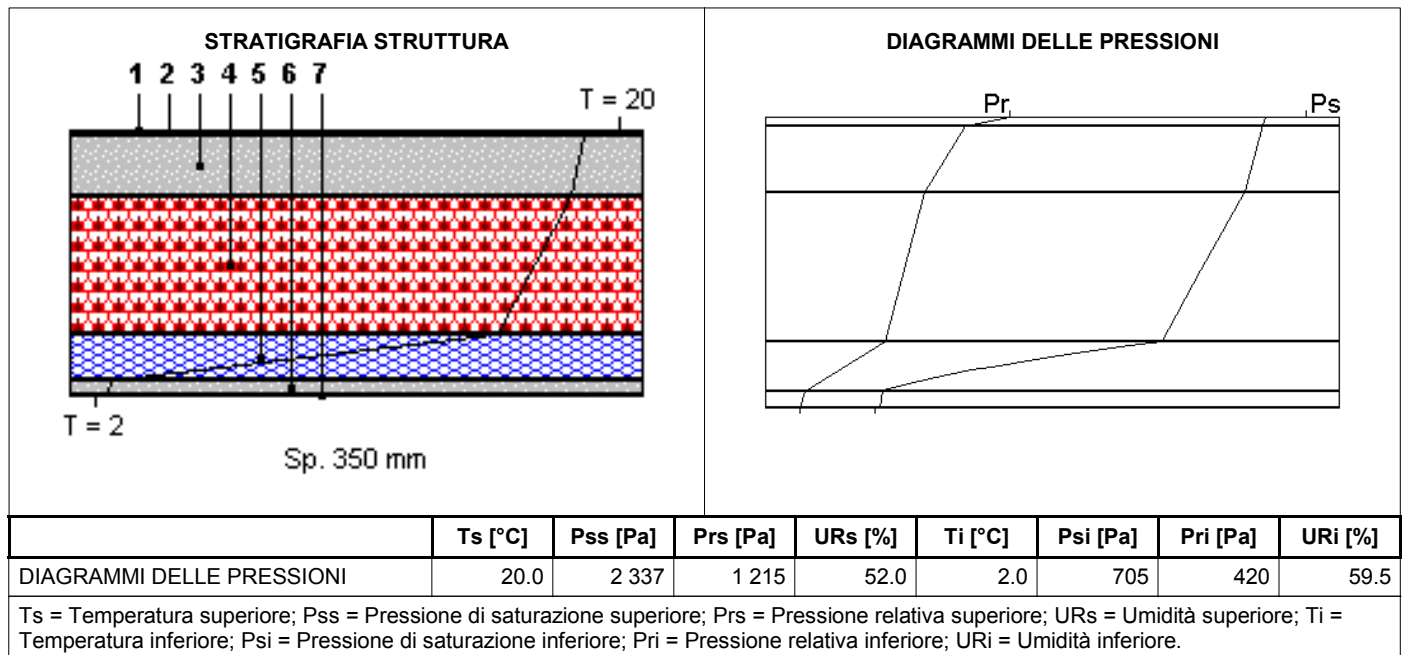


CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: SL.03.001
Descrizione Struttura: Solaio di copertura, con isolamento termico.

| N. | DESCRIZIONE STRATO (da superiore a inferiore) | s [mm] | lambda [W/mK] | C [W/m²K] | M.S. [kg/m²] | P<50*10 ¹² [kg/msPa] | C.S. [J/kgK] | R [m²K/W] |
|---|--|--|------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Adduttanza Superiore | 0 | | 7.700 | | | 0 | 0.130 |
| 2 | Malta di cemento. | 10 | 1.400 | 140.000 | 20.00 | 8.500 | 1000 | 0.007 |
| 3 | Polistirene espanso in lastre stampate - mv.30 | 100 | 0.039 | 0.385 | 3.00 | 3.150 | 1200 | 2.597 |
| 4 | Malta di cemento. | 30 | 1.400 | 46.667 | 60.00 | 8.500 | 1000 | 0.021 |
| 5 | Blocco da solaio di laterizio (495*160*250) spessore 180 | 180 | | 3.333 | 171.00 | 19.000 | 840 | 0.300 |
| 6 | Intonaco di calce e gesso. | 10 | 0.700 | 70.000 | 14.00 | 18.000 | 1000 | 0.014 |
| 7 | Adduttanza Inferiore | 0 | | 25.000 | | | 0 | 0.040 |
| RESISTENZA = 3.110 m²K/W | | CAPACITA' TERMICA AREICA (sup) = 21.928 kJ/m²K | | | | TRASMITTANZA = 0.322 W/m²K | | |
| SPESSORE = 330 mm | | CAPACITA' TERMICA AREICA (inf) = 76.372 kJ/m²K | | | | MASSA SUPERFICIALE = 234 kg/m² | | |
| TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.10 W/m²K | | FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.31 | | | | SFASAMENTO = 8.14 h | | |


s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

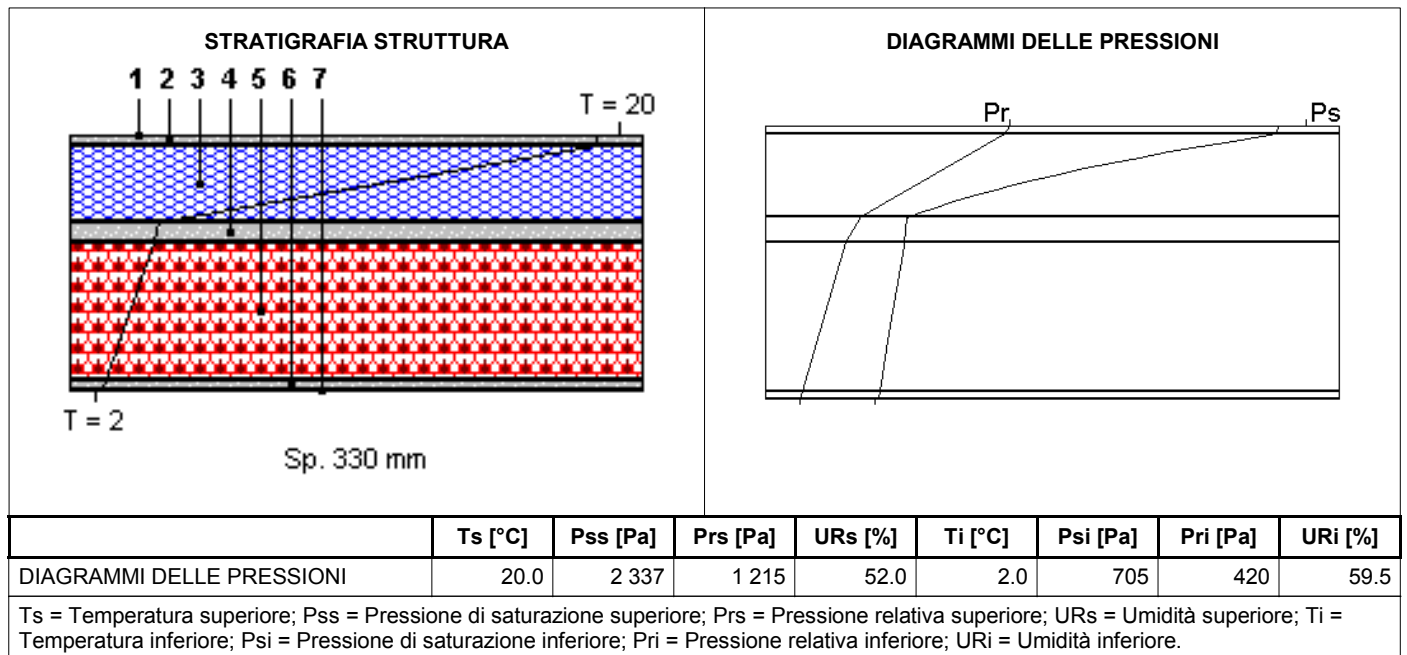

PONTE TERMICO

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:
Trasmittanza Lineare:

PT.B2
Ponte Termico di tipo balconi e poggiali B2 come indicato nella UNI EN ISO 14683 : 2008
1.05 W/mK

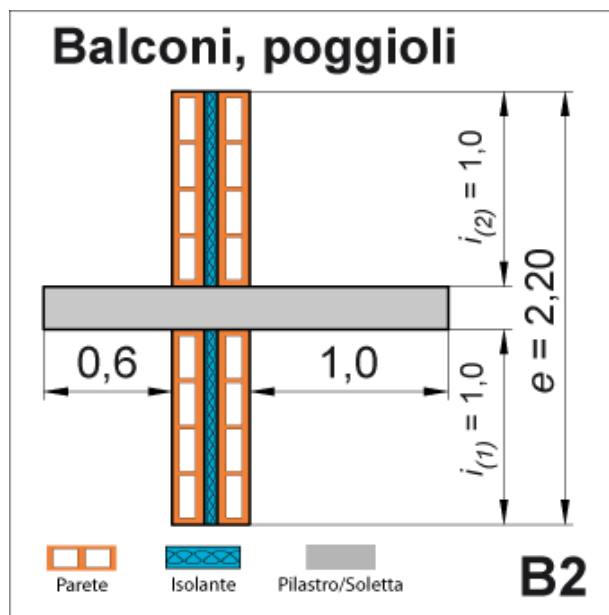

PONTE TERMICO

Codice Struttura:


PT.C2

Descrizione Struttura:

Ponte Termico di tipo angoli C2 come indicato nella UNI EN ISO 14683 : 2008


Trasmittanza Lineare:

0.10 W/mK

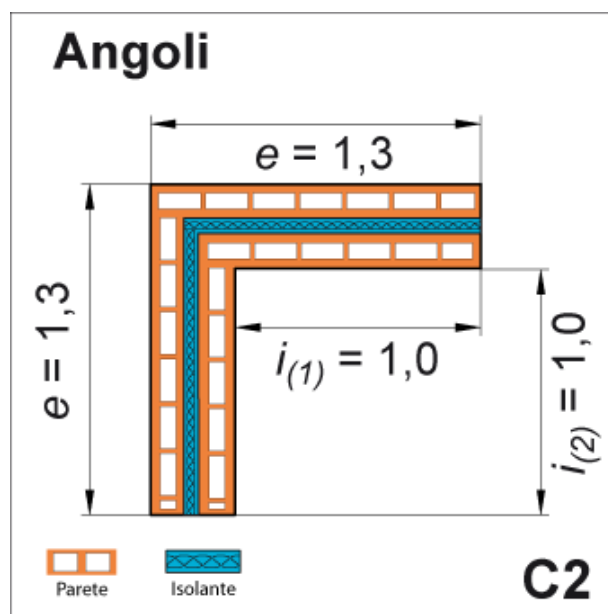

PONTE TERMICO

Codice Struttura: PT.C6
Descrizione Struttura: Ponte Termico di tipo angoli C6 come indicato nella UNI EN ISO 14683 : 2008
Trasmittanza Lineare: -0.10 W/mK

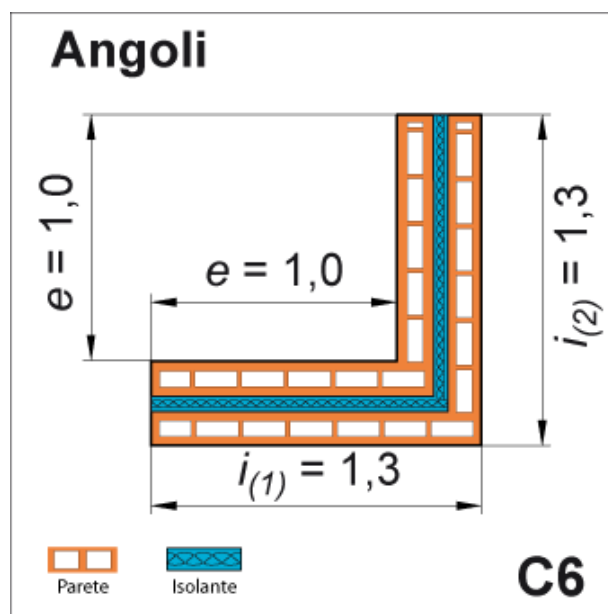

PONTE TERMICO

Codice Struttura:


PT.IF2

Descrizione Struttura:

Ponte Termico di tipo pavimenti IF2 come indicato nella UNI EN ISO 14683 : 2008

Trasmittanza Lineare:

1.05 W/mK

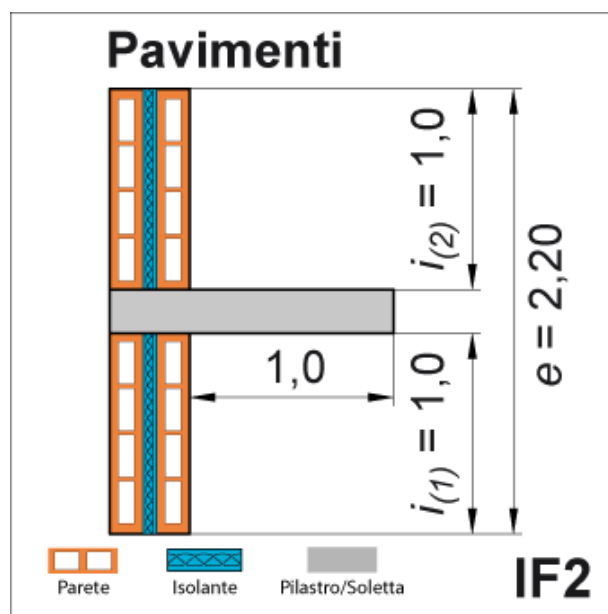


PONTE TERMICO

Codice Struttura: PT.IW5

Descrizione Struttura: Ponte Termico di tipo pareti interne IW5 come indicato nella UNI EN ISO 14683 : 2008

Trasmittanza Lineare: 0.10 W/mK

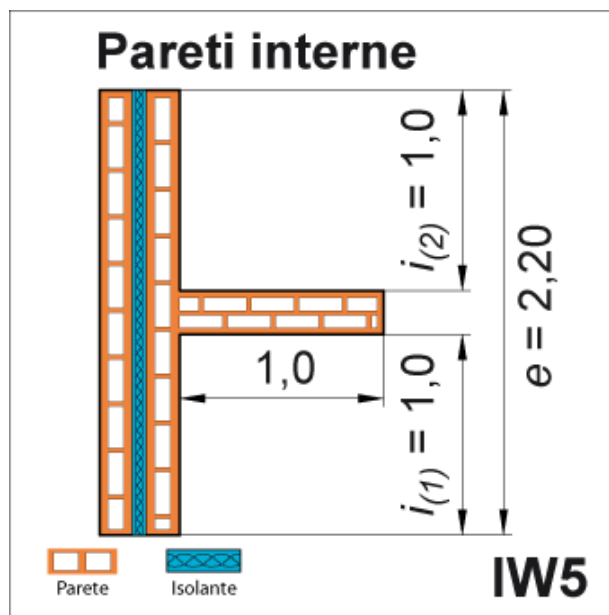


PONTE TERMICO

Codice Struttura: PT.W5

Descrizione Struttura: Ponte Termico di tipo serramenti di porte e finestre W5 come indicato nella UNI EN ISO 14683 : 2008

Trasmittanza Lineare: 0.40 W/mK

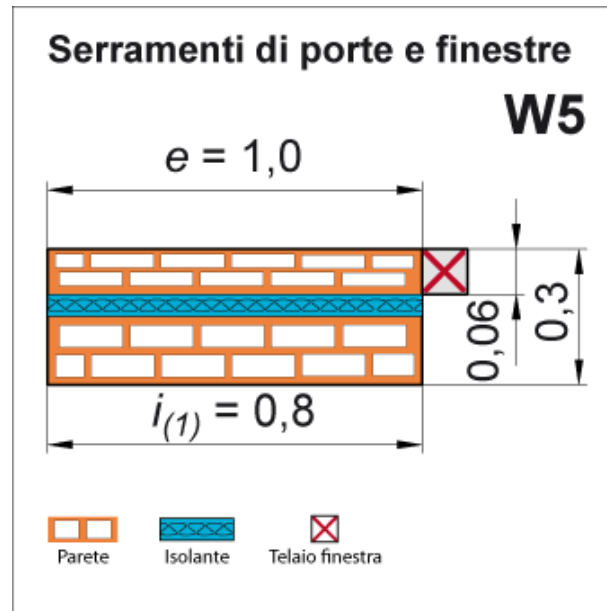


CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: WN.01.001

Descrizione Struttura: Finestra con telaio singolo in legno ad una anta, e vetrocamera ad una intercapedine.

Dimensioni: L = 0.90 m; H = 0.80 m

| SERRAMENTO SINGOLO | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| DESCRIZIONE | Ag [m²] | Af [m²] | Lg [m] | Ug [W/m²K] | Uf [W/m²K] | kl [W/mK] | Uw [W/m²K] | Fg [-] |
| INFISSO | 0.350 | 0.370 | 2.400 | 1.500 | 2.101 | 0.060 | 2.008 | 0.67 |
| Fonte - Uf: da Normativa; Ug: da Normativa | | | | | | | | |
| Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale. | | | | | | | | |

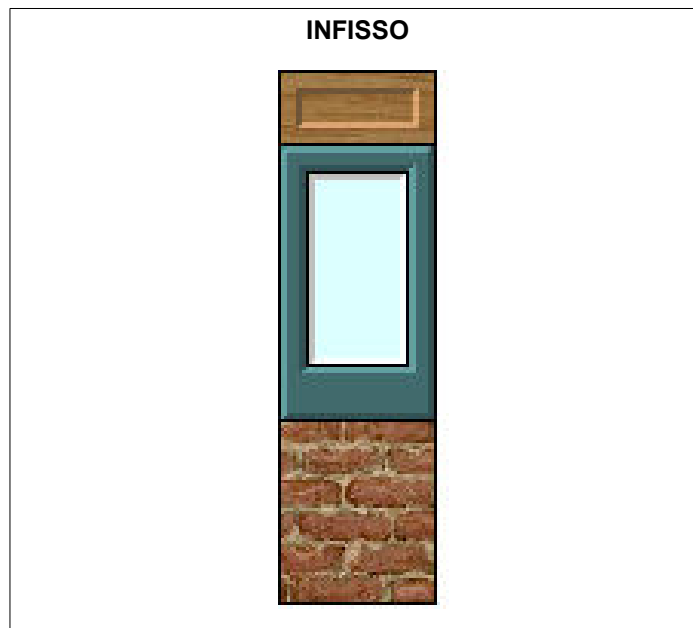


| | |
|---|--------------------|
| COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO | 0.5139 |
| RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA | 0.130 m²K/W |
| RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA | 0.040 m²K/W |
| CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA | 7.700 W/m²K |
| CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA | 25.000 W/m²K |
| RESISTENZA TERMICA TOTALE | 0.498 m²K/W |
| TRASMITTANZA TOTALE | 2.008 W/m²K |
| TRASMITTANZA VETRO TOTALE | 1.500 W/m²K |

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: WN.01.002
Descrizione Struttura: Finestra con telaio singolo in legno a due ante, e vetrocamera ad una intercapedine.
Dimensioni: L = 1.30 m; H = 1.40 m

| SERRAMENTO SINGOLO | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| DESCRIZIONE | Ag [m²] | Af [m²] | Lg [m] | Ug [W/m²K] | Uf [W/m²K] | kl [W/mK] | Uw [W/m²K] | Fg [-] |
| INFISSO | 1.100 | 0.720 | 6.400 | 1.500 | 2.101 | 0.060 | 1.948 | 0.67 |
| Fonte - Uf: da Normativa; Ug: da Normativa | | | | | | | | |
| Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale. | | | | | | | | |

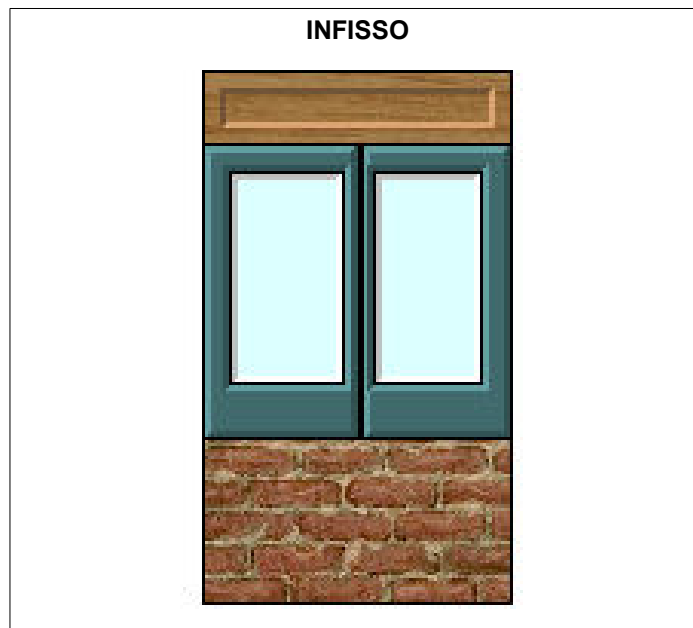


| | |
|---|--------------------|
| COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO | 0.3956 |
| RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA | 0.130 m²K/W |
| RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA | 0.040 m²K/W |
| CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA | 7.700 W/m²K |
| CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA | 25.000 W/m²K |
| RESISTENZA TERMICA TOTALE | 0.513 m²K/W |
| TRASMITTANZA TOTALE | 1.948 W/m²K |
| TRASMITTANZA VETRO TOTALE | 1.500 W/m²K |

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: WN.02.001
Descrizione Struttura: Porta-finestra con telaio singolo in legno ad una anta e vetrocamera ad una intercapedine.
Dimensioni: L = 0.80 m; H = 2.40 m

| SERRAMENTO SINGOLO | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| DESCRIZIONE | Ag [m²] | Af [m²] | Lg [m] | Ug [W/m²K] | Uf [W/m²K] | kl [W/mK] | Uw [W/m²K] | Fg [-] |
| INFISSO | 1.170 | 0.750 | 6.300 | 1.902 | 2.101 | 0.060 | 2.176 | 0.67 |
| Fonte - Uf: da Normativa; Ug: da Normativa | | | | | | | | |
| Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale. | | | | | | | | |

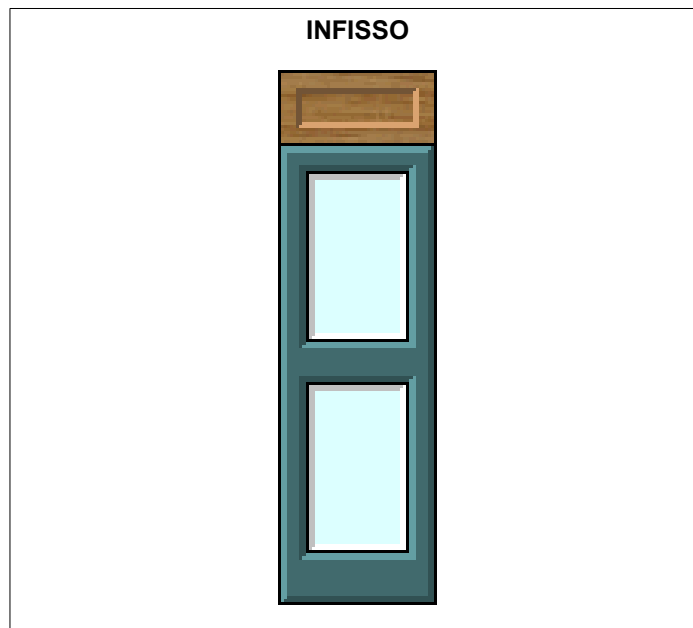


| | |
|---|--------------------|
| COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO | 0.3906 |
| RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA | 0.130 m²K/W |
| RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA | 0.040 m²K/W |
| CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA | 7.700 W/m²K |
| CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA | 25.000 W/m²K |
| RESISTENZA TERMICA TOTALE | 0.460 m²K/W |
| TRASMITTANZA TOTALE | 2.176 W/m²K |
| TRASMITTANZA VETRO TOTALE | 1.902 W/m²K |

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: WN.02.002
Descrizione Struttura: Porta-finestra con telaio singolo in legno a due ante e vetrocamera ad una intercapedine.
Dimensioni: L = 1.30 m; H = 2.40 m

| SERRAMENTO SINGOLO | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| DESCRIZIONE | Ag [m²] | Af [m²] | Lg [m] | Ug [W/m²K] | Uf [W/m²K] | kl [W/mK] | Uw [W/m²K] | Fg [-] |
| INFISSO | 1.950 | 1.170 | 11.800 | 1.500 | 2.068 | 0.060 | 1.940 | 0.67 |
| Fonte - Uf: da Normativa; Ug: da Normativa | | | | | | | | |
| Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale. | | | | | | | | |

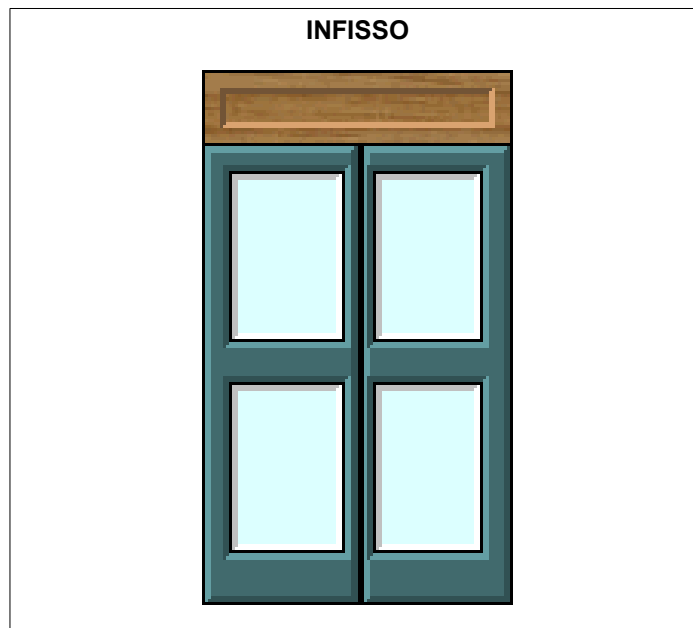



| | |
|---|--------------------|
| COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO | 0.3750 |
| RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA | 0.130 m²K/W |
| RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA | 0.040 m²K/W |
| CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA | 7.700 W/m²K |
| CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA | 25.000 W/m²K |
| RESISTENZA TERMICA TOTALE | 0.516 m²K/W |
| TRASMITTANZA TOTALE | 1.940 W/m²K |
| TRASMITTANZA VETRO TOTALE | 1.500 W/m²K |

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: DO.01.001

Descrizione Struttura: Portoncino di ingresso agli appartamenti, del tipoblindato 90*210, costituito da telaio maestro di sezione minima di mm 90 x 45, parte mobile con struttura monolamiera 49 mm. realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata, rivestita sulle due facce da compensato impialliciato di spessore non inferiore a mm 6.

| N. | DESCRIZIONE STRATO (dall'interno all'esterno) | s [mm] | lambda [W/mK] | C [W/m²K] | M.S. [kg/m²] | P<50*10 ¹² [kg/msPa] | C.S. [J/kgK] | R [m²K/W] |
|---|--|--|------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Adduttanza Interna | 0 | | 7.700 | | | 0 | 0.130 |
| 2 | Abete (flusso perpendicolare alle fibre). | 10 | 0.120 | 12.000 | 4.50 | 0.300 | 1700 | 0.083 |
| 3 | Strato d' aria verticale - spessore tra 1,5 cm e 2,5 cm. | 20 | 0.150 | 7.500 | 0.03 | 193.000 | 1008 | 0.133 |
| 4 | Acciaio. | 40 | 52.000 | 1 300.000 | 312.00 | 0.000 | 450 | 0.001 |
| 5 | Abete (flusso perpendicolare alle fibre). | 10 | 0.120 | 12.000 | 4.50 | 0.300 | 1700 | 0.083 |
| 6 | Adduttanza Esterna | 0 | | 25.000 | | | 0 | 0.040 |
| RESISTENZA = 0.471 m²K/W | | | | | | TRASMITTANZA = 2.125 W/m²K | | |
| SPESSORE = 80 mm | | CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 28.648 kJ/m²K | | | | MASSA SUPERFICIALE = 321 kg/m² | | |
| TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 1.38 W/m²K | | FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.71 | | | | SFASAMENTO = 3.24 h | | |
| s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10 ¹² = Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i.. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|----------|--|---------|---------|----------|----------|---------|
| STRATIGRAFIA STRUTTURA  | | | DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI  | | | | | |
| | Ti [°C] | Psi [Pa] | Pri [Pa] | URi [%] | Te [°C] | Pse [Pa] | Pre [Pa] | URe [%] |
| DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI | 20.0 | 2 337 | 1 215 | 52.0 | 2.0 | 705 | 420 | 59.5 |
| Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna. | | | | | | | | |

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: DO.02.001
Descrizione Struttura: Porta interna di legno abete

| N. | DESCRIZIONE STRATO (dall'interno all'esterno) | s [mm] | lambda [W/mK] | C [W/m²K] | M.S. [kg/m²] | P<50*10 ¹² [kg/msPa] | C.S. [J/kgK] | R [m²K/W] |
|---|--|---|------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Adduttanza Interna | 0 | | 7.700 | | | 0 | 0.130 |
| 2 | Abete (flusso perpendicolare alle fibre). | 30 | 0.120 | 4.000 | 13.50 | 0.300 | 1700 | 0.250 |
| 3 | Adduttanza Esterna | 0 | | 25.000 | | | 0 | 0.040 |
| RESISTENZA = 0.420 m²K/W | | | | | | TRASMITTANZA = 2.382 W/m²K | | |
| SPESSORE = 30 mm | | CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 8.972 kJ/m²K | | | | MASSA SUPERFICIALE = 14 kg/m² | | |
| TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 2.37 W/m²K | | FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.99 | | | | SFASAMENTO = 0.56 h | | |
| s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10 ¹² = Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i.. | | | | | | | | |


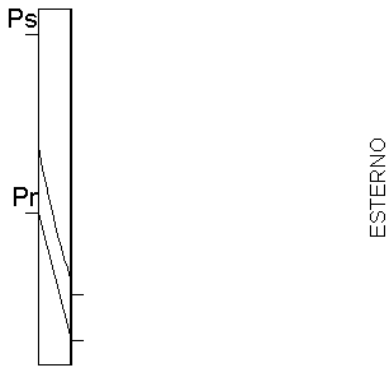
| | | | | | | | | |
|---|---------|----------|--|---------|---------|----------|----------|---------|
| STRATIGRAFIA STRUTTURA  | | | DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI  | | | | | |
| | Ti [°C] | Psi [Pa] | Pri [Pa] | URi [%] | Te [°C] | Pse [Pa] | Pre [Pa] | URe [%] |
| DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI | 20.0 | 2 337 | 1 215 | 52.0 | 2.0 | 705 | 420 | 59.5 |
| Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna. | | | | | | | | |

Tavola: Piano Primo A

Vano: Letto
Zona: Civile abitazione AP
Generatore: Gen 24 kW Cond (RSC-ACS)

Dati generali

| DESCRIZIONE | VALORE | Un.Mis. |
|---|----------|----------------|
| Superficie netta calpestabile | 11.33 | m ² |
| Volume netto | 30.60 | m ³ |
| Temperatura interna (per la Potenza) | 20.00 | °C |
| Ricambi d'aria (per la Potenza) | 0.50 | Vol/h |
| Capacità Termica | 2 718.43 | kJ/K |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | 316 | W |
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) | 94 | W |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) | 410 | W |

Elementi disperdenti (Potenza)

| Elemento | Cod. struttura | Scheda | A / L | Confin. / Orient. | a | U / UI | dT | QhUTRp | QhTRp |
|------------------|----------------|--------|-------|-------------------|-----|--------|------|--------|--------|
| Muro | MR.01.021 | | 8.69 | Nord-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.75 | 50.02 |
| Muro | MR.01.021 | | 6.13 | Nord-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 6.00 | 36.79 |
| Finestra | WN.01.002 | | 1.75 | Nord-Est | | 2.10 | 18.0 | 45.34 | 79.35 |
| Parapetto | MR.01.021 | | 1.25 | Nord-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 6.00 | 7.50 |
| Cassonetto | MR.01.015 | | 0.38 | Nord-Est | 0.6 | 0.56 | 18.0 | 12.16 | 4.56 |
| Muro | MR.01.018 | | 5.86 | Bagno | | 2.05 | | | |
| Ponte Termico | PT.IW5 | | 2.70 | Bagno | | 0.10 | | | |
| Muro | MR.01.018 | | 0.95 | Disimp. | | 2.05 | | | |
| Porta | DO.02.001 | | 1.89 | Disimp. | | 1.96 | | | |
| Muro | MR.01.018 | | 7.70 | Letto | | 2.05 | | | |
| Muro | MR.01.021 | | 1.81 | Sud-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.25 | 9.50 |
| Solaio superiore | SL.03.001 | | 11.33 | ESTERNO | | 0.63 | 18.0 | 11.30 | 128.13 |
| Solaio inferiore | SL.01.001 | | 11.33 | (stessa zona) | | 0.56 | | | |

A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin. / Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; a = Coefficiente di assorbimento della radiazione solare; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - UI [W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).

Vano: Letto
Zona: Civile abitazione AP
Generatore: Gen 24 kW Cond (RSC-ACS)

Dati generali

| DESCRIZIONE | VALORE | Un.Mis. |
|---|----------|----------------|
| Superficie netta calpestabile | 14.31 | m ² |
| Volume netto | 38.63 | m ³ |
| Temperatura interna (per la Potenza) | 20.00 | °C |
| Ricambi d'aria (per la Potenza) | 0.50 | Vol/h |
| Capacità Termica | 3 282.16 | kJ/K |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | 418 | W |
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) | 118 | W |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) | 536 | W |

Elementi disperdenti (Potenza)

| Elemento | Cod. struttura | Scheda | A / L | Confin. / Orient. | a | U / UI | dT | QhUTRp | QhTRp |
|-----------------------|----------------|--------|-------|-------------------|-----|--------|------|--------|--------|
| Muro | MR.01.018 | | 9.59 | Soggiorno | | 2.05 | | | |
| Muro | MR.01.021 | | 10.88 | Sud-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.25 | 57.16 |
| Muro | MR.01.021 | | 7.51 | Nord-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.75 | 43.18 |
| Finestra | WN.02.001 | | 1.84 | Nord-Ovest | | 2.04 | 18.0 | 42.24 | 77.73 |
| Cassonetto | MR.01.021 | | 0.24 | Nord-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.75 | 1.38 |
| Ponte Termico (corr.) | PT.B2 | | 3.55 | Nord-Ovest | | 1.05 | 18.0 | | 77.16 |
| Muro | MR.01.018 | | 7.78 | Letto | | 2.05 | | | |
| Muro | MR.01.018 | | 1.22 | Disimp. | | 2.05 | | | |
| Porta | DO.02.001 | | 1.89 | Disimp. | | 1.96 | | | |
| Solaio superiore | SL.03.001 | | 14.31 | ESTERNO | | 0.63 | 18.0 | 11.30 | 161.73 |
| Solaio inferiore | SL.01.001 | | 14.31 | (stessa zona) | | 0.56 | | | |

A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; a = Coefficiente di assorbimento della radiazione solare; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - UI [W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).

Vano: Bagno
Zona: Civile abitazione AP
Generatore: Gen 24 kW Cond (RSC-ACS)

Dati generali

| DESCRIZIONE | VALORE | Un.Mis. |
|---|----------|----------------|
| Superficie netta calpestabile | 5.09 | m ² |
| Volume netto | 13.74 | m ³ |
| Temperatura interna (per la Potenza) | 20.00 | °C |
| Ricambi d'aria (per la Potenza) | 0.50 | Vol/h |
| Capacità Termica | 1 504.39 | kJ/K |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | 132 | W |
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) | 42 | W |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) | 174 | W |

Elementi disperdenti (Potenza)

| Elemento | Cod. struttura | Scheda | A / L | Confin. / Orient. | a | U / UI | dT | QhUTRp | QhTRp |
|------------------|----------------|--------|-------|-------------------|-----|--------|------|--------|-------|
| Muro | MR.01.018 | | 5.72 | Letto | | 2.05 | | | |
| Ponte Termico | PT.IW5 | | 2.70 | Letto | | 0.10 | | | |
| Muro | MR.01.021 | | 4.59 | Nord-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 6.00 | 27.55 |
| Finestra | WN.01.001 | | 0.63 | Nord-Est | | 2.02 | 18.0 | 43.72 | 27.54 |
| Parapetto | MR.01.021 | | 1.05 | Nord-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 6.00 | 6.30 |
| Cassonetto | MR.01.015 | | 0.21 | Nord-Est | 0.6 | 0.56 | 18.0 | 12.16 | 2.55 |
| Muro | MR.01.021 | | 1.94 | Sud-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.50 | 10.70 |
| Muro | MR.01.018 | | 3.78 | Soggiorno | | 2.05 | | | |
| Muro | MR.01.018 | | 4.59 | Disimp. | | 2.05 | | | |
| Porta | DO.02.001 | | 1.89 | Disimp. | | 1.96 | | | |
| Solaio superiore | SL.03.001 | | 5.09 | ESTERNO | | 0.63 | 18.0 | 11.30 | 57.52 |
| Solaio inferiore | SL.01.001 | | 5.09 | (stessa zona) | | 0.56 | | | |

A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin. / Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; a = Coefficiente di assorbimento della radiazione solare; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - UI [W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).

Vano: Disimp.
Zona: Civile abitazione AP
Generatore: Gen 24 kW Cond (RSC-ACS)

Dati generali

| DESCRIZIONE | VALORE | Un.Mis. |
|---|--------|----------------|
| Superficie netta calpestabile | 2.40 | m ² |
| Volume netto | 6.48 | m ³ |
| Temperatura interna (per la Potenza) | 20.00 | °C |
| Ricambi d'aria (per la Potenza) | 0.50 | Vol/h |
| Capacità Termica | 749.79 | kJ/K |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | 0 | W |
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) | 20 | W |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) | 20 | W |

Elementi disperdenti (Potenza)

| Elemento | Cod. struttura | Scheda | A / L | Confin. / Orient. | a | U / UI | dT | QhUTRp | QhTRp |
|------------------|----------------|--------|-------|-------------------|---|--------|----|--------|-------|
| Muro | MR.01.018 | | 0.81 | Letto | | 2.05 | | | |
| Porta | DO.02.001 | | 1.89 | Letto | | 1.96 | | | |
| Muro | MR.01.018 | | 4.59 | Bagno | | 2.05 | | | |
| Porta | DO.02.001 | | 1.89 | Bagno | | 1.96 | | | |
| Muro | MR.01.018 | | 2.70 | Soggiorno | | 2.05 | | | |
| Muro | MR.01.018 | | 1.35 | Soggiorno | | 2.05 | | | |
| Porta | DO.02.001 | | 1.89 | Soggiorno | | 1.96 | | | |
| Muro | MR.01.018 | | 1.35 | Letto | | 2.05 | | | |
| Porta | DO.02.001 | | 1.89 | Letto | | 1.96 | | | |
| Solaio superiore | SL.01.001 | | 2.40 | (stessa zona) | | 0.60 | | | |
| Solaio inferiore | SL.01.001 | | 2.40 | (stessa zona) | | 0.56 | | | |

A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin. / Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; a = Coefficiente di assorbimento della radiazione solare; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - UI [W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).

Vano: Soggiorno
Zona: Civile abitazione AP
Generatore: Gen 24 kW Cond (RSC-ACS)

Dati generali

| DESCRIZIONE | VALORE | Un.Mis. |
|---|----------|----------------|
| Superficie netta calpestabile | 22.51 | m ² |
| Volume netto | 60.76 | m ³ |
| Temperatura interna (per la Potenza) | 20.00 | °C |
| Ricambi d'aria (per la Potenza) | 0.50 | Vol/h |
| Capacità Termica | 4 792.20 | kJ/K |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | 705 | W |
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) | 186 | W |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) | 891 | W |

Elementi disperdenti (Potenza)

| Elemento | Cod. struttura | Scheda | A / L | Confin. / Orient. | a | U / UI | dT | QhUTRp | QhTRp |
|-----------------------|----------------|--------|-------|-------------------|-----|--------|------|--------|--------|
| Muro | MR.01.018 | | 9.59 | Letto | | 2.05 | | | |
| Muro | MR.01.018 | | 1.62 | Disimp. | | 2.05 | | | |
| Porta | DO.02.001 | | 1.89 | Disimp. | | 1.96 | | | |
| Muro | MR.01.018 | | 3.11 | Disimp. | | 2.05 | | | |
| Muro | MR.01.018 | | 3.83 | Bagno | | 2.05 | | | |
| Muro | MR.01.021 | | 4.58 | Nord-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 6.00 | 27.49 |
| Finestra | WN.02.002 | | 2.88 | Nord-Est | | 2.10 | 18.0 | 45.30 | 130.23 |
| Cassonetto | MR.01.021 | | 0.38 | Nord-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 6.00 | 2.25 |
| Ponte Termico (corr.) | PT.B2 | | 2.90 | Nord-Est | | 1.05 | 18.0 | | 65.77 |
| Muro | MR.01.021 | | 8.83 | Sud-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 6.05 | 53.44 |
| Muro | MR.01.021 | | 5.81 | Sud-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.50 | 31.94 |
| Porta | DO.01.001 | | 1.89 | Sud-Est | 0.6 | 2.12 | 18.0 | 42.07 | 79.51 |
| Muro | MR.01.021 | | 11.48 | Sud-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.25 | 60.28 |
| Solaio superiore | SL.03.001 | | 22.51 | ESTERNO | | 0.63 | 18.0 | 11.30 | 254.42 |
| Solaio inferiore | SL.01.001 | | 22.51 | (stessa zona) | | 0.56 | | | |

A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin. / Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; a = Coefficiente di assorbimento della radiazione solare; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - UI [W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).

Tavola: Piano Terra

Vano: Letto
Zona: Civile abitazione AT
Generatore: Gen 24 kW Cond (RSC-ACS)

Dati generali

| DESCRIZIONE | VALORE | Un.Mis. |
|---|----------|----------------|
| Superficie netta calpestabile | 14.72 | m ² |
| Volume netto | 39.73 | m ³ |
| Temperatura interna (per la Potenza) | 20.00 | °C |
| Ricambi d'aria (per la Potenza) | 0.50 | Vol/h |
| Capacità Termica | 3 664.00 | kJ/K |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | 553 | W |
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) | 122 | W |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) | 675 | W |

Elementi disperdenti (Potenza)

| Elemento | Cod. struttura | Scheda | A / L | Confin. / Orient. | a | U / UI | dT | QhUTRp | QhTRp |
|------------------|----------------|--------|-------|-------------------|-----|--------|------|--------|--------|
| Muro | MR.01.021 | | 1.30 | Nord-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 6.00 | 7.78 |
| Muro | MR.01.021 | | 2.16 | Nord-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.75 | 12.43 |
| Muro | MR.01.021 | | 8.83 | Nord-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 6.00 | 53.00 |
| Ponte Termico | PT.C2 | | 3.27 | Nord-Est | | 0.10 | 18.0 | | 7.06 |
| Muro | MR.01.021 | | 6.40 | Sud-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.50 | 35.21 |
| Finestra | WN.01.002 | | 1.75 | Sud-Est | | 2.10 | 18.0 | 41.56 | 72.74 |
| Parapetto | MR.01.021 | | 1.25 | Sud-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.50 | 6.88 |
| Cassonetto | MR.01.015 | | 0.38 | Sud-Est | 0.6 | 0.56 | 18.0 | 11.14 | 4.18 |
| Ponte Termico | PT.W5 | | 3.62 | Sud-Est | | 0.40 | 18.0 | | 28.67 |
| Solaio superiore | SL.01.001 | | 14.72 | ESTERNO | | 0.63 | 18.0 | 11.28 | 166.03 |
| Solaio inferiore | SL.01.001 | | 14.72 | ESTERNO | | 0.60 | 18.0 | 10.81 | 159.10 |

A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin. / Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; a = Coefficiente di assorbimento della radiazione solare; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - UI [W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).

Vano: Soggiorno
Zona: Civile abitazione AT
Generatore: Gen 24 kW Cond (RSC-ACS)

Dati generali

| DESCRIZIONE | VALORE | Un.Mis. |
|---|----------|----------------|
| Superficie netta calpestabile | 19.73 | m ² |
| Volume netto | 53.27 | m ³ |
| Temperatura interna (per la Potenza) | 20.00 | °C |
| Ricambi d'aria (per la Potenza) | 0.50 | Vol/h |
| Capacità Termica | 4 501.86 | kJ/K |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | 840 | W |
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) | 163 | W |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) | 1 003 | W |

Elementi disperdenti (Potenza)

| Elemento | Cod. struttura | Scheda | A / L | Confin. / Orient. | a | U / UI | dT | QhUTRp | QhTRp |
|------------------|----------------|--------|-------|-------------------|-----|--------|------|--------|--------|
| Muro | MR.01.021 | | 4.73 | Nord-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.75 | 27.18 |
| Finestra | WN.01.001 | | 0.54 | Nord-Ovest | | 2.06 | 18.0 | 42.55 | 22.98 |
| Parapetto | MR.01.021 | | 0.90 | Nord-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.75 | 5.18 |
| Cassonetto | MR.01.015 | | 0.18 | Nord-Ovest | 0.6 | 0.56 | 18.0 | 11.65 | 2.10 |
| Finestra | WN.02.002 | | 3.36 | Nord-Ovest | | 2.05 | 18.0 | 42.53 | 142.90 |
| Cassonetto | MR.01.021 | | 0.42 | Nord-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.75 | 2.42 |
| Muro | MR.01.021 | | 2.16 | Sud-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.25 | 11.35 |
| Muro | MR.01.021 | | 6.89 | Sud-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.50 | 37.89 |
| Muro | MR.01.021 | | 1.62 | Sud-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.25 | 8.51 |
| Porta | DO.01.001 | | 1.89 | Sud-Ovest | 0.6 | 2.12 | 18.0 | 40.16 | 75.90 |
| Muro | MR.01.021 | | 1.35 | Sud-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.50 | 7.43 |
| Muro | MR.01.021 | | 4.21 | Sud-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.25 | 22.12 |
| Muro | MR.01.021 | | 1.77 | Sud-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.50 | 9.73 |
| Muro | MR.01.021 | | 5.32 | Sud-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.25 | 27.94 |
| Solaio superiore | SL.01.001 | | 19.73 | ESTERNO | | 0.63 | 18.0 | 11.28 | 222.61 |
| Solaio inferiore | SL.01.001 | | 19.73 | ESTERNO | | 0.60 | 18.0 | 10.81 | 213.32 |

A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin. / Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; a = Coefficiente di assorbimento della radiazione solare; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - UI [W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).

Vano: Bagno
Zona: Civile abitazione AT
Generatore: Gen 24 kW Cond (RSC-ACS)

Dati generali

| DESCRIZIONE | VALORE | Un.Mis. |
|---|----------|----------------|
| Superficie netta calpestabile | 4.85 | m ² |
| Volume netto | 13.09 | m ³ |
| Temperatura interna (per la Potenza) | 20.00 | °C |
| Ricambi d'aria (per la Potenza) | 0.50 | Vol/h |
| Capacità Termica | 1 499.46 | kJ/K |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | 175 | W |
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) | 40 | W |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) | 215 | W |

Elementi disperdenti (Potenza)

| Elemento | Cod. struttura | Scheda | A / L | Confin. / Orient. | a | U / UI | dT | QhUTRp | QhTRp |
|------------------|----------------|--------|-------|-------------------|-----|--------|------|--------|-------|
| Muro | MR.01.021 | | 4.59 | Nord-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.75 | 26.41 |
| Finestra | WN.01.001 | | 0.63 | Nord-Ovest | | 2.02 | 18.0 | 41.89 | 26.39 |
| Parapetto | MR.01.021 | | 1.05 | Nord-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.75 | 6.04 |
| Cassonetto | MR.01.015 | | 0.21 | Nord-Ovest | 0.6 | 0.56 | 18.0 | 11.65 | 2.45 |
| Muro | MR.01.021 | | 1.27 | Sud-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.25 | 6.67 |
| Solaio superiore | SL.01.001 | | 4.85 | ESTERNO | | 0.63 | 18.0 | 11.28 | 54.70 |
| Solaio inferiore | SL.01.001 | | 4.85 | ESTERNO | | 0.60 | 18.0 | 10.81 | 52.41 |

A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin. / Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; a = Coefficiente di assorbimento della radiazione solare; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - UI [W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).

Vano: Disimpegno
Zona: Civile abitazione AT
Generatore: Gen 24 kW Cond (RSC-ACS)

Dati generali

| DESCRIZIONE | VALORE | Un.Mis. |
|---|----------|----------------|
| Superficie netta calpestabile | 4.85 | m ² |
| Volume netto | 13.10 | m ³ |
| Temperatura interna (per la Potenza) | 20.00 | °C |
| Ricambi d'aria (per la Potenza) | 0.50 | Vol/h |
| Capacità Termica | 1 627.75 | kJ/K |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | 176 | W |
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) | 40 | W |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) | 216 | W |

Elementi disperdenti (Potenza)

| Elemento | Cod. struttura | Scheda | A / L | Confin. / Orient. | a | U / UI | dT | QhUTRp | QhTRp |
|------------------|----------------|--------|-------|-------------------|-----|--------|------|--------|-------|
| Muro | MR.01.021 | | 13.10 | Sud-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.25 | 68.79 |
| Solaio superiore | SL.01.001 | | 4.85 | ESTERNO | | 0.63 | 18.0 | 11.28 | 54.72 |
| Solaio inferiore | SL.01.001 | | 4.85 | ESTERNO | | 0.60 | 18.0 | 10.81 | 52.44 |

A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin. / Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; a = Coefficiente di assorbimento della radiazione solare; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - UI [W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).

Vano: Disimpegno
Zona: Civile abitazione AT
Generatore: Gen 24 kW Cond (RSC-ACS)

Dati generali

| DESCRIZIONE | VALORE | Un.Mis. |
|---|--------|----------------|
| Superficie netta calpestabile | 2.52 | m ² |
| Volume netto | 6.79 | m ³ |
| Temperatura interna (per la Potenza) | 20.00 | °C |
| Ricambi d'aria (per la Potenza) | 0.50 | Vol/h |
| Capacità Termica | 879.88 | kJ/K |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | 56 | W |
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) | 21 | W |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) | 77 | W |

Elementi disperdenti (Potenza)

| Elemento | Cod. struttura | Scheda | A / L | Confin. / Orient. | a | U / UI | dT | QhUTRp | QhTRp |
|------------------|----------------|--------|-------|-------------------|---|--------|------|--------|-------|
| Solaio superiore | SL.01.001 | | 2.52 | ESTERNO | | 0.63 | 18.0 | 11.28 | 28.38 |
| Solaio inferiore | SL.01.001 | | 2.52 | ESTERNO | | 0.60 | 18.0 | 10.81 | 27.19 |

A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; a = Coefficiente di assorbimento della radiazione solare; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - UI [W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).

Vano: Letto
Zona: Civile abitazione AT
Generatore: Gen 24 kW Cond (RSC-ACS)

Dati generali

| DESCRIZIONE | VALORE | Un.Mis. |
|---|----------|----------------|
| Superficie netta calpestabile | 10.84 | m ² |
| Volume netto | 29.27 | m ³ |
| Temperatura interna (per la Potenza) | 20.00 | °C |
| Ricambi d'aria (per la Potenza) | 0.50 | Vol/h |
| Capacità Termica | 2 717.60 | kJ/K |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | 455 | W |
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) | 90 | W |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) | 545 | W |

Elementi disperdenti (Potenza)

| Elemento | Cod. struttura | Scheda | A / L | Confin. / Orient. | a | U / UI | dT | QhUTRp | QhTRp |
|------------------|----------------|--------|-------|-------------------|-----|--------|------|--------|--------|
| Muro | MR.01.021 | | 5.86 | Nord-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.75 | 33.71 |
| Finestra | WN.01.002 | | 1.75 | Nord-Ovest | | 2.10 | 18.0 | 43.45 | 76.04 |
| Parapetto | MR.01.021 | | 1.25 | Nord-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.75 | 7.19 |
| Cassonetto | MR.01.015 | | 0.38 | Nord-Ovest | 0.6 | 0.56 | 18.0 | 11.65 | 4.37 |
| Ponte Termico | PT.W5 | | 3.42 | Nord-Ovest | | 0.40 | 18.0 | | 28.32 |
| Muro | MR.01.021 | | 8.56 | Nord-Est | 0.9 | 0.28 | 18.0 | 6.00 | 51.38 |
| Ponte Termico | PT.C2 | | 3.17 | Nord-Est | | 0.10 | 18.0 | | 6.85 |
| Muro | MR.01.021 | | 1.40 | Sud-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.50 | 7.73 |
| Solaio superiore | SL.01.001 | | 10.84 | ESTERNO | | 0.63 | 18.0 | 11.28 | 122.32 |
| Solaio inferiore | SL.01.001 | | 10.84 | ESTERNO | | 0.60 | 18.0 | 10.81 | 117.21 |

A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; a = Coefficiente di assorbimento della radiazione solare; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - UI [W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).

Vano: Cucina
Zona: Civile abitazione AT
Generatore: Gen 24 kW Cond (RSC-ACS)

Dati generali

| DESCRIZIONE | VALORE | Un.Mis. |
|---|----------|----------------|
| Superficie netta calpestabile | 13.86 | m ² |
| Volume netto | 37.43 | m ³ |
| Temperatura interna (per la Potenza) | 20.00 | °C |
| Ricambi d'aria (per la Potenza) | 0.50 | Vol/h |
| Capacità Termica | 3 329.70 | kJ/K |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | 435 | W |
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) | 115 | W |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) | 550 | W |

Elementi disperdenti (Potenza)

| Elemento | Cod. struttura | Scheda | A / L | Confin. / Orient. | a | U / UI | dT | QhUTRp | QhTRp |
|------------------|----------------|--------|-------|-------------------|-----|--------|------|--------|--------|
| Muro | MR.01.021 | | 7.16 | Nord-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 6.00 | 42.95 |
| Finestra | WN.02.001 | | 1.92 | Nord-Est | | 2.03 | 18.0 | 43.93 | 84.34 |
| Cassonetto | MR.01.021 | | 0.24 | Nord-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 6.00 | 1.44 |
| Solaio superiore | SL.01.001 | | 13.86 | ESTERNO | | 0.63 | 18.0 | 11.28 | 156.42 |
| Solaio inferiore | SL.01.001 | | 13.86 | ESTERNO | | 0.60 | 18.0 | 10.81 | 149.89 |

A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin. / Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; a = Coefficiente di assorbimento della radiazione solare; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - UI [W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).

Vano: Bagno
Zona: Civile abitazione AT
Generatore: Gen 24 kW Cond (RSC-ACS)

Dati generali

| DESCRIZIONE | VALORE | Un.Mis. |
|---|----------|----------------|
| Superficie netta calpestabile | 4.40 | m ² |
| Volume netto | 11.88 | m ³ |
| Temperatura interna (per la Potenza) | 20.00 | °C |
| Ricambi d'aria (per la Potenza) | 0.50 | Vol/h |
| Capacità Termica | 1 387.12 | kJ/K |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | 181 | W |
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) | 36 | W |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) | 217 | W |

Elementi disperdenti (Potenza)

| Elemento | Cod. struttura | Scheda | A / L | Confin. / Orient. | a | U / UI | dT | QhUTRp | QhTRp |
|------------------|----------------|--------|-------|-------------------|-----|--------|------|--------|-------|
| Muro | MR.01.021 | | 4.05 | Sud-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.50 | 22.29 |
| Finestra | WN.01.001 | | 0.63 | Sud-Est | | 2.02 | 18.0 | 40.07 | 25.25 |
| Parapetto | MR.01.021 | | 1.05 | Sud-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.50 | 5.78 |
| Cassonetto | MR.01.015 | | 0.21 | Sud-Est | 0.6 | 0.56 | 18.0 | 11.14 | 2.34 |
| Muro | MR.01.021 | | 5.40 | Sud-Ovest | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 5.25 | 28.37 |
| Solaio superiore | SL.01.001 | | 4.40 | ESTERNO | | 0.63 | 18.0 | 11.28 | 49.64 |
| Solaio inferiore | SL.01.001 | | 4.40 | ESTERNO | | 0.60 | 18.0 | 10.81 | 47.57 |

A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin. / Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; a = Coefficiente di assorbimento della radiazione solare; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - UI [W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).

Vano: Letto
Zona: Civile abitazione AT
Generatore: Gen 24 kW Cond (RSC-ACS)

Dati generali

| DESCRIZIONE | VALORE | Un.Mis. |
|---|----------|----------------|
| Superficie netta calpestabile | 12.87 | m ² |
| Volume netto | 34.74 | m ³ |
| Temperatura interna (per la Potenza) | 20.00 | °C |
| Ricambi d'aria (per la Potenza) | 0.50 | Vol/h |
| Capacità Termica | 3 216.75 | kJ/K |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | 407 | W |
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) | 106 | W |
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) | 513 | W |

Elementi disperdenti (Potenza)

| Elemento | Cod. struttura | Scheda | A / L | Confin. / Orient. | a | U / UI | dT | QhUTRp | QhTRp |
|------------------|----------------|--------|-------|-------------------|-----|--------|------|--------|--------|
| Muro | MR.01.021 | | 6.21 | Nord-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 6.00 | 37.28 |
| Finestra | WN.02.001 | | 1.92 | Nord-Est | | 2.03 | 18.0 | 43.93 | 84.34 |
| Cassonetto | MR.01.021 | | 0.24 | Nord-Est | 0.6 | 0.28 | 18.0 | 6.00 | 1.44 |
| Solaio superiore | SL.01.001 | | 12.87 | ESTERNO | | 0.63 | 18.0 | 11.28 | 145.17 |
| Solaio inferiore | SL.01.001 | | 12.87 | ESTERNO | | 0.60 | 18.0 | 10.81 | 139.11 |

A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; a = Coefficiente di assorbimento della radiazione solare; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - UI [W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Edifici residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Codice certificato | | Validità | |
| Riferimenti catastali | | | |
| Indirizzo edificio | Tempio " Poi-Mantelli" | | |
| Nuova costruzione | <input checked="" type="checkbox"/> | Passaggio di proprietà | <input type="checkbox"/> |
| | | Riqualificazione energetica | <input type="checkbox"/> |
| Proprietà | | Telefono | |
| Indirizzo | | E-mail | |


2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

Edificio di classe: **C**

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI


EMISSIONI DI CO₂
12.653 kgCO₂/m²anno

PRESTAZIONE ENERGETICA
RAGGIUNGIBILE
62.047 kWh/m²anno

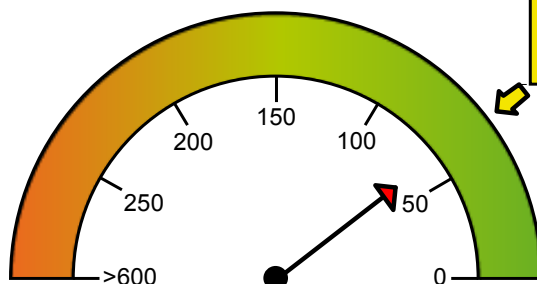


PRESTAZIONE ENERGETICA
GLOBALE
62.047 kWh/m²anno


LIMITE DI LEGGE



PRESTAZIONE
RAFFRESCAMENTO
9.322 kWh/m²anno



PRESTAZIONE
RISCALDAMENTO
35.079 kWh/m²anno



PRESTAZIONE
ACQUA CALDA
26.968 kWh/m²anno

4. QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)



II

III

IV

V

5. Metodologie di calcolo adottate

Metodo calcolato di progetto (rif. prescritto UNI/TS 11300) secondo il paragrafo 4, punto 1 dell'allegato A (Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici) del Decreto Ministeriale 26 giugno 2009

6. RACCOMANDAZIONI

| Interventi | Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento | Tempo di ritorno (anni) |
|---|--|-------------------------|
| | | |
| PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE | 62.05 kWh/m ² anno | 0.0 |

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE


Riscaldamento



Raffrescamento



Acqua calda sanitaria

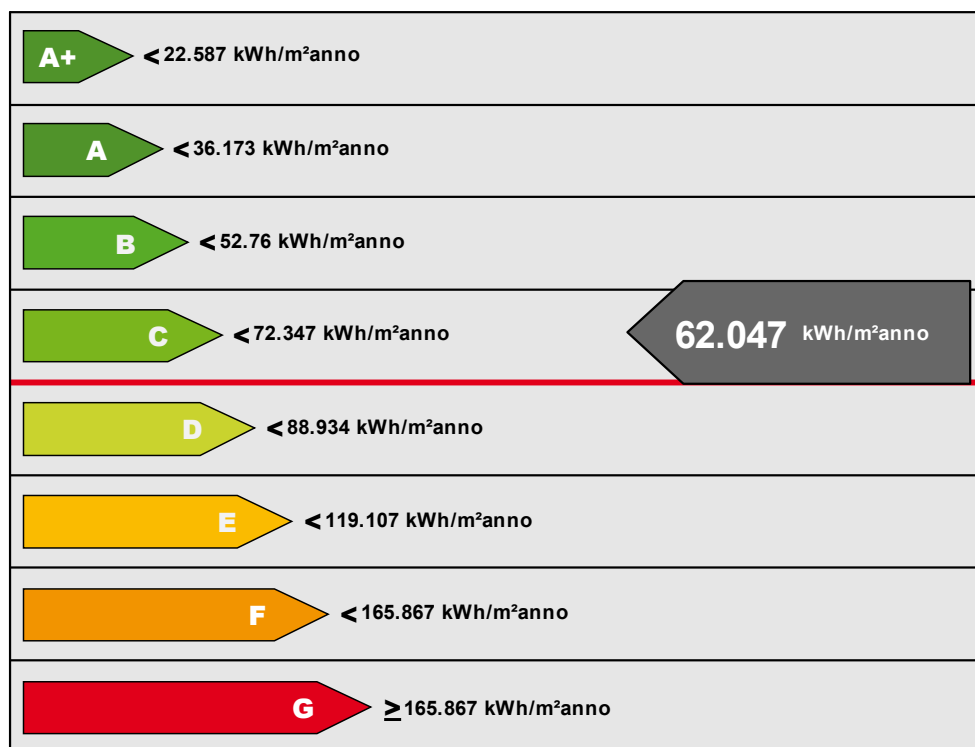

Riferimento legislativo
72.347 kWh/m²anno

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

| 8.1 RAFFRESCAMENTO | | 8.2 RISCALDAMENTO | | 8.3 ACQUA CALDA SANITARIA | |
|---|------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Indice energia primaria (EPe) | | Indice energia primaria (EPi) | 35.079 kWh/m²anno | Indice energia primaria (EPacs) | 26.968 kWh/m²anno |
| Indice energia primaria limite di legge | | Indice energia primaria limite di legge (d.lgs. 192/05) | 48.912 kWh/m²anno | | |
| Indice involucro (EPe, invol) | 9.322 kWh/m²anno | Indice involucro (EPi, invol) | 17.374 kWh/m²anno | Fonti rinnovabili | 0.00 kWh |
| Rendimento impianto | | Rendimento medio stagionale impianto (η_g) | 49.53% | | |
| Fonti rinnovabili | | Fonti rinnovabili | 0.00 kWh | | |

9. NOTE

(interventi di manutenzione edile ed impiantistica, energeticamente significativi, realizzati nella vita dell'edificio, sistemi gestionali in essere, ...)

10. EDIFICIO

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|
| Tipologia edilizia | in linea | | |
| Tipologia costruttiva | Blocco cassero | | |
| Anno di costruzione | 2011 | Numero unità immobiliari | 1 |
| Volume lordo riscaldato V (m³) | 365.50 | Superficie utile (m²) | 94,67 |
| Superficie disperdente S (m²) | 176.50 | Zona climatica/GG | D / 2 034 |
| Rapporto S/V | 0.48 | Destinazione d'uso | |

11. IMPIANTI

| | | | | |
|------------------------------|--|------|--------------|--------|
| Riscaldamento | Anno di installazione | 2011 | Tipologia | |
| | Potenza nominale (kW) | 0.0 | Combustibile | Metano |
| Acqua calda sanitaria | Anno di installazione | 2011 | Tipologia | |
| | Potenza nominale (kW) | 0.0 | Combustibile | Metano |
| Raffrescamento | Anno di installazione | 2011 | Tipologia | |
| | Potenza nominale (kW) | 0.0 | Combustibile | |
| Fonti rinnovabili | Anno di installazione | 2011 | Tipologia | |
| | Energia annuale prodotta (kWh _e /kWy _{h_t}) | 0.0 | | |

12. PROGETTAZIONE

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|--|
| Progettista/i architettonico | Ufficio tecnico - Distretto di Sassari | | |
| Indirizzo | | Telefono/e-mail | |
| Progettista/i impianti | Ufficio tecnico - Distretto di Sassari | | |
| Indirizzo | | Telefono/e-mail | |

13. COSTRUZIONE

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|--|
| Costruttore | | | |
| Indirizzo | | Telefono/e-mail | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|--|
| Direttore/i lavori | Ufficio tecnico - Distretto di Sassari | | |
| Indirizzo | | Telefono/e-mail | |

14. SOGGETTO CERTIFICATORE

| | | | |
|--|---|---|--|
| Ente/Organismo pubblico <input type="checkbox"/> | Tecnico abilitato <input checked="" type="checkbox"/> | Energy Manager <input type="checkbox"/> | Organismo / Società <input type="checkbox"/> |
|--|---|---|--|

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|--|
| Nome e cognome / Denominazione | | | |
| Indirizzo | | Telefono/e-mail | |
| Titolo | | Ordine/Iscrizione | |
| Dichiarazione di indipendenza | | | |
| Informazioni aggiuntive | | | |

15. SOPRALLUOGHI

| |
|--|
| |
|--|

16. DATI DI INGRESSO

| | |
|---|--|
| Progetto energetico <input checked="" type="checkbox"/> | Rilievo sull'edificio <input type="checkbox"/> |
| Provenienza e responsabilità | |
| | |

17. SOFTWARE

| | | | |
|---|--------|------------|----------------------|
| Denominazione | TerMus | Produttore | ACCA software S.p.A. |
| Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) | | | |
| Il software TerMus è conforme alle norme UNI/TS 11300:2008 come attestato nel CERTIFICATO n.1 del 06/07/2009 rilasciato dal CTI. | | | |

Data emissione: 09/03/2011

Firma del Tecnico



Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa
Distretto di SASSARI



PROGRAMMA DI INTERVENTO DI COSTRUZIONE ALLOGGI E.R.P.
Delibera G.R. n.71/32 del 16/12/2008

PROGETTO

COSTRUZIONE DI N.20 ALLOGGI A TEMPIO loc. Poi e Mantelli

Tav. n°

L

RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

Data: Marzo 2011

Il Progettista
(Ing. Gianpaolo Sanna)

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuliano Pazzola)

Il Direttore Generale
(Ing. Sebastiano Bitti)

A R E A
azienda regionale per l'edilizia abitativa

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
20 NUOVI ALLOGGI DI ERP
IN COMUNE DI TEMPIO
Loc. Poi e Mantelli

STUDIO
TECNICO-GEOLOGICO

Committente

A R E A
azienda regionale per l'edilizia abitativa

Il tecnico

Dr. Geol. Emilio Fenu

studio tecnico di geologia - pattada via amscora 8 – tel. 0794810462

Febbraio 2011

A R E A


azienda regionale per l'edilizia abitativa

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE

20 NUOVI ALLOGGI DI ERP

IN COMUNE DI TEMPIO

Loc. Poi e Mantelli

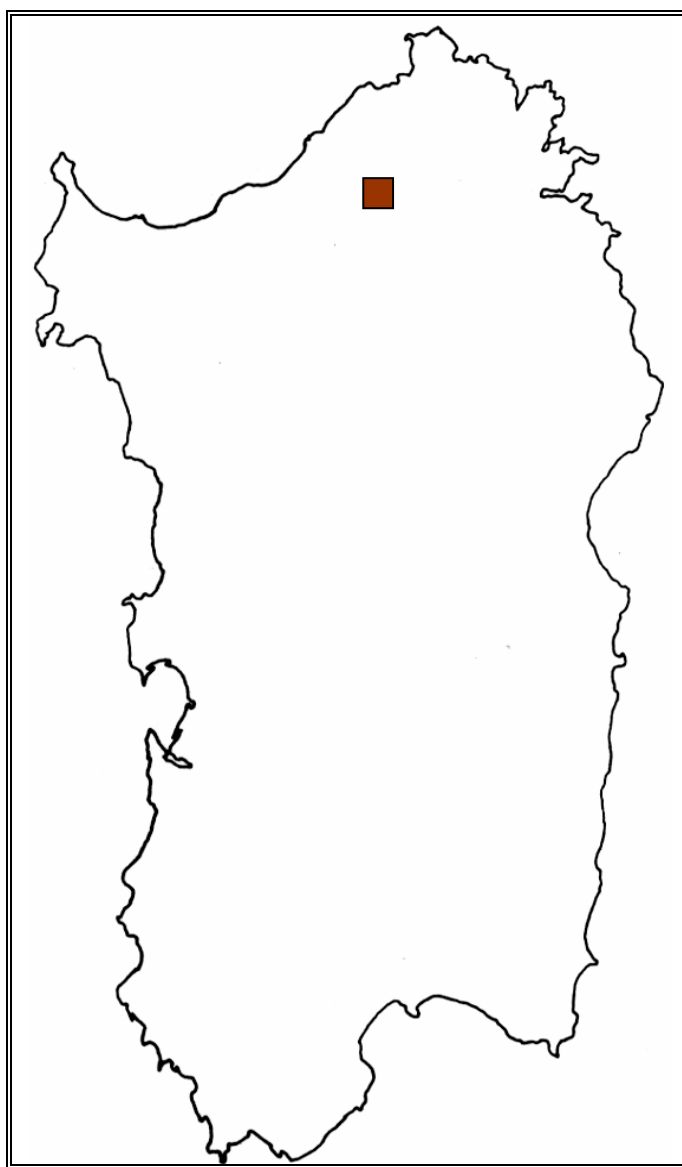

studio tecnico di geologia - pattada via amscora 8 – tel. 079 4810462

Febbraio 2011

INDICE

| | |
|---|--|
| 1 - PREMESSA | 2 |
| 2 - CARATTERISTICHE GEOLOGICHE GENERALI | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| 3 - LITOLOGIA | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| 4 - STRATIGRAFIA | 15 |
| 5 - CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE DEI TERRENI | 17 |
| Peso di volume | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Carichi di rottura | 18 |
| Classificazione RMR (Rock Mass Rating) di Bieniawski | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 6 - CONCLUSIONI | 22 |

1 - PREMESSA

Eseguito per incarico A R E A — azienda regionale per l'edilizia abitativa -, il presente lavoro consiste di una analisi geologico-tecnica dei terreni di fondazione di due struttura da destinare alla realizzazione di 20 alloggi di e.r.p. in Comune di Tempio Pausania, località Poi e Mantelli.

Lo scopo del presente studio attiene dunque alla necessità di acquisire informazioni in merito all'andamento stratigrafico del terreno direttamente interessato dalla costruzione in programma, alla presenza di falde acquifere, alla profondità ed alle oscillazioni della superficie piezometrica nonché a definire, sulla base dei risultati delle prove ed analisi effettuate su campioni prelevati in situ nel corso delle indagini geognostiche allo scopo disposte, le caratteristiche geo-meccaniche del terreno di fondazione.

La ricostruzione dell'andamento stratigrafico della serie in posto è stata realizzata mediante l'esecuzione di 6 pozzetti di prospezione.

L'esecuzione dei sondaggi dunque, oltre a risolvere le problematiche di ordine stratigrafico, hanno consentito una indispensabile verifica in ordine alla presenza di falda nel corpo della formazione granitica, nonché permesso l'esecuzione di prove penetrometriche in livelli di terreno dove si può prevedere verranno collocate le fondazioni delle strutture in progetto.

Lo studio è stato infine completato dalla elaborazione dei dati rilevati sul terreno ed acquisiti mediante le prove eseguite sui campioni che hanno appunto consentito la definizione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni direttamente interessati dalle strutture di fondazione.

Sono stati dunque, su tali basi, stabiliti gli ordini di grandezza dei carichi trasferibili al terreno di fondazione.

Il presente lavoro si è dunque articolato nei seguenti momenti:

- rilevamento geo-litologico, strutturale, morfologico e idrogeologico a grande scala;
- esame dei risultati di una serie di 6 pozzetti di prospezione, eseguiti in corrispondenza dell'area di ingombro dell'opera in progetto e spinti a profondità congruenti con le ipotesi progettuali in ordine alla profondità del livello di fondazione;
- prove penetrometriche in situ e analisi dei campioni provenienti dai pozzetti di prospezione e prelevati in maniera da risultare rappresentativi della serie in posto.
- ricerca ed esame dei dati reperibili nelle fonti ufficiali e riguardanti soprattutto la geologia, la stratigrafia e la tettonica della regione in esame.
- analisi delle notizie di proprietà dello scrivente, rilevati direttamente o acquisiti, riguardanti le caratteristiche idrauliche, geotecniche e di stabilità relative alla formazione di cui i terreni oggetto fanno parte.

2 - CARATTERI GEOLOGICI E STRUTTURALI

2.1 - Inquadramento nella geologia regionale

La zona in esame si localizza per intero all'interno dell'area occupata dal grande batolite granitico della Gallura, che costituisce l'ossatura della Sardegna nord-orientale, e più precisamente nelle falde nord-occidentali del massiccio del Limbara.

La regione è dunque costituita da rocce granitiche di età paleozoica, attraversate da manifestazioni filoniane sia acide (micrograniti, quarzo, pegmatiti) che basiche (lamprofiri).

Da una prima analisi petrografica, le rocce costituenti il plutone granitico, possono essere distinte in due tipi litoidi fondamentali: uno granodioritico ed uno granitico "stricto sensu", quest'ultimo più frequente dell'altro e costituito in massima parte da graniti normali, pegmatitici e micrograniti.

La messa in posto del batolite granitico viene universalmente attribuita a fenomeni di magmatismo sinorogenico connessi con le azioni orogenetiche del ciclo ercinico.

Conseguentemente all'insorgere delle poderose forze orogenetiche, e unitamente alle fenomenologie di contatto, si venne a determinare una profonda trasformazione dei sedimenti terrigeni che costituivano un nucleo primitivo di terre mediterranee.

I prodotti di questa intensa azione metamorfica si possono rilevare, seppure in piccole chiazze, anche a non considerevoli distanze dall'area in oggetto e consentono di ipotizzare una ben più ampia estensione delle coperture metamorfiche.

In questa regione infatti i processi erosivi, operando intensamente sulla copertura scistosa, hanno messo a nudo il nucleo granitico che affiora oggi su una superficie di oltre 1.500 chilometri quadrati e costituisce la più vasta area granitica della Sardegna e una delle più importanti d'Europa.

Tale evoluzione morfologica si è dunque prodotta in un lungo periodo di stasi orogenetica che ha nel contempo determinato l'irrigidimento dello zoccolo scistoso cristallino.

Le azioni della tettonica terziaria si sono manifestate, in questa regione periferica rispetto allo svolgersi della orogenesi alpina, attraverso delle intense azioni disgiuntive che, agendo sull'ormai rigido basamento scistoso-cristallino, hanno originato delle profonde fratture con conseguenti dislocazioni e formazioni di ampie fosse tettoniche.

La catena dei Monti del Limbara, che limita l'area in esame nel settore meridionale, si colloca in continuità strutturale con il pilastro settentrionale del graben di Chilivani, derivato appunto dalla tettonica terziaria.

A tali azioni disgiuntive hanno inoltre fatto seguito delle copiose profusioni di magmi, a chimismo prevalentemente trachitico, che si sono espansi in varie fasi intercalandosi ai prodotti della deposizione marina e lacustre dei bacini derivati dallo sprofondamento di blocchi dello zoccolo.

Sedimenti lacustri, da associare alla formazione del bacino di Oschiri, si rilevano in affioramento solo ad una certa distanza dall'area di nostro interesse e, più precisamente, a sud della S.S. N. 199 in corrispondenza del km. 32.

Tale affioramento costituisce anzi l'estrema propaggine orientale della formazione lacustre del bacino di Oschiri, talché dal rilievo di P.ta Tilicu Mannu ci si riporta nel più esteso dominio granitico.

2.2 - L'assetto strutturale

L'elemento geotettonico fondamentale che su scala regionale caratterizza l'area in oggetto, e che accomuna i diversi settori della Sardegna settentrionale, è costituito dall'evidente parallelismo delle diverse catene montuose, dovuto alla comune orientazione n.e.-s.o.

E' infatti questa la direzione verso cui si protendono le catene del Limbara, dei Monti di Alà, dell'Altopiano di Buddusò etc., e che, ereditata dall'orogenesi ercinica, è rimasta indenne durante il prodursi della tettonica terziaria che ha agito in questa regione extra-alpina esclusivamente ricalcando per sovrimposizione le forme già esistenti.

Una fitta rete di fratture si estende a tutta l'area granitica suddividendo la roccia in grossi blocchi che, dove le azioni erosive hanno agito più intensamente, appaiono raggruppati in cumuli di elementi sferoidali.

Relativamente all'orientazione delle fratture, da studi precedentemente eseguiti dallo scrivente, si è potuto rilevare che la direzione preferenziale è circa n.n.e.-s.s.w., mentre quella relativa agli elementi di maggiore dimensione, e cioè alle lineazioni più lunghe, è e.-w.

Né l'una né l'altra dunque coincidenti con la direzione n.e.-s.w. cui sembrano potersi riferire gli elementi geotettonici fondamentali di questo settore come del resto della Sardegna.

Non sembra dunque ragionevole collegare la genesi delle fratture ad eventi tettonici, parrebbe invece più attendibile un riferimento a fenomenologie

connesse con la messa in posto del magma ed in parte a fenomeni di ritrazione per raffreddamento di masse fuse.

Quest'ultima causa è certamente anche responsabile di certe strutture, rilevabili localmente nell'area in esame, che determinano una sorta di esfoliazione in grande delle cupole granitiche che si presentano "avviluppate" da uno strato di roccia di circa cinquanta centimetri di spessore.

Dove questo fenomeno si presenta con maggiore evidenza, imprime alla roccia una pseudo-stratificazione che rende il complesso granitico piuttosto particolare.

Quanto detto non significa certo che manchino nell'area in esame degli elementi strutturali riferibili ad importanti eventi tettonici, bensì che questi ultimi possono essere rilevati solo ad un esame a più ampio raggio.

Di natura evidentemente tettonica è per esempio la lineazione che partendo dal lago Coghinas attraversa Balascia e si imposta lungo un tratto rettilineo del Rio Limbara e dirige verso S. Antonio di Calangianus passando tra Luras e Calangianus nonché numerosi altri elementi la cui individuazione ed analisi evidentemente esula dagli interessi del presente lavoro.

2.3 - I caratteri morfologici

L'area in esame si colloca presso l'alveo di un affluente di destra del Rio Manzoni, il cui bacino imbrifero ha il limite che si produce sulla vetta di M.te San Giorgio (725 m.s.m.)

In contrapposizione alla maggiore asprezza del paesaggio rilevabile nei domini circostanti, l'area oggetto dell'intervento è caratterizzata da una morfologia collinare, che si produce verso nord-est in morbide forme ampiamente raccordantesi e assolutamente priva di brusche variazioni delle pendenze che si conservano generalmente entro valori non particolarmente elevati; in particolare lungo la direttrice orientata verso Nurchis si osserva come il Rio Parapinta e San Paolo sviluppano i loro corsi tra i rilievi collinari di Nuracu, Ziu Lisandru e M.te Zighinu – tutti aventi un'altitudine intorno ai 500 m.s.m., che rappresentano le quote più elevate, mentre nell'intorno il paesaggio si caratterizza per le tenui pendenze dei versanti.

Una variamente potente coltre eluviale, ricoprente l'imbasamento granitico, addolcisce parzialmente la morfologia dei rilievi meno elevati, talché la regolarità delle forme è solo localmente interrotta dai cumuli di blocchi granitici che, emergendo dalla coltre eluviale, rompono la monotonia del paesaggio.

La valle –fortemente asimmetrica a causa delle elevate quote meridionali della catena del Limbara che non si ripetono nei rilievi settentrionali della direttrice Bortigiadas-Agius- è bordata dagli aspri rilievi del Limbara che degradano,

dalle numerose quote superiori ai mille metri, attraverso ripidissimi versanti incisi da corsi d'acqua che sovente danno luogo a piccole cascate.

Le vette più elevate, e non solo, sono modellate spesso in forma di guglie che incombono sulla valle e che, in ragione della loro precaria stabilità e dell'intensa fratturazione del granito, sono all'origine delle numerose frane di crollo che hanno cosparso i versanti dei rilievi di enormi blocchi di roccia.

Il reticolo idrografico, che si sviluppa a carattere dendritico, è spesso impostato su elementi strutturali preesistenti, com'è facile dedurre dall'incisione di certe valli o dalle improvvise variazioni della direzione dei corsi d'acqua.

3 - LITOLOGIA

Come già detto la regione ospitante l'area interessata dall'intervento è caratterizzata litologicamente da rocce granitiche rilevabili in facies porfiroide, a grana media e microgranitica.

A ciascuna di tali differenziazioni, con cui il granito si produce in affioramento, si associano i relativi prodotti dell'alterazione della roccia a costituire una copertura arcossica di varia potenza.

La formazione arcossica si rileva localmente, e comunque sempre discontinuamente, a copertura dei nuclei granitici compatti dalla cui degradazione, o più spesso dall'alterazione di differenziazioni meno resistenti, deriva.

I sabbioni arcossici sono in effetti costituiti dagli elementi cristallini derivanti dallo sfaldamento della struttura granulare del granito e dalla conseguente liberazione dei vari componenti a seguito dei processi di idrolisi del feldspato e di ossidazione e mobilizzazione delle miche.

Poco o affatto trasportati i sabbioni costituenti la formazione arcossica presentano non di rado delle palesi tracce dell'antica struttura litoide, la cui evidenza costituisce anzi una misura dell'intensità del processo di degradazione. E' spesso possibile rilevare i vari termini di transizione dalla roccia compatta ai sabbioni arcossici la cui evoluzione, attraverso diversi gradi di arenizzazione, avviene spesso senza soluzione di continuità, mediante impercettibili variazioni che marcano i vari stadi del processo.

La roccia compatta in affioramento consiste invece in un granito a grana media, con solo qualche feldspato leggermente più sviluppato ma non in maniera tale da imprimere un carattere porfirico alla struttura della roccia.

Nemmeno la colorazione rosa del feldspato è tale da caratterizzare cromaticamente il granito che nell'insieme presenta un colore grigiastro con pur numerose chiazze rosate.

L'abbondante mica è uniformemente dispersa nella roccia e solo di rado si rilevano delle concentrazioni di questa componente che, soprattutto nei livelli più superficiali, è sempre interessata da evidenti fenomeni di ossidazione.

Nell'area destinata ad ospitare l'opera in oggetto sono anche presenti dei depositi eluviali e colluviali che ricoprono una variamente potente coltre arcuata che, senza soluzione di continuità, sfuma nel granito compatto imbasante la regione.

Tali coperture non sembrano infatti prodursi in potenze considerevoli talché è facile ipotizzare il repentino passaggio dai livelli superficiali di copertura al granito arenizzato.

4 - IDROGEOLOGIA

Come è facile arguire, in contesto litologico quale quello in esame, le condizioni idrogeologiche sono piuttosto semplici e poco articolate.

Praticamente la quasi totalità delle sorgenti presenti nell'area risultano infatti emergenti in corrispondenza delle fratture dell'imbasamento cristallino, a conferma del fatto che l'unica possibilità all'esistenza di una idrologia sotterranea è rappresentata appunto dalla circolazione idrica consentita dalla fitta rete di diaclasi che attraversano la formazione granitica.

La possibilità che in questa realtà geolitologica si determinino delle condizioni adatte a che si verifichino dei significativi accumuli idrici sotterranei, è dunque legata all'intensità con cui i sistemi di fratture interessano la roccia.

In corrispondenza di zone intensamente fratturate si sviluppa infatti una circolazione idrica talvolta anche molto intensa e che, contribuendo ad accelerare i normali processi di arenizzazione del granito, favorisce lo sviluppo delle potenzialità di stoccaggio dell'acquifero.

Non è comunque molto consueto il caso che tale processo dia luogo al formarsi di acquiferi caratterizzati da grandi possibilità di accumulo e da considerevoli riserve.

Le falde sono infatti geometricamente definite dall'irregolare andamento delle plaghe di arenizzazione che, pur producendosi in volumi talvolta significativi, danno luogo ad acquiferi dalla portata limitata, fatte salvo ovviamente le debite ma non numerosissime eccezioni.

Le riserve idriche che in tali acquiferi si localizzano sono solitamente piuttosto esigue e non consentono emungimenti attraverso portate significative.

Gli acquiferi consistono solitamente in unità idrogeologiche spazialmente limitate e assai poco articolate e che non si reggono su condizioni particolarmente complesse ma si risolvono in isolate e discontinue realtà idrogeologiche rappresentate dalle aree di arenizzazione, e localmente dalle coperture detritiche, talvolta comunicanti attraverso il sistema di fratture.

È proprio la densità della fratturazione che governa l'infiltrazione delle acque e il loro movimento nel corpo della formazione granitica talché queste rocce, impermeabili in termini di permeabilità primaria, acquisiscono a seguito della fratturazione una permeabilità secondaria *in grande* che le rende oggetto di una certa circolazione idrica.

5 - STRATIGRAFIA

Per la ricostruzione delle caratteristiche stratigrafiche dei terreni, cui la formazione in posto da luogo nell'intorno del sito interessato dall'intervento, si è fatto riferimento ad una serie di 6 pozzetti di prospezione, le stratigrafie verranno di seguito rappresentate, eseguiti nell'area di ingombro degli edifici in progetto ed omogeneamente dislocate in maniera da consentire più attendibili estrapolazioni.

Tutti i sondaggi hanno rilevato una copertura organica dallo spessore contenuto e variabile da un minimo di 0.20 m ad un massimo di 1.00 m; si tratta di un terreno interessato dall'azione pedogenetica esercitata dalla vegetazione presente sui sabbioni arcosici derivati dalla degradazione del granito.

Superato il livello organico i sondaggi eseguiti nei due diversi siti differiscono sostanzialmente; mentre infatti i sondaggi eseguiti nel lotto situato in via Pertini mostrano, al di sotto di una copertura organica molto contenuta, direttamente il granito arenizzato, solo localmente annunciato da tenuissimi livelli di sabbione arcosico, che porta rapidamente l'escavatore al rifiuto, nel lotto più a valle tutti i sondaggi hanno messo in evidenza un passaggio molto lento dai sabbioni semi-sciolti dei livelli superficiali al granito arenizzato che, rilevato nei pozzetti S_{2a} ed S_{3a}, non manifesta un carattere lapideo particolarmente marcato.

Il sondaggio S_{1a} mostra con una certa evidenza la presenza di una sensibile quantità di argilla nella composizione del sabbione arcosico; non avendo subito questi materiali alcun trasporto, e al più delle limitate mobilitazioni in loco, si deve dedurre che la maggiore presenza della componente argillosa sia dovuta al

fatto che il sabbione si sia prodotto a seguito dell'esplicarsi delle azioni di degradazione su una differenziazione del granito originario.

È possibile che una maggiore presenza della componente micacea nel granito abbia prodotto questa maggiore abbondanza di argilla.

Di seguito vengono riportate le stratigrafie rilevate nei sei pozzetti di prospezione, mentre nella pagina seguente vengono indicati, mediante rappresentazione cartografica, i punti in cui sono stati eseguiti i sondaggi.

Come è facile rilevare i pozzetti indicati con la lettera “a” sono quelli realizzati nel lotto di via Pertini, mentre quelli realizzati nel lotto meridionale sono indicati con la lettera “b”.

| Pozzetto S _{1a} | | Pozzetto S _{2a} | | Pozzetto S _{3a} | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| 0.00-0.20 | Suolo organico in matrice sabbiosa | 0.00-0.30 | Sabbione pedogenizzato | 0.00-0.30 | Sabbione pedogenizzato |
| | Granito arenizzato sempre più coerente con la profondità. | | Dopo un tenue livello di sabbione arcossico si passa al granito arenizzato. A rifiuto | | Granito arenizzato avente già dai livelli superiori carattere lapideo. A rifiuto |
| 0.20-1.60 | A rifiuto | 0.30-1.00 | | 0.30-0.80 | |
| Pozzetto S _{1b} | | Pozzetto S _{2b} | | Pozzetto S _{3b} | |
| 0.00-0.80 | Suolo organico in matrice sabbiosa | 0.00-1.00 | Suolo organico in matrice sabbiosa | 0.00-0.70 | Suolo organico in matrice sabbiosa |
| | Sabbione arcossico mediamente compatto e addensato. Sensibile partecipazione della componente argillosa | | Sabbione arcossico compatto. Pur non rilevandosi la struttura del granito appare molto coeso. Alla base appare il granito arenizzato e la macchina va a rifiuto | | Sabbione arcossico sempre più compatto con il procedere in profondità fino a giungere a rifiuto |
| 0.80-2.50 | | 1.00-2.00 | | 0.70-2.00 | |

6 - CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE DEI TERRENI

6.1 – Lotto A – Via Pertini

Le proprietà geotecniche dei litotipi rappresentativi della parte di sottosuolo maggiormente interessato dalla distribuzione delle tensioni indotte dall'opera in progetto, sono state determinate quantitativamente attraverso analisi geotecniche di laboratorio eseguite su campioni estratti dai sondaggi S_{1A} , S_{2A} , S_{3A} .

Essendo la serie abbastanza omogenea ed essendo tutti i sondaggi eseguiti su materiale lapideo, sono stati presi in esame dei campioni di granito maggiormente alterato allo scopo di produrre delle considerazioni cautelative.

Essendo dunque il materiale lapideo, è stato sottoposto a prove dinamiche di schiacciamento denominate Point Load Test.

Il campione viene caricato sia verticalmente, e pertanto con una tensione perpendicolare alla sezione del campione trattato e quindi con un carico della stessa natura di quello che verrà trasmesso dalla struttura, sia tangenzialmente.

Si valuta dunque il valore della tensione che determina la rottura del campione e da tale valore, applicando valutazioni indicate dalla letteratura geotecnica, si ottiene la capacità portante del terreno

I litotipi rinvenuti presentano caratteri fisico-meccanici differenti in funzione del diverso grado di alterazione e degradazione della roccia, della presenza o assenza di fratturazione etc. Dal punto di vista geomeccanico le caratteristiche strutturali influiscono in modo sostanziale sul comportamento della roccia rispetto alle sollecitazioni indotte.

L'analisi è stata realizzata, come già detto, mediante l'esecuzione di prove di laboratorio del tipo Point Load Test di cui si allegano i relativi certificati e mediante comparazione con analisi precedentemente eseguite su litotipi analoghi a quelli rinvenuti nell'area in esame.

Carichi di rottura

Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i valori dei carichi di rottura ricavati dalle prove di compressione. E' evidente una discreta omogeneità dei dati ricavati dalle prove eseguite sui campioni di granito, con valori di resistenza a compressione uniassiale compresi entro l'intervallo 18.31-22.53 MPa. Tale variabilità è da porre in relazione alle differenti caratteristiche strutturali dei litotipi analizzati, caratterizzati da notevole variabilità nel grado di fratturazione che influisce sensibilmente sulla resistenza delle rocce.

I risultati delle prove di compressione sono stati utilizzati per determinare la posizione dei litotipi esaminati nella classifica di DEERE e MILLER, che suddivide le rocce in 5 classi (da A a E) in funzione decrescente della resistenza a compressione ($\sigma < 28,0$ MPa). I bassi valori rilevati inquadrano la roccia nella classe E (resistenza estremamente bassa, con $\sigma < 28,0$ MPa).

Tab. 1 - Parametri del terreno ricavati da prove di laboratorio

| Campione | Profondità (m) | Carico di rottura (MPa) |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| S _{1A} | 0.80 | 22.53 |
| S _{2A} | 1.00 | 18.32 |
| S _{3A} | 1.20 | 20.28 |

È stato dunque assunta una resistenza a compressione pari a 180 kg/cm² che rappresenta il valore più basso tra quelli derivati dalle prove di compressione.

Si tratta di un valore medio ma che tiene conto del fatto che i fattori che concorrono a determinare la resistenza a compressione sono piuttosto numerosi, tra gli altri la microfessurazione che potrebbe interessare in alcuni settori la roccia rilevata nell'area interessata dal progetto.

Nel caso di materiali puramente coesivi dunque, il carico ammissibile viene calcolato mediante la seguente relazione:

$$q_a = 1/\rho \left(\frac{1}{2} q_o N_c \right)$$

dove:

q_a = Carico unitario ammissibile (t/m²)

q_o = Resistenza a compressione (t/m²)

N_c = Coefficienti adimensionali funzione dell'angolo di attrito interno e che per un valore nullo dell'angolo di attrito assume un valore pari a 5.14.

ρ = Fattore di sicurezza posto pari a 30 secondo le indicazioni di numerosi autori.

Assumendo il valore della resistenza a compressione pari a 180 kg/cm², si ottiene dunque un carico ammissibile di 15 kg/cm².

6.2 – Lotto B – Comparto sud-orientale

Il lotto B si colloca in direzione sud-est rispetto al primo e ad una distanza di circa 100 metri; il relativo progetto andrà dunque realizzato di fronte alle strutture già in essere e prodotte nel precedente intervento.

Come ampiamente documentato in precedenza, il sito in oggetto si caratterizza per la presenza di sabbioni arcosisi, derivanti dalla degradazione del granito, fino alla profondità sondata.

Per la verifica diretta delle proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione sono state effettuate n°2 prove penetrometriche dinamiche continue del tipo DPM (Dynamic Probing Medium – Codifica ISSMFE-1988).

Le prove sono state effettuate con penetrometro della TECNOTEST modello TP225 fino a raggiungere la profondità di “rifiuto” alla penetrazione.

I tabulati delle correlazioni riferite alle prove DPM eseguite sono allegati alla relazione e riportati nelle ultime pagine di esse.

Sulla base dei valori ricavati è stato possibile ricostruire una sezione geotecnica rappresentativa del terreno entro la profondità d’indagine.

Sulla base dei profili penetrometrici ottenuti, entro la profondità massima indagata, si possono distinguere i seguenti livelli litologici:

- Terreno vegetale;
- Sabbioni da poco a mediamente addensati;
- Sabbioni ben addensati.

L’analisi geotecnica del terreno di fondazione è finalizzata alla caratterizzazione geotecnica e geomeccanica del terreno al fine di poter definire le caratteristiche dimensionali e di forma delle strutture di fondazione.

Le verifiche geotecniche sono finalizzate alla valutazione del valore di capacità portante ultima (q_{ult}) ed ammissibile (q_{amm}) del terreno per la tipologia e geometria di fondazione prevista in progetto.

Di seguito si riportano i risultati delle prove DPM e le correlazioni da queste derivate per la determinazione di valori di riferimento delle principali proprietà geotecniche dei terreni.

Nella tabella seguente si riportano le unità litotecniche distinte lungo le verticali delle prove penetrometriche effettuate, con l'indicazione della profondità della base dello strato, misurata in metri dal piano di campagna.

TAB. 1 – SCHEMA STRATIGRAFICO RICAVALTO DALLE PROVE DPM

| Prova DPM | Unità litotecnica | | |
|-----------|-------------------|--|---------------------------|
| | Terreno organico | Sabbioni da poco a mediamente addensati | Sabbioni ben addensati |
| DPM 1 | 1.00 | 1.80 | >2.40 |
| DPM 2 | 0.70 | 1.40 | >2.00 |

L'elaborazione dei dati rilevati mediante le prove penetrometriche ha consentito dunque di calcolare la capacità portante del terreno di fondazione secondo le ipotesi dimensionali e di forma della struttura di fondazione.

I valori riportati per la determinazione della capacità portante (in rosso) si riferiscono ad un cedimento uniforme massimo di 2.5 cm e sono compresi fra un massimo di 1.62 kg/cm² (prova DPM 1) ed un minimo di 1.76 kg/cm² (prova DPM 2).

Le verifiche eseguite evidenziano, comunque, la necessità di ottenere, in sede di preparazione del piano di fondazione, superfici omogenee al fine di minimizzare al massimo possibili cedimenti differenziali.

7 - CONCLUSIONI

Dall'analisi eseguita e sulla base dei calcoli prodotti è stato possibile esprimere una valutazione dei valori di carico ammissibile, relativamente ai terreni di fondazione delle due strutture residenziale previste da AREA in via Pertini, a Tempio Pausania, e nel lotto immediatamente a sud-est del primo..

Sono state dunque dedotte, secondo le ipotesi progettuali, i valori delle tensioni di rottura del terreno di fondazione.

Relativamente alle caratteristiche del terreno di fondazione è stato rilevato che presenta, nel complesso, discrete caratteristiche geotecniche, come si evince appunto dai dati fisico-meccanici provenienti dalle analisi di laboratorio.

I sondaggi eseguiti hanno dunque consentito di ricostruire la successione stratigrafica con cui la formazione in posto si produce.

Tutti i sondaggi hanno intercettato una copertura organica costituita da sabbioni arcosici debolmente pedogenizzati ed aventi spessori variabili da pochi centimetri, in via Pertini, a poco meno di un metro nel lotto sud.; successivamente lo scavo ha intercettato immediatamente il granito arenizzato e rapidamente tendente al lapideo, in via Pertini, mentre ha attraversato livelli compresi tra 1.00 e 1.50 m di sabbione arcosico nel lotto sud.

Non è stata ravvisata alcuna circolazione idrica per cui, considerato che i sondaggi sono stati eseguiti dopo un lungo periodo di abbondanti piogge, si deve dedurre l'assenza di falda nei livelli pur permeabili di sabbione arcosico che ricopre la base granitica..

Il calcolo della capacità portante è stato sviluppato ipotizzando un comportamento meccanico ascrivibile ai terreni litoidi e il carico unitario

ammissibile (q_a) è risultato di un ordine superiore a quanto comportano le ipotesi progettuali.

Relativamente al lotto ubicato immediatamente a sud di via Pertini, è stato rilevato, attraverso i sondaggi eseguiti, un livello costituito da sabbioni arcosici, derivati dalla degradazione del granito, che saranno presumibilmente interessati dalla strutture di fondazione.

Su tali terreni è stato valutata una possibilità portante dell'ordine di 1.6-1.7 kg/cm².

Poiché è possibile che nel corpo dei sabbioni arcosici siano contenuti dei nuclei di roccia compatta che potrebbero dare luogo a pericolose discontinuità del terreno di fondazione, sarà importante precauzione quella di eseguire, una volta sbancato il terreno e individuato il piano di posa, delle attente osservazioni su tale piano allo scopo di verificare le reali condizioni di omogeneità del terreno di fondazione; tale verifica è necessaria anche nel lotto di via Pertini allo scopo di evitare eventuali e negative ripercussioni sulla struttura a seguito di soluzioni nella continuità delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione.

**CERTIFICATI
DI
LABORATORIO**

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Committente: Dott. Geol. Emilio Fenu
 Cantiere: Tempio Pausania
 Località: Area B

Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: DPM (DL030 10) (Medium)

| | | |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| | Rif. Norme | DIN 4094 |
| Peso Massa battente | 30 | Kg |
| Altezza di caduta libera | 0,20 | m |
| Peso sistema di battuta | 21 | Kg |
| Diametro punta conica | 35,68 | mm |
| Area di base punta | 10 | cm ² |
| Lunghezza delle aste | 1.00 | m |
| Peso aste a metro | 2,9 | Kg/m |
| Profondità giunzione prima asta | 0,80 | m |
| Avanzamento punta | 0,10 | m |
| Numero colpi per punta | N(10) | |
| Coeff. Correlazione | 0,761 | No |
| Rivestimento/fanghi | | |
| Angolo di apertura punta | 60 ° | |

Classificazione ISSMFE (1988) delle sonde Penetrometriche dinamiche

| Tipo | Sigla di riferimento | Peso della massa battente in Kg |
|---------------|----------------------|---------------------------------|
| Leggero | DPL (Light) | M<10 |
| Medio | DPM (Medium) | 10<M<40 |
| Pesante | DPH (Heavy) | 40<M<60 |
| Super pesante | DPSH (Super Heavy) | M>60 |


OPERATORE

Sarda Sondaggi S.r.l.

RESPONSABILE

Sarda Sondaggi S.r.l.

SARDA SONDAGGI srl
Z. l. Pr. Niedda Nord - Str. 28
SASSARI
P. IVA 02144370901



PROVA ...DPM 1

Strumento utilizzato... DPM (DL030 10) (Medium)
 Prova eseguita in data 09/02/2011
 Profondità prova 2,40 mt
 Falda non rilevata

| Profondità (m) | Nr. Colpi | Calcolo coeff. riduzione sonda Chi | Res. dinamica ridotta (Kg/cm²) | Res. dinamica (Kg/cm²) | Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (Kg/cm²) | Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (Kg/cm²) |
|-------------------|--------------|--|--------------------------------------|---------------------------|---|--|
| 0,10 | 3 | 0,857 | 8,58 | 10,02 | 0,43 | |
| 0,20 | 9 | 0,855 | 25,69 | 30,06 | 1,28 | |
| 0,30 | 15 | 0,803 | 40,21 | 50,09 | 2,01 | |
| 0,40 | 18 | 0,801 | 48,14 | 60,11 | 2,41 | |
| 0,50 | 21 | 0,749 | 52,52 | 70,13 | 2,63 | |
| 0,60 | 19 | 0,797 | 50,57 | 63,45 | 2,53 | |
| 0,70 | 19 | 0,795 | 50,45 | 63,45 | 2,52 | |
| 0,80 | 23 | 0,743 | 57,09 | 76,81 | 2,85 | |
| 0,90 | 25 | 0,742 | 61,91 | 83,49 | 3,10 | |
| 1,00 | 26 | 0,740 | 64,23 | 86,83 | 3,21 | |
| 1,10 | 24 | 0,738 | 56,13 | 76,06 | 2,81 | |
| 1,20 | 20 | 0,786 | 49,83 | 63,38 | 2,49 | |
| 1,30 | 18 | 0,785 | 44,75 | 57,04 | 2,24 | |
| 1,40 | 21 | 0,733 | 48,77 | 66,55 | 2,44 | |
| 1,50 | 23 | 0,731 | 53,30 | 72,89 | 2,66 | |
| 1,60 | 24 | 0,730 | 55,49 | 76,06 | 2,77 | |
| 1,70 | 22 | 0,728 | 50,75 | 69,72 | 2,54 | |
| 1,80 | 20 | 0,776 | 49,20 | 63,38 | 2,46 | |
| 1,90 | 22 | 0,725 | 50,53 | 69,72 | 2,53 | |
| 2,00 | 20 | 0,773 | 49,00 | 63,38 | 2,45 | |
| 2,10 | 21 | 0,722 | 45,69 | 63,32 | 2,28 | |
| 2,20 | 36 | 0,670 | 72,74 | 108,54 | 3,64 | |
| 2,30 | 43 | 0,619 | 80,20 | 129,65 | 4,01 | |
| 2,40 | 60 | 0,617 | 111,64 | 180,90 | 5,58 | |

Carico limite e cedimenti fondazione Metodo di...Terzaghi Peck (1948)

| | |
|--|-------------|
| Larghezza fondazione B | 1,00 mt |
| Immorsamento Fondazione dal p.c. | 0,70 mt |
| Peso di volume medio sino a B sotto p. fondaz. | 1,80 t/mc |
| Prof. Falda dal p.c. H | 10,00 mt |
| Nspt medio (N/30) entro prof. B dal p. fondaz. | 22,00 mt |
| Pressione ammissibile sulla fondazione | 1,50 Kg/cm² |
| Quota di riferimento Nspt | 3,00 mt |
| Spessore strato compressibile (max. sino 2B) | 2,00 mt |

| | |
|---|-------------------------------|
| Coefficiente Cd per immersione | 0,83 |
| Coefficiente Cw per falda | 1,00 |
| Tens. ammissibile per un ced. = 2,5 cm | 1,62 Kg/cm^q |
| Cedimento corrispondente | 2,13 cm |

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA DPM 1

TERRENI COESIVI

Coesione non drenata

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Correlazione | Cu (Kg/cm ²) |
|----------|-------|------------------|--------------|--------------------------|
| Strato 1 | 14,79 | 1,80 | Sanglerat | |

Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico)

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Correlazione | Qc (Kg/cm ²) |
|----------|-------|------------------|------------------|--------------------------|
| Strato 1 | 14,79 | 1,80 | Robertson (1983) | |

Modulo Edometrico

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Correlazione | Eed (Kg/cm ²) |
|----------|-------|------------------|------------------------|---------------------------|
| Strato 1 | 14,79 | 1,80 | Stroud e Butler (1975) | |

Modulo di Young

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Correlazione | Ey (Kg/cm ²) |
|----------|-------|------------------|--------------|--------------------------|
| Strato 1 | 14,79 | 1,80 | Apollonia | |

Classificazione AGI

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Correlazione | Classificazione |
|----------|-------|------------------|----------------------------|-----------------|
| Strato 1 | 14,79 | 1,80 | Classificaz. A.G.I. (1977) | CONSISTE |

Peso unità di volume

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Correlazione | Peso unità di volume (t/m ³) |
|----------|-------|------------------|-------------------|--|
| Strato 1 | 14,79 | 1,80 | Meyerhof ed altri | |

Peso unità di volume saturo

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Correlazione | Peso unità di volume saturo (t/m ³) |
|----------|-------|------------------|--------------------------------------|---|
| Strato 1 | 14,79 | 1,80 | Bowles 1982, Terzaghi-Peck 1948/1967 | |

TERRENI INCOERENTI

Densità relativa

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Densità relativa (%) |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Strato 2 | 18,83 | 2,20 | 18,83 | Gibbs & Holtz 1957 | |
| Strato 3 | 39,19 | 2,40 | 39,19 | Gibbs & Holtz 1957 | |

Angolo di resistenza al taglio

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Angolo d'attrito (°) |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| Strato 2 | 18,83 | 2,20 | 18,83 | Sowers (1961) | 30 |
| Strato 3 | 39,19 | 2,40 | 39,19 | Sowers (1961) | 30 |

Modulo di Young

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Modulo di Young (Kg/cm ²) |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Strato 2 | 18,83 | 2,20 | 18,83 | Bowles (1982) Sabbia Media | 10000 |
| Strato 3 | 39,19 | 2,40 | 39,19 | Bowles (1982) Sabbia Media | 20000 |

Modulo Edometrico

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Modulo Edometrico (Kg/cm ²) |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Strato 2 | 18,83 | 2,20 | 18,83 | Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia) | 6000 |
| Strato 3 | 39,19 | 2,40 | 39,19 | Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia) | 10000 |

Classificazione AGI

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Classificazione |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Strato 2 | 18,83 | 2,20 | 18,83 | Classificazione A.G.I. 1977 | MODERATAMENTE ADDENSATA |
| Strato 3 | 39,19 | 2,40 | 39,19 | Classificazione A.G.I. 1977 | ADDENSATA |

Peso unità di volume

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Gamma (t/m ³) |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Strato 2 | 18,83 | 2,20 | 18,83 | Meyerhof ed altri | 1,8 |
| Strato 3 | 39,19 | 2,40 | 39,19 | Meyerhof ed altri | 1,8 |

Peso unità di volume saturo

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Gamma Saturata (t/m ³) |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Strato 2 | 18,83 | 2,20 | 18,83 | Terzaghi-Peck 1948-1967 | 1,8 |
| Strato 3 | 39,19 | 2,40 | 39,19 | Terzaghi-Peck 1948-1967 | 1,8 |

Modulo di Poisson

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Poisson |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|--------------|---------|
| Strato 2 | 18,83 | 2,20 | 18,83 | (A.G.I.) | 0,3 |
| Strato 3 | 39,19 | 2,40 | 39,19 | (A.G.I.) | 0,3 |

Modulo di deformazione a taglio

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | G (Kg/cm ²) |
|--|------|------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|
|--|------|------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|

| | | | | | |
|----------|-------|------|-------|------------------------|----|
| Strato 2 | 18,83 | 2,20 | 18,83 | Ohsaki (Sabbie pulite) | 10 |
| Strato 3 | 39,19 | 2,40 | 39,19 | Ohsaki (Sabbie pulite) | 20 |

Velocità onde

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Velocità onde m/s |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
| Strato 2 | 18,83 | 2,20 | 18,83 | | 2 |
| Strato 3 | 39,19 | 2,40 | 39,19 | | 3 |

Liquefazione

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Potenziale Liquefazione |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Strato 2 | 18,83 | 2,20 | 18,83 | Seed (1979) (Sabbie e ghiaie) | 0.04 |
| Strato 3 | 39,19 | 2,40 | 39,19 | Seed (1979) (Sabbie e ghiaie) | > |

Modulo di reazione Ko

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Ko (Kg/cm³) |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| Strato 2 | 18,83 | 2,20 | 18,83 | Navfac 1971-1982 | |
| Strato 3 | 39,19 | 2,40 | 39,19 | Navfac 1971-1982 | |

Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico)

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Qc (Kg/cm²) |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| Strato 2 | 18,83 | 2,20 | 18,83 | Robertson 1983 | 3 |
| Strato 3 | 39,19 | 2,40 | 39,19 | Robertson 1983 | 4 |

PROVA ...DPM 2

Strumento utilizzato... DPM (DL030 10) (Medium)
 Prova eseguita in data 09/02/2011
 Profondità prova 1,90 mt
 Falda non rilevata

| Profondità (m) | Nr. Colpi | Calcolo coeff. riduzione sonda Chi | Res. dinamica ridotta (Kg/cm²) | Res. dinamica (Kg/cm²) | Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (Kg/cm²) | Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (Kg/cm²) |
|-------------------|--------------|--|--------------------------------------|---------------------------|---|--|
| 0,10 | 12 | 0,857 | 34,33 | 40,07 | 1,72 | |
| 0,20 | 15 | 0,805 | 40,31 | 50,09 | 2,02 | |
| 0,30 | 19 | 0,803 | 50,93 | 63,45 | 2,55 | |
| 0,40 | 23 | 0,751 | 57,67 | 76,81 | 2,88 | |
| 0,50 | 28 | 0,749 | 70,02 | 93,51 | 3,50 | |
| 0,60 | 27 | 0,747 | 67,36 | 90,17 | 3,37 | |
| 0,70 | 24 | 0,745 | 59,72 | 80,15 | 2,99 | |
| 0,80 | 22 | 0,743 | 54,61 | 73,47 | 2,73 | |
| 0,90 | 26 | 0,742 | 64,39 | 86,83 | 3,22 | |
| 1,00 | 26 | 0,740 | 64,23 | 86,83 | 3,21 | |
| 1,10 | 28 | 0,738 | 65,48 | 88,73 | 3,27 | |
| 1,20 | 23 | 0,736 | 53,66 | 72,89 | 2,68 | |
| 1,30 | 20 | 0,785 | 49,73 | 63,38 | 2,49 | |
| 1,40 | 27 | 0,733 | 62,71 | 85,56 | 3,14 | |
| 1,50 | 22 | 0,731 | 50,98 | 69,72 | 2,55 | |
| 1,60 | 26 | 0,730 | 60,11 | 82,39 | 3,01 | |
| 1,70 | 29 | 0,728 | 66,90 | 91,90 | 3,34 | |
| 1,80 | 44 | 0,626 | 87,33 | 139,44 | 4,37 | |
| 1,90 | 60 | 0,625 | 118,79 | 190,14 | 5,94 | |

Carico limite e cedimenti fondazione Metodo di...Terzaghi Peck (1948)

| | |
|--|-------------------------------|
| Larghezza fondazione B | 1,00 mt |
| Immorsamento Fondazione dal p.c. | 0,70 mt |
| Peso di volume medio sino a B sotto p. fondaz. | 1,80 t/mc |
| Prof. Falda dal p.c. H | 10,00 mt |
| Nspt medio (N/30) entro prof. B dal p. fondaz. | 24,00 mt |
| Pressione ammissibile sulla fondazione | 1,50 Kg/cm ² |
| Quota di riferimento Nspt | 2,00 mt |
| Spessore strato compressibile (max. sino 2B) | 0,00 mt |
| Coefficiente Cd per immorsamento | 0,83 |
| Coefficiente Cw per falda | 1,00 |
| Tens. ammissibile per un ced. = 2,5 cm | 1,76 Kg/cm² |
| Cedimento corrispondente | 1,95 cm |

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA DPM 2

TERRENI INCOERENTI

Densità relativa

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Densità relativa (%) |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Strato 1 | 8,8 | 0,00 | 8,8 | Gibbs & Holtz 1957 | 7 |
| Strato 2 | 26,63 | 1,80 | 26,63 | Gibbs & Holtz 1957 | 3 |
| Strato 3 | 45,66 | 1,90 | 45,66 | Gibbs & Holtz 1957 | 4 |

Angolo di resistenza al taglio

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Angolo d'attrito (°) |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| Strato 1 | 8,8 | 0,00 | 8,8 | Sowers (1961) | 3 |
| Strato 2 | 26,63 | 1,80 | 26,63 | Sowers (1961) | 3 |
| Strato 3 | 45,66 | 1,90 | 45,66 | Sowers (1961) | 4 |

Modulo di Young

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Modulo di Young (Kg/cm²) |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Strato 1 | 8,8 | 0,00 | 8,8 | Bowles (1982) Sabbia Media | |
| Strato 2 | 26,63 | 1,80 | 26,63 | Bowles (1982) Sabbia Media | 20 |
| Strato 3 | 45,66 | 1,90 | 45,66 | Bowles (1982) Sabbia Media | 30 |

Modulo Edometrico

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Modulo Edometrico (Kg/cm²) |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Strato 1 | 8,8 | 0,00 | 8,8 | Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia) | 4 |
| Strato 2 | 26,63 | 1,80 | 26,63 | Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia) | 8 |
| Strato 3 | 45,66 | 1,90 | 45,66 | Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia) | 12 |

Classificazione AGI

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Classificazione |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Strato 1 | 8,8 | 0,00 | 8,8 | Classificazione A.G.I. 1977 | P |
| Strato 2 | 26,63 | 1,80 | 26,63 | Classificazione A.G.I. 1977 | MODERATAMENTE ADDENSATA |
| Strato 3 | 45,66 | 1,90 | 45,66 | Classificazione A.G.I. 1977 | ADDENSATA |

Peso unità di volume

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Gamma (t/m³) |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Strato 1 | 8,8 | 0,00 | 8,8 | Meyerhof ed altri | |
| Strato 2 | 26,63 | 1,80 | 26,63 | Meyerhof ed altri | |

| | | | | | |
|----------|-------|------|-------|-------------------|--|
| Strato 3 | 45,66 | 1,90 | 45,66 | Meyerhof ed altri | |
|----------|-------|------|-------|-------------------|--|

Peso unità di volume saturo

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Gamma Saturazione (t/m³) |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Strato 1 | 8,8 | 0,00 | 8,8 | Terzaghi-Peck 1948-1967 | |
| Strato 2 | 26,63 | 1,80 | 26,63 | Terzaghi-Peck 1948-1967 | |
| Strato 3 | 45,66 | 1,90 | 45,66 | Terzaghi-Peck 1948-1967 | |

Modulo di Poisson

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Poisson |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|--------------|---------|
| Strato 1 | 8,8 | 0,00 | 8,8 | (A.G.I.) | |
| Strato 2 | 26,63 | 1,80 | 26,63 | (A.G.I.) | |
| Strato 3 | 45,66 | 1,90 | 45,66 | (A.G.I.) | |

Modulo di deformazione a taglio

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | G (Kg/cm²) |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|------------------------|------------|
| Strato 1 | 8,8 | 0,00 | 8,8 | Ohsaki (Sabbie pulite) | 50 |
| Strato 2 | 26,63 | 1,80 | 26,63 | Ohsaki (Sabbie pulite) | 140 |
| Strato 3 | 45,66 | 1,90 | 45,66 | Ohsaki (Sabbie pulite) | 230 |

Velocità onde

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Velocità onde m/s |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
| Strato 1 | 8,8 | 0,00 | 8,8 | | 10 |
| Strato 2 | 26,63 | 1,80 | 26,63 | | 20 |
| Strato 3 | 45,66 | 1,90 | 45,66 | | 30 |

Liquefazione

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Potenziale Liquefazione |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Strato 1 | 8,8 | 0,00 | 8,8 | Seed (1979) (Sabbie e ghiaie) | < 0.10 |
| Strato 2 | 26,63 | 1,80 | 26,63 | Seed (1979) (Sabbie e ghiaie) | 0.10 |
| Strato 3 | 45,66 | 1,90 | 45,66 | Seed (1979) (Sabbie e ghiaie) | > 0.10 |

Modulo di reazione Ko

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Ko (Kg/cm³) |
|----------|-------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| Strato 1 | 8,8 | 0,00 | 8,8 | Navfac 1971-1982 | |
| Strato 2 | 26,63 | 1,80 | 26,63 | Navfac 1971-1982 | |
| Strato 3 | 45,66 | 1,90 | 45,66 | Navfac 1971-1982 | |

Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico)

| | Nspt | Prof. Strato (m) | Nspt corretto per presenza falda | Correlazione | Qc (Kg/cm ²) |
|----------|-------|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Strato 1 | 8,8 | 0,00 | 8,8 | Robertson 1983 | |
| Strato 2 | 26,63 | 1,80 | 26,63 | Robertson 1983 | |
| Strato 3 | 45,66 | 1,90 | 45,66 | Robertson 1983 | |

